



Journal of Interpersonal Violence 27(12)

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
PLN 104
RUBRICA

PORTARIA 157 2025
 CREA CE 379384

Item	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494</
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Seneca	2010	Completed	10/10/2010	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied Arts and Sciences	Seneca College of Applied
--------	------	-----------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------

SEMPRE EM EFETO


 DANIELLE OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CREA CE 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. Nº 701
+
RUBRICA

[illegible]

SARILE PRIVA OLIVEIRA
TAVAREIRA 157 2025
0106 CE 379300

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
PL No 722
4
RUBRICA

Despesas													
ITEM	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR (R\$)	% DESP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRESTADOS	118.000,70	0,00%	100,00%									
2	MANTIMENTO DE TERREIROS PARA PLANTANDO	20.000,17	1,67%	17%									
3	PLANTANDO	104.070,60	0,85%	79%									
4	SUPRIMENTOS	37.000,00	3,00%	10%									
5	SISTEMA DE VIGILÂNCIA	140.000,00	1,14%	10%									
6	ALUGUEIRO	104.070,60	0,85%	79%									
7	SISTEMA DE CONTROLE	400.000,00	3,20%	10%									
8	MANUTENÇÃO	27.000,00	2,20%	10%									
9	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00	2,40%	10%									
10	SISTEMA DE FIO	20.000,00	1,60%	10%									
11	PLANTANDO E MANUTENÇÃO	104.070,60	0,85%	79%									
12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	104.070,60	0,85%	79%									
13	DEMANDE DE EQUIPAMENTOS	40.000,00	3,20%	10%									
14	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00	3,20%	10%									
15	LOCAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	110.000,00	0,88%	70%									
16	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00	3,20%	10%									
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	40.000,00	3,20%	10%									
18	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00	3,20%	10%									
19	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00	3,20%	10%									
20	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00	3,20%	10%									
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	40.000,00	3,20%	10%									
22	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00	3,20%	10%									
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	40.000,00	3,20%	10%									
24	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00	3,20%	10%									
25	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	40.000,00	3,20%	10%									
26	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00	3,20%	10%									
27	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	40.000,00	3,20%	10%									
28	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00	3,20%	10%									
29	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	40.000,00	3,20%	10%									
30	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00	3,20%	10%									
31	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	40.000,00	3,20%	10%									
32	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00	3,20%	10%									
33	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	40.000,00	3,20%	10%									
34	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00	3,20%	10%									
35	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	40.000,00	3,20%	10%									
36	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00	3,20%	10%									
37	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	40.000,00	3,20%										

Obra: Creche Tipo 1 - BIM - opção 220V

Unidade federativa: CEARÁ

Planilha Orçamentária: TIPO1-PLN-AT1-B220-R03

Endereço: Rua Alfredo Alves Fernandes Neto - Bairro Lagoinha - S/N - Guaraciaba do Norte/CE



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FNDE 03 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN)

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (PETRIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - Percentual=1,0000%	SNAPI	MS	0,02000000	R\$ 130,00	R\$ 2,60
10420 BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SEM APARENTE, SADA VERTICAL (SEM ASSENTO) - Percentual=1,0000%	SNAPI	UN	1,00000000	R\$ 218,00	R\$ 218,00
11898 CADA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA - Percentual=1,0000%	SNAPI	UN	1,00000000	R\$ 855,51	R\$ 855,51
20347 PREGO DE AÇO POLIDO, COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 1 1/2) - Percentual=1,0000%	SNAPI	KG	1,00000000	R\$ 15,03	R\$ 15,03
20305 RIPA APARELHADA "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSAPANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - Percentual=1,0000%	SNAPI	M	8,00000000	R\$ 3,18	R\$ 25,44
21008 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, "1,2" KG/M (NBR 5680) - Percentual=1,0000%	SNAPI	M	30,00000000	R\$ 24,09	R\$ 722,70
3841 TUBO PVC, SÉRIE RL, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000%	SNAPI	M	5,00000000	R\$ 23,10	R\$ 115,50
3841 TUBO PVC, SÉRIE RL, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000%	SNAPI	M	5,00000000	R\$ 23,10	R\$ 115,50
TOTAL Material:					R\$ 1.871,28

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88348 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SNAPI	H	4,00000000	R\$ 22,48	R\$ 89,92
88351 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SNAPI	H	8,00000000	R\$ 27,14	R\$ 217,12
88329 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SNAPI	H	8,00000000	R\$ 27,00	R\$ 216,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SNAPI	H	8,12000000	R\$ 21,94	R\$ 178,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 701,19

Serviço

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO FONTELE, EM MADEIRA, PARA PE DIREITO SIMPLES, AF 09/2020 - Percentual=1,0000%	SNAPI	M	17,00000000	R\$ 20,04	R\$ 340,68
TOTAL Serviço:					R\$ 340,68
VALOR:					R\$ 2.820,39

FNDE 244 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	MES	10,00000000	R\$ 3.358,62	R\$ 33.586,20
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	MES	10,00000000	R\$ 4.605,71	R\$ 46.057,10
93565 ENGENHEIRO CÍVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	MES	5,00000000	R\$ 21.364,65	R\$ 106.823,25
34295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	MES	10,00000000	R\$ 5.964,39	R\$ 59.643,90
101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	MES	10,00000000	R\$ 2.340,06	R\$ 23.400,60

Samir P.
SAMILLE RAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

Assinatura do Responsável Técnico
Eng.º S. AMARAL COSTA
RUBRICA Nº 152

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
Fl. Nº 127

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 289.451,25
VALOR:	R\$ 289.451,25

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO

FNDE 231 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MÊS)

Equipamento	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10773 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
TOTAL Equipamento:					R\$ 1.425,00
VALOR:					R\$ 1.425,00

FNDE 230 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MÊS)

Equipamento	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10776 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.113,28	R\$ 1.113,28
TOTAL Equipamento:					R\$ 1.113,28
VALOR:					R\$ 1.113,28

FNDE 232 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MÊS)

Equipamento	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10778 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.781,25	R\$ 1.781,25
TOTAL Equipamento:					R\$ 1.781,25
VALOR:					R\$ 1.781,25

FNDE 243 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Serviço	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10099 ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,70	R\$ 117,00
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 411,83	R\$ 411,83
90800 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 165,22	R\$ 165,22
91267 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 474,50	R\$ 474,50
TOTAL Serviço:					R\$ 1.168,55
VALOR:					R\$ 1.168,55

FNDE 247 PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Serviço	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10099 ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,72	R\$ 117,20
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 411,83	R\$ 411,83
90800 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 165,22	R\$ 165,22
91268 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.054,14	R\$ 1.054,14
TOTAL Serviço:					R\$ 1.748,39

SANTILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO

FNDE 248 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10059 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,72	R\$ 117,20
90906 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 411,83	R\$ 411,83
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 165,22	R\$ 165,22
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 474,59	R\$ 474,59
TOTAL Serviço:					R\$ 1.168,84
VALOR:					R\$ 1.168,84

FNDE 248 PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10059 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,72	R\$ 117,20
90906 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 411,83	R\$ 411,83
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 165,22	R\$ 165,22
91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.054,14	R\$ 1.054,14
TOTAL Serviço:					R\$ 1.748,39
VALOR:					R\$ 1.748,39

FNDE 249 PM5 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10059 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,90000000	R\$ 11,72	R\$ 115,91
90906 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 411,83	R\$ 411,83
90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 144,41	R\$ 144,41
91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 425,62	R\$ 425,62
TOTAL Serviço:					R\$ 1.097,77
VALOR:					R\$ 1.074,37

FNDE 250 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM RAGUETE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
33926 PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABEÇA 15 X 15 (1,14 X 13)	SINAPI	KG	0,02100000	R\$ 15,27	R\$ 0,32
33961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,35700000	R\$ 25,54	R\$ 9,12
10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 226,69	R\$ 226,69
TOTAL Material:					R\$ 236,13
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Será
CARILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157-2025
CREA CE 370384

88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38300000	R\$ 21,94	R\$ 8,35
88325	VIGIAZINHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 23,81	R\$ 9,07
TOTAL: Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,42
VALOR:						R\$ 283,87

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. Nº 123
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

FNDE D4 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,48 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M²)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11026	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,26 MM (15,60 KG/M²)	SINAPI	KG	15,60000000	R\$ 9,93	R\$ 152,58
TOTAL Material:						R\$ 152,58
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42500000	R\$ 26,67	R\$ 11,36
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40500000	R\$ 21,94	R\$ 9,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,71
VALOR:						R\$ 173,29

FNDE 251 PORTA DE ABRIR - PA1 - 180 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 8,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,10
38024	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM DIVISÃO HORIZONTAL, PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICIONALZARVISTA, 187 X 210 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 563,14	R\$ 563,14
142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	1,61300000	R\$ 38,66	R\$ 62,34
TOTAL Material:						R\$ 62,44
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 27,90	R\$ 18,16
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32500000	R\$ 21,94	R\$ 7,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,29
VALOR:						R\$ 878,87

FNDE 252 PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 8,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81980000	R\$ 0,30	R\$ 4,43
38628	GUARNIÇÃO / MOLDEIRA / ARREMATE DE ACASAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,80040000	R\$ 30,24	R\$ 207,16
38025	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 80 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICIONALZARVISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 507,95	R\$ 327,36
142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,86290000	R\$ 38,66	R\$ 34,12
TOTAL Material:						R\$ 573,07
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 27,90	R\$ 10,67
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R\$ 21,94	R\$ 4,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,87
VALOR:						R\$ 587,93

Sarai
SARAI PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

FNDE 253 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 180 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81060000	R\$ 0,93	R\$ 4,34
36888 GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 30,24	R\$ 60,59
30025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 597,90	R\$ 597,90
142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06290000	R\$ 38,05	R\$ 2,40
TOTAL Material					R\$ 672,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 27,30	R\$ 10,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13100000	R\$ 21,34	R\$ 4,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 14,87
VALOR:					R\$ 687,75

FNDE 254 PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,73000000	R\$ 0,93	R\$ 4,34
36888 GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	R\$ 30,24	R\$ 66,59
4822 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MÓVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 302,89	R\$ 302,89
142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	R\$ 38,05	R\$ 2,40
TOTAL Material					R\$ 376,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 27,30	R\$ 7,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	R\$ 21,34	R\$ 3,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 10,76
VALOR:					R\$ 387,34

FNDE 255 PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,73000000	R\$ 0,93	R\$ 4,34
36888 GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	R\$ 30,24	R\$ 66,59
4822 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MÓVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 302,89	R\$ 302,89
142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	R\$ 38,05	R\$ 2,40
TOTAL Material					R\$ 376,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R\$ 27,30	R\$ 7,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	R\$ 21,34	R\$ 3,09

Samir
SAMILLE FAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 378364

[Assinatura]
ENGENHEIRA CIVIL
UNO - 00118821-7
L. 11.066 - 10/152

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	VALOR
	R\$ 367,24

FNDE 256 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 5,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,01000000	R\$ 0,32	R\$ 4,40
36958 GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 30,34	R\$ 207,16
36025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNIÇÃO/ALZARVISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 597,95	R\$ 327,26
142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 38,65	R\$ 34,12
TOTAL Material					R\$ 572,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88333 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38290000	R\$ 27,30	R\$ 10,67
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19190000	R\$ 21,34	R\$ 4,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 14,85
VALOR					R\$ 587,83

FNDE 257 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 5,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,01000000	R\$ 0,32	R\$ 4,40
36958 GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 30,34	R\$ 207,16
36025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNIÇÃO/ALZARVISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 597,95	R\$ 327,26
142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 38,65	R\$ 34,12
TOTAL Material					R\$ 572,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88333 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38290000	R\$ 27,30	R\$ 10,67
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19190000	R\$ 21,34	R\$ 4,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 14,85
VALOR					R\$ 587,83

FNDE 258 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 93 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO/ALZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 302,76	R\$ 632,62
4377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,23	R\$ 5,61
38951 SILICONE ACÉTICO USO GERAL INOCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,34570000	R\$ 25,34	R\$ 31,84
TOTAL Material					R\$ 669,98

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88333 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70750000	R\$ 27,30	R\$ 47,63

Santa?
SANTILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 379384

85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 21,94	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 56,34
VALOR:						R\$ 736,62

FNDE 259 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
34361 JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 50 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAD/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 303,76	R\$ 632,67
4377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO " 32 " MM	SINAPI	UN	24,40330000	R\$ 0,23	R\$ 5,61
32861 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 25,54	R\$ 31,84
TOTAL Material:					R\$ 670,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,90	R\$ 47,63
85316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 21,94	R\$ 18,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 66,34
VALOR:					R\$ 736,62

FNDE 275 JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
588 JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAD/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 752,31	R\$ 752,31
4377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO " 32 " MM	SINAPI	UN	17,41380000	R\$ 0,23	R\$ 4,00
32861 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,40490000	R\$ 25,54	R\$ 10,33
TOTAL Material:					R\$ 766,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72300000	R\$ 27,90	R\$ 20,08
85316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36030000	R\$ 21,94	R\$ 7,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 27,98
VALOR:					R\$ 794,62

FNDE 262 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
34361 JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 50 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAD/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 303,76	R\$ 632,67
4377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO " 32 " MM	SINAPI	UN	24,40330000	R\$ 0,23	R\$ 5,61
32861 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 25,54	R\$ 31,84
TOTAL Material:					R\$ 670,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,90	R\$ 47,63
85316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 21,94	R\$ 18,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 66,34
VALOR:					R\$ 736,62

SAMILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE-379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
FE Nº 10/25

FNDE 278 JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 125 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
595 JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM QUARNICAALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SNAP1	M2	1,00000000	R\$ 152,31	R\$ 152,31
4377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SNAP1	UN	17,41300000	R\$ 0,23	R\$ 4,00
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SNAP1	UN	0,42400000	R\$ 25,54	R\$ 10,74
TOTAL Material:					R\$ 167,05
Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 20,09
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,72000000	R\$ 27,90	R\$ 20,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,38000000	R\$ 21,94	R\$ 7,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 27,99
VALOR:					R\$ 195,13

FNDE 263 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
34381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM QUARNICAALIZAR	SNAP1	UN	2,08300000	R\$ 303,76	R\$ 632,62
4377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SNAP1	UN	24,40000000	R\$ 0,23	R\$ 5,61
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SNAP1	UN	1,24570000	R\$ 25,54	R\$ 31,84
TOTAL Material:					R\$ 670,07
Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 47,53
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	1,70700000	R\$ 27,90	R\$ 47,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,85300000	R\$ 21,94	R\$ 18,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 66,24
VALOR:					R\$ 736,31

FNDE 264 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
34381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM QUARNICAALIZAR	SNAP1	UN	2,08300000	R\$ 303,76	R\$ 632,62
4377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SNAP1	UN	24,40000000	R\$ 0,23	R\$ 5,61
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SNAP1	UN	1,24570000	R\$ 25,54	R\$ 31,84
TOTAL Material:					R\$ 670,07
Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 47,53
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	1,70700000	R\$ 27,90	R\$ 47,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,85300000	R\$ 21,94	R\$ 18,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 66,24
VALOR:					R\$ 736,31

FNDE 268 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Santia
SANTIA OLIVEIRA
PORTARIA 152 2025
ENSA GE 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
FE Nº 10/25

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 134
RUBRICA

34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM QUARNICAALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 303,76	R\$ 632,80
4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO " 32 " MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,23	R\$ 5,61
35981	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 25,34	R\$ 31,84
TOTAL Material:						R\$ 670,25
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,90	R\$ 47,63
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 21,34	R\$ 18,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 66,34
VALOR:						R\$ 736,62

FNDE 265 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM QUARNICAALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 303,76
4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO " 32 " MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,23
35981	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 25,34
TOTAL Material:					R\$ 670,25
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,90
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 21,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 66,34
VALOR:					R\$ 736,62

FNDE 268 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM QUARNICAALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 303,76
4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO " 32 " MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,23
35981	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 25,34
TOTAL Material:					R\$ 670,25
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,90
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 21,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 66,34
VALOR:					R\$ 736,62

FNDE 270 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM QUARNICAALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 303,76
4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO " 32 " MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,23
TOTAL Material:					R\$ 670,25
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,90
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 21,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 66,34
VALOR:					R\$ 736,62

Samir P.
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA-CE 379354

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
FURG
CAMPUS 1
91201-900

32961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 25,54	R\$ 31,84
TOTAL Material:						R\$ 31,84
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88303	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,90	R\$ 47,53
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 21,94	R\$ 18,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 66,24
VALOR:						R\$ 736,82

FNDE 271 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICADILIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 303,76	R\$ 632,82
4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 " MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,23	R\$ 5,61
32961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 25,54	R\$ 31,84
TOTAL Material:						R\$ 670,26
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88303	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,90	R\$ 47,53
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 21,94	R\$ 18,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 66,24
VALOR:						R\$ 736,82

FNDE 272 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICADILIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 303,76	R\$ 632,82
4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 " MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,23	R\$ 5,61
32961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 25,54	R\$ 31,84
TOTAL Material:						R\$ 670,26
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88303	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,90	R\$ 47,53
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 21,94	R\$ 18,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 66,24
VALOR:						R\$ 736,82

FNDE 273 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICADILIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 303,76	R\$ 632,82
4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 " MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,23	R\$ 5,61
32961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 25,54	R\$ 31,84
TOTAL Material:						R\$ 670,26
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88303	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,90	R\$ 47,53

SAMUEL PIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379364

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
RUA MARQUÊS DE SÃO CARLOS, 150
CASA 1000
22251-900

88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 21,94	R\$ 18,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 18,71
					VALOR:	R\$ 18,71

FNDE 274 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM QUARNICAALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 303,76
4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,23
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24870000	R\$ 25,54
TOTAL Material					R\$ 329,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70790000	R\$ 27,90
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 21,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 49,84
VALOR:					R\$ 738,62

FNDE 277 JANELA DE ALUMÍNIO JA-15 - 169 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
586	JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE-REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM QUARNICAALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,30000000	R\$ 752,31
4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	R\$ 0,23
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,43400000	R\$ 25,54
TOTAL Material					R\$ 778,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77000000	R\$ 27,90
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 21,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 27,90
VALOR:					R\$ 795,13

FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
586	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ARIAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,585 KG/M	SINAPI	M	3,00000000	R\$ 22,50
10832	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (3 SWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 29,50
TOTAL Material					R\$ 142,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	R\$ 27,90
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 21,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 22,30
VALOR:					R\$ 185,17

FNDE 278 PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)

Samir
SANTILHA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM PRECATORIO
RUBRICA
R\$ 18,71
R\$ 329,53
R\$ 49,84
R\$ 738,62
R\$ 778,14
R\$ 27,90
R\$ 795,13
R\$ 142,32
R\$ 185,17

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM (ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021)	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 2.368,93	R\$ 2.368,93
TOTAL Serviço:					R\$ 2.368,93
VALOR:					R\$ 1.355,53

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM FEITO
RUBRICA

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM (ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021)	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 2.368,93	R\$ 2.368,93
TOTAL Serviço:					R\$ 2.368,93
VALOR:					R\$ 1.355,53

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. Nº 737
RUBRICA

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92718 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXIACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇANICOS - CHP DURINO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%	SINAPI	CHP	4,03000000	R\$ 93,71	R\$ 374,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 374,83
Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
548 BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 9,22	R\$ 3,02
43105 CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM. DIAMETRO DO FURO = 8,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 30,98	R\$ 10,13
11456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO /ZINCOADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM - Percentual=1,0000%	SINAPI	UN	1,50000000	R\$ 21,92	R\$ 31,98
7098 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1.14", E = 3,35" MM, PESO 3,14" KG/M (NBR 5682) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 44,89	R\$ 101,00
TOTAL Materiais:					R\$ 135,13

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORESTA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 14,94	R\$ 41,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 41,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	0,31200000	R\$ 27,90	R\$ 8,70
86313 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 27,98	R\$ 76,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 85,36

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (P/ DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 29,79	R\$ 59,58
100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (P/ DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 24,43	R\$ 48,86
TOTAL Serviço:					R\$ 108,44
VALOR:					R\$ 748,13

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (P/ DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 29,79	R\$ 59,58
100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (P/ DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 24,43	R\$ 48,86
TOTAL Serviço:					R\$ 108,44
VALOR:					R\$ 748,13

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (P/ DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 29,79	R\$ 59,58
100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (P/ DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 24,43	R\$ 48,86
TOTAL Serviço:					R\$ 108,44
VALOR:					R\$ 748,13

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (P/ DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 29,79	R\$ 59,58
100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (P/ DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 24,43	R\$ 48,86
TOTAL Serviço:					R\$ 108,44
VALOR:					R\$ 748,13

SINAPI
SANDILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. Nº 737
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 738
RUBRICA

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	4,00000000	R\$ 93,01	
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 374,80
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
548	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 9,22	R\$ 3,02
43105	CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIÂMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 30,96	R\$ 10,18
11456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPÓS, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12". E ESPESURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,92	R\$ 21,92
7098	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.14", E = 3,25" MM, PESO 3,14" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 44,89	R\$ 101,00
TOTAL Material						R\$ 136,12
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 14,94	R\$ 41,20
TOTAL Mão de Obra						R\$ 41,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	R\$ 27,90	R\$ 8,70
86315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 27,88	R\$ 76,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 85,38
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
150754	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (PQ DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,30000000	R\$ 29,75	R\$ 68,58
150722	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,30000000	R\$ 24,43	R\$ 48,00
TOTAL Serviço						R\$ 116,58
VALOR						R\$ 746,13

FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%	SINAPI	CHP	4,00000000	R\$ 93,01	R\$ 374,80
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 374,80
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
548	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 9,22	R\$ 3,02
43105	CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIÂMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 30,96	R\$ 10,15
7098	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.14", E = 3,25" MM, PESO 3,14" KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 44,89	R\$ 101,00
TOTAL Material						R\$ 114,18
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 14,94	R\$ 41,20
TOTAL Mão de Obra						R\$ 41,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	0,31200000	R\$ 27,90	R\$ 8,70

Sandra?
FAMILLE PAIVA OLIVEIRA
POSTARIA 157 2025
CREA CE 370324

Eng.ª Nênia Givli
CPF: 043.100.020-1
CNPJ: 06.952

88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 27,68	R\$ 27,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,68
Serviço						TOTAL
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PÍNCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS); AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,90000000	R\$ 29,79	R\$ 29,79
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PÍNCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO); AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 24,43	R\$ 24,43
TOTAL Serviço:						R\$ 54,22
VALOR:						R\$ 724,21

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
RUBRICA

FNDE 282 GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82718	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OX-ACETILENO SOBRE RODAS INCLUSIVE CILINDROS E MAÇANCOS - CHF DIÁRIO; AF_05/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	CHF	4,00000000	R\$ 93,01	R\$ 374,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 374,83
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
548	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 9,22	R\$ 3,02
43105	CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIÂMETRO DO FURO = 3,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 30,96	R\$ 10,15
11456	PERFOLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO /ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	1,80000000	R\$ 21,92	R\$ 21,92
7598	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1,104", E = 3,25 MM, PISO 3,14" KG/M (NBR 5583) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 44,88	R\$ 101,00
TOTAL Material:						R\$ 136,12
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 14,94	R\$ 41,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300	RECREIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	0,31200000	R\$ 27,90	R\$ 8,70
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 27,68	R\$ 70,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 79,38
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PÍNCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS); AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 29,79	R\$ 59,59
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PÍNCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO); AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 24,43	R\$ 48,86
TOTAL Serviço:						R\$ 108,44
VALOR:						R\$ 746,13

FNDE 60 FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Samyra
SAMYRA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

Assessoria Técnica - Engenharia Civil
CNPJ 06.618.054/0001-77
Rua A, 360/32

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 160

RUBRICA

RUBRICA

82718	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OX-ACETILENO SOBRE ROÇAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARIÇOS - CHIP DIURNO. AF_06/2023 - Percentual=1,0000%	SINAPI	CHP	4,03300000	R\$ 83,01	
TOTAL Equipamento Custo Fixo:						R\$ 83,01
Material						
546	SABIA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 9,22	R\$ 9,22
42105	CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) (E = 1,5 MM, DIÂMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 30,95	R\$ 10,15
7898	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1 1/4", E = 3,25" MM, PESO 3,14" KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 44,88	R\$ 101,08
TOTAL Material						R\$ 120,45
Mão de Obra						
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 14,94	R\$ 41,38
TOTAL Mão de Obra						R\$ 41,38
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88308	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	0,31200000	R\$ 27,90	R\$ 9,70
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 27,68	R\$ 75,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 85,57
Serviço						
130754	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 29,79	R\$ 59,58
130722	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 24,43	R\$ 48,86
TOTAL Serviço						R\$ 108,44
VALOR:						R\$ 234,21

FNDE 283 CERCA GRADIL H=1,88M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 23,99	R\$ 34,59
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,68	R\$ 41,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 76,11
Serviço						
34.05.360	Gracil tela eletrosoldada, malha de 5 x 15cm, galvanizado	SP Obras	M2	1,00000000	R\$ 190,53	R\$ 190,53
TOTAL Serviço						R\$ 190,53
VALOR:						R\$ 266,64

FNDE 284 P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)						
Material						
18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,20000000	R\$ 630,91	R\$ 757,09
TOTAL Material						R\$ 757,09
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 23,99	R\$ 57,60
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 27,68	R\$ 69,20

Samuel
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

Engenheiro Civil
CRM 66119/2025
Data: 06/05/25

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	VALOR
	R\$ 883,94

HUBRICA

FNDE 285 P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,50 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18436 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,20000000	R\$ 630,31	R\$ 757,08
TOTAL Material					R\$ 757,08
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 29,06	R\$ 57,65
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 27,08	R\$ 67,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 125,35
VALOR					R\$ 883,94

FNDE 286 P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18436 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,20000000	R\$ 630,31	R\$ 757,08
TOTAL Material					R\$ 757,08
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 29,06	R\$ 57,65
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 27,08	R\$ 67,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 125,35
VALOR					R\$ 883,94

FNDE 287 P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,20 X 2,04 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18436 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,20000000	R\$ 630,31	R\$ 757,08
TOTAL Material					R\$ 757,08
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 29,06	R\$ 57,65
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 27,08	R\$ 67,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 125,35
VALOR					R\$ 883,94

FNDE 198 ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10832 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOGANGULAR, FIO 4,19 MM (3 BWS), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 99,50	R\$ 99,50
TOTAL Material					R\$ 99,50
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 14,94	R\$ 22,41
TOTAL Mão de Obra					R\$ 22,41

SANTILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384SANTILE PAIVA OLIVEIRA
CPF: 001.108.924-7
CNPJ: 00.000.000-00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 27,68	R\$ 69,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 69,20
Serviço		FORTE	UNE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94580	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_13/2019	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 22,76	R\$ 56,90
TOTAL Serviço						R\$ 56,90
VALOR:						R\$ 248,97

FNDE 109 ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMÍNIO PV VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS (M2)						
Material		FORTE	UNE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12622	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (3 BWC), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 90,56	R\$ 90,56
TOTAL Material						R\$ 90,56
Mão de Obra		FORTE	UNE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
152	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 14,94	R\$ 22,41
TOTAL Mão de Obra						R\$ 22,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 27,68	R\$ 69,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 69,20
Serviço		FORTE	UNE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94580	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_13/2019	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 22,76	R\$ 56,90
TOTAL Serviço						R\$ 56,90
VALOR:						R\$ 248,97

FNDE 120 GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	CHP	4,00000000	R\$ 93,01	R\$ 374,83
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 374,83
Material		FORTE	UNE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 9,22	R\$ 3,02
43105	CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIÂMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 30,96	R\$ 10,15
11456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO, ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	LN	1,80000000	R\$ 12,30	R\$ 22,14
7948	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1,14", E = 3,25" MM, PESO 3,14" KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	2,25200000	R\$ 44,89	R\$ 101,00
TOTAL Material						R\$ 136,31
Mão de Obra		FORTE	UNE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
152	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 14,94	R\$ 41,28
TOTAL Mão de Obra						R\$ 41,28
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	0,31200000	R\$ 27,90	R\$ 8,70
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 27,68	R\$ 75,57


 SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CREA CE 379384

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLINA (POR DEBORA) SINAPI	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 20,70	R\$ 40,80
100722	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLINA (POR DEBORA) SINAPI	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 24,43	R\$ 48,86
TOTAL Serviço						R\$ 108,44
VALOR						R\$ 746,13

FNDE 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESURA DE 50 MM (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4392	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCEMENTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
43071	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESURA DE 50 MM	SINAPI	M2	1,08000000	R\$ 167,34	R\$ 177,27
TOTAL Material						R\$ 178,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	GAZINHEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	R\$ 27,54	R\$ 6,06
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	R\$ 21,94	R\$ 4,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 10,89
VALOR						R\$ 200,15

FNDE 65 CUMEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 6,5 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E AÇAMENTO (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90782	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIÁRIO AF_03/2016	SINAPI	CH	0,00270000	R\$ 27,13	R\$ 0,07
90291	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIÁRIO AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00270000	R\$ 28,32	R\$ 0,06
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0,13

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
F, 14.000.02502	Cumeira em chapão de aço zincado, pré-pintado, perfil trapezoidal, espessura de 0,30mm; ref. LR-40 da Parlor, MBP-40 da MBP, Eucabix ou equivalente	SP Obras	M	2,00000000	R\$ 53,65	R\$ 107,30
11029	RASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORÇA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	0,00000000	R\$ 1,35	R\$ 0,00
TOTAL Material						R\$ 107,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 21,94	R\$ 2,19
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 27,30	R\$ 2,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 4,92
VALOR						R\$ 122,85

FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Samy
SANTILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 370304

10/10/2025
SANTILE PAIVA OLIVEIRA
CPF: 000.000.000-00
Data: 10/10/2025

PLANO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA
PLANO DE PLANEJAMENTO
RUBRICA

525	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 20,48	
-----	---	--------	----	------------	-----------	--

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09680000	R\$ 22,11	R\$ 2,14
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42080000	R\$ 27,90	R\$ 11,69

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,14
VALOR:	R\$ 44,86

FNDE 173 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
525	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 30,72
TOTAL Material:					R\$ 30,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09680000	R\$ 22,11	R\$ 2,14
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42080000	R\$ 27,90	R\$ 11,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,14

VALOR:	R\$ 44,86
--------	-----------

FNDE 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
525	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 30,72
TOTAL Material:					R\$ 30,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09680000	R\$ 22,11	R\$ 2,14
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42080000	R\$ 27,90	R\$ 11,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,14

VALOR:	R\$ 44,86
--------	-----------

FNDE 175 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
525	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 30,72
TOTAL Material:					R\$ 30,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09680000	R\$ 22,11	R\$ 2,14
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42080000	R\$ 27,90	R\$ 11,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,14

VALOR:	R\$ 44,86
--------	-----------

FNDE 176 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO (M2)

Sapelli
SAPELLI PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88308	RECREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00810000	R\$ 27,94	R\$ 0,23
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02560000	R\$ 21,94	R\$ 0,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,79
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87813	ARISAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE GIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHARISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 548,96	R\$ 2,03
				TOTAL Serviço:		R\$ 2,03
				VALOR:		R\$ 4,82

FIDE 289 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		PONTE	UNID	CODIFICANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	REDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 27,90	R\$ 1,90
88318	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 21,94	R\$ 0,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,46
Serviço		PONTE	UNID	CODIFICANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 548,90	R\$ 2,03
				TOTAL Serviço:		R\$ 2,03
				VALOR:		R\$ 4,49

FNDE 290 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)

Material		FONTE	UNID	CODIFICANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,34 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 15,04	R\$ 2,38
					TOTAL Material:	R\$ 2,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	CODIFICANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88308	PEDEreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 27,90	R\$ 11,41
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 21,34	R\$ 8,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,00
Serviço		FONTE	UNID	CODIFICANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07282	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UNID) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 911,34	R\$ 17,30
					TOTAL Serviço:	R\$ 17,30
					VALOR:	R\$ 40,68

FNDE 291 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEPIMENTO EM CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSEURA DE 25 MM (M2).

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 15,04	R\$ 2,38
				TOTAL Material		R\$ 2,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 27,30	R\$ 11,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 21,94	R\$ 8,78
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 20,18
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SAMILE DA SILVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 379384

87282	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MIDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,02290000	R\$ 611,94	R\$ 17,93
						TOTAL Serviço
						VALOR:

FNDE 292 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 15,04	R\$ 2,38
						TOTAL Material

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88004	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 27,90	R\$ 11,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 21,94	R\$ 8,97
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87282	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MIDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,02290000	R\$ 611,94	R\$ 17,93
						TOTAL Serviço
						VALOR:

FNDE 293 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)						
---	--	--	--	--	--	--

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 1,12	R\$ 5,50
34357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	R\$ 6,57	R\$ 2,77
539	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 30,95	R\$ 32,06
						TOTAL Material

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88258	AZULEJISTA OU LADREJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	R\$ 27,79	R\$ 14,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 21,94	R\$ 5,89
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares
						VALOR:

FNDE 294 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)						
--	--	--	--	--	--	--

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 1,12	R\$ 5,50
34357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	R\$ 6,57	R\$ 2,77
539	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 30,95	R\$ 32,06
						TOTAL Material

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88258	AZULEJISTA OU LADREJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	R\$ 27,79	R\$ 14,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 21,94	R\$ 5,89
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares
						VALOR:

Samlle Paiva Oliveira
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

CONSELHO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS
DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 06.711.092/0001-00
RUA DA PRAIA, 100 - 1º ANDAR
JACARA - RECIFE - PE

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 42,96
VALOR	R\$ 42,96

FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
35011 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 132,18	R\$ 132,18

TOTAL Material: R\$ 132,18

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
66278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47800000	R\$ 24,08	R\$ 11,61
66116 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47800000	R\$ 21,94	R\$ 10,50

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 22,11

VALOR: R\$ 154,27

FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7334 ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 18,58	R\$ 3,98
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,56000000	R\$ 0,72	R\$ 0,39

TOTAL Material: R\$ 4,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88308 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 27,30	R\$ 6,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R\$ 21,94	R\$ 2,70

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 9,33

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M2	0,04310000	R\$ 839,00	R\$ 27,54

TOTAL Serviço: R\$ 27,54

VALOR: R\$ 40,82

FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,07000000	R\$ 0,72	R\$ 0,05
44396 COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,10000000	R\$ 40,25	R\$ 4,03

TOTAL Material: R\$ 4,04

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
61111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 13,80	R\$ 1,24

TOTAL Mão de Obra: R\$ 1,24

VALOR: R\$ 5,28

FNDE 288 PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4791 ADESIVO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,09500000	R\$ 44,55	R\$ 4,23
4792 PLACA VINÍLICA SEMIFLEXÍVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCAÇÃO)	SINAPI	M2	1,11000000	R\$ 182,77	R\$ 202,88

TOTAL Material: R\$ 207,11

SAMILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

PROF. CARLOS ALBERTO DE SOUZA
LUIZ CARLOS DE SOUZA
CPF: 001.100.000-11
RUBRICA: 001.100.000-11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,17100000	R\$ 27,90	R\$ 4,77
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,08500000	R\$ 21,94	R\$ 1,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 6,63
VALOR:						R\$ 225,95

FNDE 297 PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4781	ADESIVO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SNAP1	KG	0,09500000	R\$ 44,55	R\$ 4,23
4782	PLACA VINÍLICA SEMIFLEXÍVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCAÇÃO)	SNAP1	M2	1,11000000	R\$ 193,77	R\$ 215,08
TOTAL Material						R\$ 219,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,17100000	R\$ 27,90	R\$ 4,77
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,08500000	R\$ 21,94	R\$ 1,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 6,63
VALOR:						R\$ 225,95

FNDE 299 PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4781	ADESIVO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SNAP1	KG	0,09500000	R\$ 44,55	R\$ 4,23
4782	PLACA VINÍLICA SEMIFLEXÍVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCAÇÃO)	SNAP1	M2	1,11000000	R\$ 193,77	R\$ 215,08
TOTAL Material						R\$ 219,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,17100000	R\$ 27,90	R\$ 4,77
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,08500000	R\$ 21,94	R\$ 1,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 6,63
VALOR:						R\$ 225,95

FNDE 300 PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4781	ADESIVO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SNAP1	KG	0,09500000	R\$ 44,55	R\$ 4,23
4782	PLACA VINÍLICA SEMIFLEXÍVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCAÇÃO)	SNAP1	M2	1,11000000	R\$ 193,77	R\$ 215,08
TOTAL Material						R\$ 219,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,17100000	R\$ 27,90	R\$ 4,77
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,08500000	R\$ 21,94	R\$ 1,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 6,63
VALOR:						R\$ 225,95

FNDE 400 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	SNAP1	KG	1,21500000	R\$ 3,44	R\$ 4,18
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SNAP1	KG	0,24000000	R\$ 0,72	R\$ 0,17
38186	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	SNAP1	M2	0,25000000	R\$ 682,27	R\$ 170,57

Samy H.P.
SAMYLLY PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CKEA CE 379384

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,43700000	R\$ 27,90	R\$ 12,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,21800000	R\$ 21,94	R\$ 4,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares								R\$ 16,88
VALOR								R\$ 181,90

FNDE 401 PISO PODOtÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37525	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	SINAPI	KG	1,21500000	R\$ 3,44
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,24000000	R\$ 0,72
38186	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	M2	0,25300000	R\$ 632,27
TOTAL Material					R\$ 176,43

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL	
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43700000	R\$ 27,90
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21800000	R\$ 21,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 49,84	
				VALOR	
				R\$ 181,90	

FNDE 199 PISO PODOtÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	10,00000000	R\$ 2,08
38178	PISO TÁTIL / PODOtÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO-CONCRETO, 40 X 40 CM, E = 2,5 CM, PADRÃO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,25000000	R\$ 11,53
TOTAL Material					R\$ 13,61

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL	
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27900000	R\$ 27,90
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55700000	R\$ 21,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 49,84	
				VALOR	
				R\$ 185,27	

FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5678	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CAPREGADERA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIG. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 9.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF. 08/2014	SINAPI	CHP	0,01900000	R\$ 142,94
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 2,72

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
387	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 137,60
TOTAL Material					R\$ 140,32

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL	
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03170000	R\$ 21,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 6,95	
				VALOR	
				R\$ 148,32	


 SAMILLE ALVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CREA CE 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
356
RUBRICA

FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDC02	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE	M	1,00000000	R\$ 15,00	R\$ 15,00
TOTAL Material:					R\$ 15,00
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08200000	R\$ 21,94	R\$ 18,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,05
VALOR:					R\$ 33,05

FNDE 402 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7355	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,22850000	R\$ 32,63	R\$ 7,46
TOTAL Material:					R\$ 7,46
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16310000	R\$ 29,40	R\$ 4,80
88310	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05440000	R\$ 21,94	R\$ 1,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,99
VALOR:					R\$ 13,44

FNDE 403 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7355	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,22850000	R\$ 32,63	R\$ 7,46
TOTAL Material:					R\$ 7,46
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16310000	R\$ 29,40	R\$ 4,80
88310	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05440000	R\$ 21,94	R\$ 1,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,99
VALOR:					R\$ 13,44

FNDE 404 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7355	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,22850000	R\$ 32,63	R\$ 7,46
TOTAL Material:					R\$ 7,46
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16310000	R\$ 29,40	R\$ 4,80
88310	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05440000	R\$ 21,94	R\$ 1,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,99
VALOR:					R\$ 13,44

FNDE 405 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7355	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,22850000	R\$ 32,63	R\$ 7,46
TOTAL Material:					R\$ 7,46
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16310000	R\$ 29,40	R\$ 4,80

SAMILE
SAMILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

PROFESSOR
LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF: 043.189.921-1
DATA: 01/05/25

80318	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,05440000	R\$ 21,04	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				
VALOR			R\$ 13,44	

RUBRICA

RUBRICA

FNDE 35 PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5300	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,08400000	R\$ 47,80	R\$ 3,98
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	1,60000000	R\$ 0,71	R\$ 1,14
6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	SINAPI	L	0,30000000	R\$ 10,34	R\$ 3,10
7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 74,50	R\$ 23,90
					TOTAL Material	R\$ 12,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80000000	R\$ 29,40	R\$ 52,92
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80000000	R\$ 21,04	R\$ 37,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 90,79
					VALOR	R\$ 122,91

FNDE 36 PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5300	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,08400000	R\$ 47,80	R\$ 3,99
3767	LIJA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	1,50000000	R\$ 0,71	R\$ 1,07
6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	SINAPI	L	0,30000000	R\$ 10,34	R\$ 3,10
7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 74,50	R\$ 23,90
					TOTAL Material	R\$ 21,26
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80000000	R\$ 29,40	R\$ 52,92
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80000000	R\$ 21,04	R\$ 37,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 90,79
					VALOR	R\$ 128,05

FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5318	DILUENTE AQUARIAS	SINAPI	L	0,01400000	R\$ 21,00	R\$ 0,29
7311	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14000000	R\$ 37,30	R\$ 5,22
					TOTAL Material	R\$ 5,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 29,40	R\$ 10,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 10,58
					VALOR	R\$ 16,09

FNDE 406 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5300	DILUENTE EPÓXI	SINAPI	L	0,08400000	R\$ 47,80
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 7,50
44872	PRIMER EPÓXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20100000	R\$ 112,17

Samir
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 379384

Samir
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 379384

7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 74,50	R\$ 23,99
					TOTAL Material	R\$ 23,99
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 29,40	R\$ 8,09
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 21,94	R\$ 2,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 10,61
					VALOR	R\$ 34,60

FNDE 407 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 47,86	R\$ 3,06
12815	FITA CREPE ROLLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 7,50	R\$ 0,08
44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 112,17	R\$ 22,61
7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 74,50	R\$ 23,99
					TOTAL Material	R\$ 28,74
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 29,40	R\$ 8,09
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 21,94	R\$ 2,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 10,61
					VALOR	R\$ 39,35

FNDE 408 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 47,86	R\$ 3,06
12815	FITA CREPE ROLLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 7,50	R\$ 0,08
44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 112,17	R\$ 22,61
7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 74,50	R\$ 23,99
					TOTAL Material	R\$ 28,74
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 29,40	R\$ 8,09
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 21,94	R\$ 2,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 10,61
					VALOR	R\$ 39,35

FNDE 406 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 47,86	R\$ 3,06
12815	FITA CREPE ROLLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 7,50	R\$ 0,08
44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 112,17	R\$ 22,61
7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 74,50	R\$ 23,99
					TOTAL Material	R\$ 28,74
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 29,40	R\$ 8,09
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 21,94	R\$ 2,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 10,61
					VALOR	R\$ 39,35

Samir
SAMILLE RIBEIRO OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
EUA CE 379364

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
UNID: 0015100001
COTA: 00152

FNDE 407 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5330 DILUENTE EPÓXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 47,86	R\$ 3,06
12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 7,50	R\$ 0,08
44072 PRIMER EPÓXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 112,17	R\$ 22,61
7304 TINTA EPÓXI BASE ÁGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 74,50	R\$ 23,99
TOTAL Material					R\$ 49,74
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 29,40	R\$ 8,09
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 21,94	R\$ 2,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 10,61
VALOR:					R\$ 60,35

FNDE 408 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5330 DILUENTE EPÓXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 47,86	R\$ 3,06
12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 7,50	R\$ 0,08
44072 PRIMER EPÓXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 112,17	R\$ 22,61
7304 TINTA EPÓXI BASE ÁGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 74,50	R\$ 23,99
TOTAL Material					R\$ 49,74
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 29,40	R\$ 8,09
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 21,94	R\$ 2,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 10,61
VALOR:					R\$ 60,35

FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5330 DILUENTE EPÓXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 47,86	R\$ 3,06
12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 7,50	R\$ 0,08
44072 PRIMER EPÓXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 112,17	R\$ 22,61
7304 TINTA EPÓXI BASE ÁGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 74,50	R\$ 23,99
TOTAL Material					R\$ 49,74
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 29,40	R\$ 8,09
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 21,94	R\$ 2,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 10,61
VALOR:					R\$ 60,35

FNDE 410 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5330 DILUENTE EPÓXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 47,86	R\$ 3,06
12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 7,50	R\$ 0,08
44072 PRIMER EPÓXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 112,17	R\$ 22,61
7304 TINTA EPÓXI BASE ÁGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 74,50	R\$ 23,99

SAMILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 379384

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88318	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 29,40	R\$ 8,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 21,94	R\$ 2,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 10,61
VALOR:						R\$ 90,35

FNDE 411 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5330	DILUENTE EPÓXI	SINAPI	L	0,05400000	R\$ 47,86	R\$ 3,09
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 7,50	R\$ 0,08
44072	PRIMER EPÓXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 112,17	R\$ 22,61
7304	TINTA EPÓXI BASE ÁGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 74,50	R\$ 23,99
TOTAL Material						R\$ 29,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88318	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 29,40	R\$ 8,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 21,94	R\$ 2,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 10,61
VALOR:						R\$ 90,35

FNDE 412 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5330	DILUENTE EPÓXI	SINAPI	L	0,05400000	R\$ 47,86	R\$ 3,09
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 7,50	R\$ 0,08
44072	PRIMER EPÓXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 112,17	R\$ 22,61
7304	TINTA EPÓXI BASE ÁGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 74,50	R\$ 23,99
TOTAL Material						R\$ 29,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88318	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 29,40	R\$ 8,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 21,94	R\$ 2,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 10,61
VALOR:						R\$ 90,35

FNDE 413 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 90 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150g GR	SINAPI	UN	0,02120000	R\$ 61,40	R\$ 1,30
821	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 90 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,40	R\$ 16,40
30381	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,02330000	R\$ 1,83	R\$ 0,04
20003	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03600000	R\$ 69,58	R\$ 2,50
TOTAL Material						R\$ 20,24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	ALUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10050000	R\$ 22,48	R\$ 2,23
88367	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10050000	R\$ 27,14	R\$ 2,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 5,14

SAMUEL
SÁMUEL PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 370384

FNDE 414 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
127	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180G GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,44
38283	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,00020000	R\$ 0,00
3904	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,80
20083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 0,30
TOTAL Material					R\$ 1,54
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 22,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 27,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 49,62
VALOR					R\$ 51,16

FNDE 119 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,30
TOTAL Material					R\$ 18,30
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 22,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 27,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 49,62
VALOR					R\$ 67,92

FNDE 415 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
132	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180G GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,44
3526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COM MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,71
38283	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,00020000	R\$ 0,00
20083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 0,30
TOTAL Material					R\$ 1,44
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	R\$ 22,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	R\$ 27,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 49,62
VALOR					R\$ 51,06

FNDE 21 RESERVATÓRIO CILÍNDRICO CAP. 10.000 LITROS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERSALHAD	SINAPI	KG	19,06000000	R\$ 194,47

Samir P.
SAMUEL PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 379384

ENGENHEIRO CIVIL
CONCRETO ARMADO
RUBRICADO
15/04/2025

43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,5 MM, OU 6,3 MM, OU 7,5 MM, VERSALHADO	SINAPI	KG	9,48000000	R\$ 7,80	R\$ 73,94
344	ARAME GALVANIZADO 18 B/W, D = 1,25MM (0,0188 KG/M)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 20,85	R\$ 6,26
43132	ARAME RECOZIDO 18 B/W, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 B/W, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,54000000	R\$ 15,73	R\$ 8,48
270	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRINADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,00000000	R\$ 130,00	R\$ 130,00
1376	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	890,20000000	R\$ 0,72	R\$ 637,01
3882	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	1,84000000	R\$ 7,74	R\$ 14,34
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,93000000	R\$ 108,35	R\$ 100,77
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 a 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,93000000	R\$ 108,92	R\$ 101,35
4431	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,05000000	R\$ 11,83	R\$ 0,59
5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 34 (2 1/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02000000	R\$ 13,58	R\$ 0,27
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,08000000	R\$ 13,58	R\$ 0,37
FNDE113	RESERVATORIO D'AGUA TIPO TAÇA METALICA 10M3 - COLUNA SECA SEM PINTADA	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 19.601,25	R\$ 19.601,25
20206	SARRAPO APARELHADO "2" X "10" CM, EM MACARANDUBA/MAGSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,30000000	R\$ 6,58	R\$ 15,16
6212	TABUA "2,5 X 30" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	8,68000000	R\$ 18,71	R\$ 131,86
TOTAL Materiais						R\$ 38.823,34

Service	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1251 ESCADA DE MARINHEIRO, C/TUBO GALVANIZADO 3/4", H-VAR	SENPA	M	6,97000000	R\$ 335,30	R\$ 2.437,71
99639 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADO FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_PS	SINAPI	M	20,00000000	R\$ 490,84	R\$ 9.816,80
150756 PINTURA COM TINTA ALQUERCA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	SINAPI	M2	10,03000000	R\$ 45,89	R\$ 458,90
TOTAL Servico					R\$ 13.813,47
VALOR:					R\$ 33.667,41

FNDE 78 CISTERNA MODULAR 600 Litros (UN)						
Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE306	Cisternas Modulares Tecnoltr ou equivalente tecnoltr - 600L	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
TOTAL Cotação:						R\$ 1.850,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88046	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26930000	R\$ 22,49	R\$ 6,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26880000	R\$ 27,14	R\$ 7,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,35
VALOR:						R\$ 1.863,35

FNDE 79 SMART FILTRO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE107	SMART FILTRO TECNOLTR OU EQUIVALENTE	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 390,00	R\$ 390,00
				TOTAL Material:		R\$ 390,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


 SANYLLE PRIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CREA CE 370384


 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 Nº 123456789
 2025-01-15

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

Nº 158

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	R\$ 22,48	R\$ 8,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26000000	R\$ 27,14	R\$ 7,02
RUBRICA						
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						
VALOR:						R\$ 493,35

SEM EFEITO

FNDE 416 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
202 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 5,04	R\$ 10,08
208 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,89	R\$ 3,89
20143 JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57,06	R\$ 57,06
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,15250000	R\$ 25,34	R\$ 3,86
TOTAL Material:					R\$ 74,89

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31970000	R\$ 22,48	R\$ 7,19
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21970000	R\$ 27,14	R\$ 6,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,27
VALOR:					R\$ 90,75

FNDE 421 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
202 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 5,04	R\$ 10,08
208 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,89	R\$ 3,89
20143 JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57,06	R\$ 57,06
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,15250000	R\$ 25,34	R\$ 3,86
TOTAL Material:					R\$ 74,89

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31970000	R\$ 22,48	R\$ 7,19
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21970000	R\$ 27,14	R\$ 6,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,27
VALOR:					R\$ 90,75

FNDE 30 CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 22,72	R\$ 45,44
43660 CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXÃO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 59,16	R\$ 59,16
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 25,34	R\$ 1,27
TOTAL Material:					R\$ 105,87

SAMILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2017
CREA CE 379304

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
ENGENHEIRA CIVIL
RUBIA DE OLIVEIRA
CREA 31152

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04070000	R\$ 22,48	R\$ 1,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06070000	R\$ 27,14	R\$ 2,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 4,12
VALOR:						R\$ 188,90

FNDE 417 CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
257	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,57	R\$ 7,14
1988	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 36,68	R\$ 36,68
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 25,34	R\$ 1,90
TOTAL Material						R\$ 45,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12570000	R\$ 22,48	R\$ 2,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12570000	R\$ 27,14	R\$ 3,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 6,24
VALOR:						R\$ 51,94

FNDE 418 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20865	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,19	R\$ 9,57
20141	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 90 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,29	R\$ 17,29
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 25,34	R\$ 1,90
TOTAL Material						R\$ 38,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	R\$ 22,48	R\$ 1,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	R\$ 27,14	R\$ 2,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 4,02
VALOR:						R\$ 32,77

FNDE 419 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20865	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,19	R\$ 9,57
20141	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 90 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,29	R\$ 17,29
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 25,34	R\$ 1,90
TOTAL Material						R\$ 38,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	R\$ 22,48	R\$ 1,82

STAVILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA DE 379384

STAVILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA DE 379384

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	11	760	0,08000000	R\$ 27,14	R\$ 2,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 32,77
VALOR						R\$ 32,77

FNDE 420 CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,30
1366	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,20
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 2,31
TOTAL Material					R\$ 30,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	R\$ 22,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	R\$ 27,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 49,62
VALOR					R\$ 49,62

FNDE 11 BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE117	Banheira Rígida-Branca, Burigoto ou equivalente	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 89,90
FNDE117	Banheira Rígida-Branca, Burigoto ou equivalente	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 89,90
3140	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,95
37588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL GROMADO, 1,1/2", SEM LADRAO, COM TAMPÃO PLÁSTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 70,78
TOTAL Material					R\$ 254,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 27,14
88216	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 27,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 54,28

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80683	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_012020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,00
TOTAL Serviço					R\$ 13,00
VALOR					R\$ 99,83

FNDE 219 LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10426	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLLINA), DIMENSÕES 140 X 30" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 99,15
4301	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 35,57
37326	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	R\$ 1,38
TOTAL Material					R\$ 136,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	R\$ 27,14
TOTAL					R\$ 10,50

SAMPLE
SAMPLE PARA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379354

10/11/2025
15/11/2025
15/11/2025
15/11/2025

88318	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,18850000	R\$ 21,94	R\$ 4,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 159,14
VALOR:					R\$ 159,14

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
F.L. Nº 74
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 40 X 50 X 12" CM	SINAPI	1,00000000	R\$ 148,73	R\$ 148,73
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	0,20740000	R\$ 47,86	R\$ 14,24
TOTAL Material:					R\$ 162,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,47740000	R\$ 27,30	R\$ 13,04
88318	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,15040000	R\$ 21,94	R\$ 3,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,34
VALOR:					R\$ 179,31

FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	0,02100000	R\$ 3,05	R\$ 0,06
36791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1188)	SINAPI	1,00000000	R\$ 131,94	R\$ 131,94
TOTAL Material:					R\$ 132,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,00600000	R\$ 27,14	R\$ 2,81
88318	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,03030000	R\$ 21,94	R\$ 0,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,47
VALOR:					R\$ 135,29

FNDE 14 TORNEIRA ELETTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11777	TORNEIRA ELETTRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	1,00000000	R\$ 186,26	R\$ 186,26
TOTAL Material:					R\$ 186,26

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	0,50000000	R\$ 14,04	R\$ 7,47
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88384	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,50000000	R\$ 28,25	R\$ 14,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,13
VALOR:					R\$ 207,86

FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	0,04200000	R\$ 3,05	R\$ 0,17
44045	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)	SINAPI	1,00000000	R\$ 309,57	R\$ 309,57
TOTAL Material:					R\$ 309,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

SAMUEL PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 379384

RECEBUEIRO DE
RECEBUEIRO DE
RECEBUEIRO DE
RECEBUEIRO DE
RECEBUEIRO DE

88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FI SINAPI	- H	0,46300000	R\$ 27,14	R\$ 12,57
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	- H	0,14500000	R\$ 21,94	R\$ 3,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 15,71
VALOR:						R\$ 225,58

FNDE 13 TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 14,94	R\$ 7,47
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 7,47
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 28,25	R\$ 14,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 14,13
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100800	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM -CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 101,18	R\$ 101,18
					TOTAL Serviço	R\$ 101,18
					VALOR:	R\$ 122,78

FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 251,64	R\$ 251,64
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-S	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 20,57	R\$ 123,42
					TOTAL Material:	R\$ 275,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54850000	R\$ 27,14	R\$ 15,74
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25880000	R\$ 21,94	R\$ 5,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 21,42
					VALOR:	R\$ 497,56

FNDE 215 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01020000	R\$ 14,54	R\$ 0,28
12228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	UN	1,08000000	R\$ 473,85	R\$ 473,85
					TOTAL Material	R\$ 474,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92480000	R\$ 22,43	R\$ 20,76
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92480000	R\$ 27,14	R\$ 25,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 45,86
					VALOR	R\$ 520,02

FNDE 15 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------


 GENTILE PAIVA OLIVEIRA
 CONTÁBIL
 CREA 036/2018


 GENTILE PAIVA OLIVEIRA
 CONTÁBIL
 CREA 036/2018

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00000000	R\$ 48,84	R\$ 48,84
TOTAL Material:					R\$ 48,84
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,50000000	R\$ 22,40
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,50000000	R\$ 27,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 49,54
VALOR:					R\$ 98,38

SEM EFEITO

FNDE 16 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SNAP1	UN	1,00000000	R\$ 48,84
TOTAL Material:					R\$ 48,84
VALOR:					R\$ 48,84

FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11188	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SNAP1	M2	1,00000000	R\$ 458,88
4343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	SNAP1	UN	4,00000000	R\$ 22,92
TOTAL Material:					R\$ 481,80
Mão de Obra					
6111	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	SNAP1	H	0,40000000	R\$ 13,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,80
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEGREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	2,00000000	R\$ 27,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 51,70
VALOR:					R\$ 543,30

FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38188	DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM BRACOSCANO, SEM DESVIADOR	SNAP1	UN	1,00000000	R\$ 183,00
3142	ITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 18 M (S. X C)	SNAP1	UN	1,00000000	R\$ 3,30
TOTAL Material:					R\$ 186,30
Mão de Obra					
2098	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SNAP1	H	0,50000000	R\$ 19,50
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,50
VALOR:					R\$ 205,80

FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37338	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	SNAP1	UN	1,00000000	R\$ 10,40
TOTAL Material:					R\$ 10,40
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,50000000	R\$ 22,40
TOTAL:					R\$ 32,80

Serviço
SÉRGIO PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA DE 379384

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
RUA DO OURO, 150 - MARACÁ
Cidade do Rio de Janeiro - RJ, 20040-020

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 27,14	R\$ 13,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,57
VALOR:						R\$ 30,25

FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0.11.030.0051 1	Regulador de alta pressão, vórtice 9 kg; ref. 76510/3 fabricação Alanga ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 658,10	R\$ 658,10
TOTAL Material:						R\$ 658,10
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,48	R\$ 6,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 27,14	R\$ 13,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,31
VALOR:						R\$ 678,41

FNDE 301 CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1163	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,80	R\$ 7,80
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02000000	R\$ 14,56	R\$ 0,29
TOTAL Material:						R\$ 8,09
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 22,48	R\$ 3,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 27,14	R\$ 4,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,44
VALOR:						R\$ 15,53

FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02000000	R\$ 14,56	R\$ 0,29
33388	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIÂMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	SINAPI	UN	1,10000000	R\$ 16,04	R\$ 17,84
TOTAL Material:						R\$ 17,84
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 22,48	R\$ 3,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 27,14	R\$ 4,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,44
VALOR:						R\$ 25,38

FNDE 261 REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02000000	R\$ 14,56	R\$ 0,44
13904	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 215,00	R\$ 215,00


 SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CREA CE 370384


 INGENHARIA CIVIL
 CREA 06/174062-7
 06/04/2022

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R\$ 22,48	R\$ 10,34
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R\$ 27,14	R\$ 12,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 22,68
VALOR:						R\$ 228,99

FNDE 332 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA (UN)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
36502	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO MOTOR 143 MM HMD - 6 MCA / 16,8 MSH A 38 MCA / 6,8 M3/H	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4.107,80	R\$ 4.107,80
TOTAL Equipamento						R\$ 4.107,80

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	ABRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 3/4" MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 1,54	R\$ 6,16
32937	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,37	R\$ 1,48
32996	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,70000000	R\$ 4,10	R\$ 2,87
TOTAL Material						R\$ 10,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63000000	R\$ 23,50	R\$ 14,85
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,06470000	R\$ 22,48	R\$ 68,89
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63000000	R\$ 28,25	R\$ 17,85
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,06470000	R\$ 27,14	R\$ 83,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 184,87
VALOR:						R\$ 4.301,09

FNDE 112 PRESSOSTATO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0.17.000.04243 1	Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior através 1/2" arco 1/4", faixa de operação até 16 bar, ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Wiaase Instrument, WLF-5516 da Wema ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 470,39	R\$ 470,39
TOTAL Material						R\$ 470,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 27,14	R\$ 19,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 19,00
VALOR:						R\$ 489,39

FNDE 113 TANQUE DE PRESSÃO (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE110	TANQUE DE PRESSÃO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 549,02	R\$ 549,02
TOTAL Material						R\$ 549,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 27,14	R\$ 8,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 8,14

Santa
SANTILE POIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CCEA CE 379354

10/10/2025
SANTILE POIVA OLIVEIRA
CCEA CE 379354

FNDE 114 VÁLVULA DE ALÍVIO (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	SINAPI	UN	0,94000000	R\$ 8,56	R\$ 8,04
0.05.000.06405 2 Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada, com pressão de ajuste de 6,1 até 10 kg/cm², DN= 3/4" ref. SV 17 da Spirax-Sarco ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 2.697,58	R\$ 2.697,58
TOTAL Material					R\$ 2.705,62
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54000000	R\$ 22,48	R\$ 12,14
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34000000	R\$ 27,14	R\$ 14,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 26,79
VALOR					R\$ 2.732,42

FNDE 328 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 53,70	R\$ 53,70
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02700000	R\$ 14,56	R\$ 0,39
7307 FUNDOS ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	SINAPI	L	0,00300000	R\$ 38,95	R\$ 0,12
TOTAL Material					R\$ 54,21
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52200000	R\$ 22,48	R\$ 11,73
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50200000	R\$ 27,14	R\$ 14,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 25,90
VALOR					R\$ 80,11

FNDE 328 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3450 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,83	R\$ 10,83
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02700000	R\$ 14,56	R\$ 0,39
7307 FUNDOS ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	SINAPI	L	0,00300000	R\$ 38,95	R\$ 0,12
TOTAL Material					R\$ 11,33
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52200000	R\$ 22,48	R\$ 11,73
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52200000	R\$ 27,14	R\$ 14,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 25,90
VALOR					R\$ 37,23

FNDE 335 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,61	R\$ 4,61
TOTAL Material					R\$ 4,61
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SINAPI
SAMILLE ALVES OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 3793114

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	R\$ 22,48	R\$ 6,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	R\$ 27,14	R\$ 8,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,38
VALOR						R\$ 19,89

FNDE 333 LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,02900000	R\$ 37,08	R\$ 1,38
43364	LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBÔNICO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSÃO 3.000 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 58,62	R\$ 58,62
					TOTAL Material:	R\$ 60,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	R\$ 20,48	R\$ 5,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	R\$ 27,14	R\$ 6,51
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	R\$ 28,64	R\$ 6,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,78
					VALOR:	R\$ 78,78

FNDE 331 LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,06700000	R\$ 37,08	R\$ 2,48
40373	LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSÃO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 251,52	R\$ 251,52
TOTAL Material						R\$ 254,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COSTEIRO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 22,48	R\$ 8,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 27,14	R\$ 9,90
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 28,64	R\$ 10,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 28,44
VALOR						R\$ 282,44

FNDE 334 LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 38 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08000000	R\$ 37,08	R\$ 3,30
43373	LUVA DE REDUÇAO EM AÇO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSÃO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"	SINAPI	UN	0,70000000	R\$ 251,52	R\$ 176,06
					TOTAL Material:	R\$ 179,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62000000	R\$ 22,48	R\$ 13,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62000000	R\$ 27,14	R\$ 16,83
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62000000	R\$ 28,64	R\$ 17,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 48,55
					VALOR:	R\$ 227,91

SAMILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 167/2025
CREA CE 000000-4

FND: 335 LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM, INSTALADO EM PRIMARIAS - FORNECIMENTO E INST

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 37,58	R\$ 9,39
40073	LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSÃO 3.000 LBS, DN 2" X 2 1/2"	SINAPI	UN	0,90000000	R\$ 251,52	R\$ 201,26
					TOTAL Material	R\$ 294,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52000000	R\$ 22,48	R\$ 11,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52000000	R\$ 27,14	R\$ 10,62
88217	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52000000	R\$ 28,94	R\$ 17,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 40,32
					VALOR	R\$ 334,67

FNDE 338 LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 3,50 MM	SINAPI	KG	0,26000000	R\$ 37,26
40073	LUVA DE PROTEÇÃO EM AÇO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN 5W, PRESSÃO 9.000 LBS. DN 9" X 2 1/2"	SINAPI	LN	0,90000000	R\$ 251,32
				TOTAL Material	R\$ 288,58
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52000000	R\$ 22,48
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52000000	R\$ 27,14
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52000000	R\$ 26,54
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 76,16
				VALOR	R\$ 278,74

FNDE 337 TE DE REDUÇAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0.08000000	R\$ 37,08	R\$ 3.33
6303	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 28,20	R\$ 28,20
				TOTAL Material		R\$ 37,28
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	ALIJAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,48	R\$ 6,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 27,14	R\$ 8,14
88217	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 28,04	R\$ 8,53
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 23,41
				VALOR:		R\$ 35,69

FNDE 338 TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" (UN)

Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11062 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	1	KG	0,08500000	R\$ 37,06	R\$ 3,71

SAMILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA Nº 0025
184

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 369

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO

6319	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"	UN	1,00000000	R\$ 54,93	
				TOTAL Material:	R\$ 54,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,48
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 27,14
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 29,64
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 81,71
				VALOR:	R\$ 136,64

FNDE 339 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08000000	R\$ 37,08
6307	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 151,99
				TOTAL Material:	R\$ 189,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,48
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 27,14
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 29,64
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 81,71
				VALOR:	R\$ 270,78

FNDE 340 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08000000	R\$ 37,08
6306	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 151,99
				TOTAL Material:	R\$ 189,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,48
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 27,14
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 29,64
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 81,71
				VALOR:	R\$ 270,78

FNDE 341 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08000000	R\$ 37,08
6308	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 158,40
				TOTAL Material:	R\$ 195,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,48

SAMILLE FAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
1.º VICE-PRESIDENTE
SAMILLE FAIVA OLIVEIRA
CPF: 043.188.521-1
CNPJ: 06.908.182

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 27,14	R\$ 8,14
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 26,54	R\$ 8,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 53,68	R\$ 16,73
VALOR:					R\$ 183,18	

FNDE 342 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08000000	R\$ 37,08	R\$ 3,30
5214	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 218,62	R\$ 218,62
					TOTAL Material:	R\$ 221,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,48	R\$ 6,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 27,14	R\$ 8,14
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 26,54	R\$ 8,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 23,47
					VALOR:	R\$ 245,39

FNDE 343 ADAPTADOR PARA MANÔMETRO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12888	ADAPTADOR EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PRELIMINAR DE COMBATE A INCÊNDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 94,19	R\$ 94,19
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08000000	R\$ 37,08	R\$ 3,30
					TOTAL Material:	R\$ 97,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,48	R\$ 6,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 27,14	R\$ 8,14
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 26,54	R\$ 8,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 23,47
					VALOR:	R\$ 120,97

FNDE 344 LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08000000	R\$ 37,08	R\$ 3,30
12410	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,05	R\$ 15,05
					TOTAL Material:	R\$ 18,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 22,48	R\$ 3,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 27,14	R\$ 4,07
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 26,64	R\$ 4,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,74
					VALOR:	R\$ 30,09

SINAPI
SÂMUEL PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 370384

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ENGENHARIA CIVIL
RUA MARQUÊS DE SÃO CARLOS, 222
CAMPUS MARACÁ
22251-900 - RIO DE JANEIRO, RJ

FNDE 345 BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
779 BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,71	R\$ 7,71
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08500000	R\$ 37,08	R\$ 3,30
TOTAL Material					R\$ 11,01

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 22,48	R\$ 3,37
88297 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 27,14	R\$ 4,07
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 28,04	R\$ 4,30

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares

R\$ 11,74

VALOR

R\$ 22,75

FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4791 ADRISIVO ACRILICO DE BASE AQUEÇA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,00000000	R\$ 44,30	R\$ 0,89
37556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18601)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 46,01	R\$ 46,01
TOTAL Material					R\$ 46,90

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,98	R\$ 6,89

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares

R\$ 6,89

VALOR

R\$ 54,40

FNDE 350 TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 35 MM² (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1567 TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 35 MM², COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,74	R\$ 6,74
TOTAL Material					R\$ 6,74

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88047 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 23,50	R\$ 4,70
88064 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 26,20	R\$ 5,24

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares

R\$ 9,94

VALOR

R\$ 17,08

FNDE 348 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1048 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE USO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,40	R\$ 9,40
TOTAL Material					R\$ 9,40

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88047 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,50	R\$ 2,35
88064 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 26,20	R\$ 2,62

Samilia
SAMILIA RODRIGUES OLIVEIRA
PORT: 11/04/2025
CREA CE 379334LUIZ CARLOS OLIVEIRA
LUIZ CARLOS OLIVEIRA
CPF: 04.118.052-7
CNPJ: 00.000.000-00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	
VALOR	R\$ 14,59

FIDE 347 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
TOTAL Material					R\$ 1,33
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 23,50	R\$ 1,18
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 28,25	R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 2,59
VALOR					R\$ 4,52

FIDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
379 ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURTO = 18 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,55	R\$ 1,55
TOTAL Material					R\$ 1,55
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 23,50	R\$ 0,24
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 28,35	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 0,52
VALOR					R\$ 2,07

FIDE 349 CAIXA DE LUZ 4 X 2" EM AÇO ESMALTADA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3556 CAIXA DE LUZ 4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,30	R\$ 1,30
TOTAL Material					R\$ 1,30
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,50	R\$ 2,35
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 28,35	R\$ 2,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 5,18
VALOR					R\$ 6,48

FIDE 180 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1880 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1" PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,81	R\$ 2,81
TOTAL Material					R\$ 2,81
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 23,50	R\$ 5,88
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 28,25	R\$ 6,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 12,19
VALOR					R\$ 15,00

FIDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)

Samille
SAMILLE SILVA OLIVEIRA
PORTO ALEGRE, 12/02/2025
CREA DE 370384

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
370 ARFUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,55	R\$ 1,55
TOTAL Material					R\$ 1,55
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 23,50	R\$ 0,24
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 28,25	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 0,52
VALOR:					R\$ 2,07

FNDE 354 BUCHA DE NYLON (UND)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA 5x5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
TOTAL Material					R\$ 0,55
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 23,50	R\$ 0,24
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 28,25	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 0,52
VALOR:					R\$ 1,07

FNDE 355 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,3 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM (UND)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,3 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Material					R\$ 0,23
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 23,50	R\$ 0,24
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 28,25	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 0,52
VALOR:					R\$ 0,75

FNDE 356 PORÇA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4" (UND)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30927 PORÇA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
TOTAL Material					R\$ 0,37
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 23,50	R\$ 0,24
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 28,25	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 0,52
VALOR:					R\$ 0,89

FNDE 357 VERGALHO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) (KG)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
33966 VERGALHO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 4,10	R\$ 4,10
TOTAL Material					R\$ 4,10
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


 SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA Nº 7625
 CREA Nº 070384


 SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
 CREA Nº 070384

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 23,09	R\$ 23,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 27,74	R\$ 22,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,71	R\$ 2,71
VALOR:					R\$ 5,81	R\$ 5,81

FNDE 358 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR (KG)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1381	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 26,08	R\$ 26,08
TOTAL Material:					R\$ 26,08	R\$ 26,08
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,09	R\$ 23,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,74	R\$ 27,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 50,83	R\$ 50,83
VALOR:					R\$ 76,91	R\$ 76,91

FNDE 359 CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
892	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,03000000	R\$ 10,65	R\$ 10,65
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,79	R\$ 0,34
TOTAL Material:					R\$ 11,01	R\$ 11,01
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 23,50	R\$ 1,20
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 28,25	R\$ 1,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,64	R\$ 2,64
VALOR:					R\$ 13,64	R\$ 13,64

FNDE 360 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
41480	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	SINAPI	UN	1,36000000	R\$ 47,40	R\$ 47,40
TOTAL Material:					R\$ 47,40	R\$ 47,40
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88300	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	R\$ 27,00	R\$ 3,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	R\$ 21,34	R\$ 2,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,04	R\$ 6,04
Serviço						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101518	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	SINAPI	M2	0,01410000	R\$ 270,56	R\$ 3,87
TOTAL Serviço:					R\$ 3,87	R\$ 3,87
VALOR:					R\$ 57,11	R\$ 57,11

FNDE 362 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 205" MM, COM PORCA E ARRUELA (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
13279	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 205" MM, COM PORCA E ARRUELA	SINAPI	KG	3,00000000	R\$ 25,53	R\$ 25,53
TOTAL Material:					R\$ 25,53	R\$ 25,53

Samuel
SANTILLI RIBEIRO OLIVEIRA
PORTUGAL, 177 2025
CREA CE 079384

Comissão de Planejamento
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	R\$ 23,50	R\$ 4,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	R\$ 28,25	R\$ 5,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 10,35
VALOR					R\$ 10,35

FNDE 361 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM (UN)					
Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1597	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	UN	1,00000000	R\$ 11,80	R\$ 11,80
TOTAL Material					R\$ 11,80
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18630000	R\$ 23,50	R\$ 4,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18630000	R\$ 28,25	R\$ 5,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 9,64
VALOR					R\$ 21,44

FNDE 364 PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM (UN)					
Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4333	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	UN	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Material					R\$ 0,32
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02000000	R\$ 21,94	R\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 0,44
VALOR					R\$ 0,76

FNDE 363 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM (UN)					
Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	UN	1,00000000	R\$ 18,81	R\$ 18,81
TOTAL Material					R\$ 18,81
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18630000	R\$ 23,50	R\$ 4,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18630000	R\$ 28,25	R\$ 5,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 9,64
VALOR					R\$ 28,45

FNDE 369 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)					
Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
36091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00000000	R\$ 2,30	R\$ 2,30
TOTAL Material					R\$ 2,30
Serviço					
Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91340	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	R\$ 10,82	R\$ 10,82
TOTAL Serviço					R\$ 10,82
VALOR					R\$ 13,12


 SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157/2025
 CREA 043.138/4


 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 Nº 10.140.000/2025

FNDE 22 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
35465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AC)	SNAP	1	R\$ 54,53	R\$ 54,53
TOTAL Material:					R\$ 54,53
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	R\$ 23,50	R\$ 4,70
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	R\$ 25,25	R\$ 5,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,55
VALOR:					R\$ 74,88

FNDE 53 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
35455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SNAP	UN	R\$ 151,30	R\$ 151,30
1571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SNAP	UN	R\$ 1,25	R\$ 3,04
TOTAL Material:					R\$ 154,34
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	R\$ 23,50	R\$ 5,88
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	R\$ 25,25	R\$ 7,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,94
VALOR:					R\$ 167,28

FNDE 365 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
35456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SNAP	UN	R\$ 151,41	R\$ 151,41
1571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SNAP	UN	R\$ 1,25	R\$ 5,04
TOTAL Material:					R\$ 156,45
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	R\$ 23,50	R\$ 5,88
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	R\$ 25,25	R\$ 7,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,94
VALOR:					R\$ 169,39

FNDE 84 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
35457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	SNAP	UN	R\$ 105,05	R\$ 105,05
1571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SNAP	UN	R\$ 1,25	R\$ 3,04
TOTAL Material:					R\$ 108,09
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	R\$ 23,50	R\$ 5,88
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	R\$ 25,25	R\$ 7,06

Samy
SÂMILE PAIVA OLIVEIRA
CONTARIA 157 2025

157 2025
157 2025
157 2025

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,50
VALOR:	R\$ 12,50

FNDE 85 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
33458 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 308,00	R\$ 308,00
1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAUSO DE FIDACAO M5	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 1,25	R\$ 5,00
TOTAL Material:					R\$ 313,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,50	R\$ 7,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 28,25	R\$ 8,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,53
VALOR:					R\$ 328,53

FNDE 24 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.04.000.06211 2 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x50mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 70,75	R\$ 70,75
P.04.000.06217 3 Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 61,19	R\$ 61,19
TOTAL Material:					R\$ 131,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	R\$ 23,50	R\$ 2,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	R\$ 28,25	R\$ 2,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,41

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA, AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 55,05	R\$ 55,05
TOTAL Serviço:					R\$ 55,05
VALOR:					R\$ 191,40

FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.04.000.06203 8 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 36,34	R\$ 36,34
P.04.000.06217 5 Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 15,41	R\$ 15,41
TOTAL Material:					R\$ 51,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	R\$ 23,50	R\$ 2,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	R\$ 28,25	R\$ 2,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,41

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

SAMUEL OLIVEIRA
PORTA 117 4025
CREA CE-0793364

35522	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 55,65	
						TOTAL Serviço
						R\$ 55,65
						VALOR
						R\$ 114,41

FNDE 345 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO (UND)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1040	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LISA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,42
TOTAL Material:					R\$ 9,42
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,50
99254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 28,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 51,75
VALOR					R\$ 14,60

FNDE 366 TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	50,40000000	R\$ 1,79
30997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	25,30000000	R\$ 0,37
P.04.000.06218-0	Supporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 200x50mm.	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 16,03
TOTAL Material:					R\$ 114,08
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 23,50
99254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 28,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 51,75
VALOR					R\$ 140,52

FNDE 367 TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	50,40000000	R\$ 1,79
30997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	25,30000000	R\$ 0,37
P.04.000.06218-7	Supporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 50x50mm	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 0,68
TOTAL Material:					R\$ 194,48
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 23,50
99254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 28,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 51,75
VALOR					R\$ 133,19

FNDE 368 TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


 SORAIA OLIVEIRA
 PORTARIA 187/2025
 CREA CE 379384


 SORAIA OLIVEIRA
 PORTARIA 187/2025
 CREA CE 379384

12348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 32MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	SINAPI	UN	50,40000000	R\$ 1,78	
30297	PORÇA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	25,20000000	R\$ 9,37	R\$ 9,37
P.04.005.062.15	1 Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 250x50mm	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 18,54	R\$ 18,54
RUBRICA						
TOTAL Material					R\$ 116,67	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 23,50	R\$ 12,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 28,25	R\$ 14,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 26,46
VALOR:						R\$ 143,13

FNDE 589 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (UNO)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1550	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 118,23	R\$ 118,23
TOTAL Material						R\$ 118,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,50	R\$ 7,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 28,25	R\$ 8,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 15,53
VALOR:						R\$ 133,76

FNDE 371 TAMPÃO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,15000000	R\$ 3,78	R\$ 0,57
2998	TAMPÃO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRÂNEO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,53	R\$ 14,53
TOTAL Material						R\$ 15,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 22,48	R\$ 3,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 27,14	R\$ 4,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 7,44
VALOR:						R\$ 22,54

FNDE 370 TAMPÃO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,35000000	R\$ 3,78	R\$ 0,19
2998	TAMPÃO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRÂNEO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,03	R\$ 8,03
TOTAL Material						R\$ 8,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 22,48	R\$ 3,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 27,14	R\$ 4,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 7,44
VALOR:						R\$ 15,66


 SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157/2025
 CREA PE 379364

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 CREA PE 379364
 FEITO

10/05/2025
 15:00h
 15/05/2025

FNDE 372 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

RUBRICA

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38248 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)	SINAPI	M	1,30000000	R\$ 13,61	R\$ 17,69
TOTAL Material:					R\$ 17,69
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17210000	R\$ 23,50	R\$ 4,04
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17210000	R\$ 28,25	R\$ 4,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,90
VALOR:					R\$ 26,59

FNDE 26 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2688 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 10,38	R\$ 10,51
TOTAL Material:					R\$ 10,51
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	R\$ 23,50	R\$ 3,83
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	R\$ 28,25	R\$ 4,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,43
VALOR:					R\$ 18,94

FNDE 27 ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
27128 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,48	R\$ 11,00
TOTAL Material:					R\$ 11,00
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25100000	R\$ 23,50	R\$ 5,90
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33100000	R\$ 28,25	R\$ 9,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,25
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADORA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 12,82	R\$ 12,82
TOTAL Serviço:					R\$ 12,82
VALOR:					R\$ 28,88

FNDE 373 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
402 GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESURA 10MM, ABERTURA 25MM	SINAPI	LN	1,00000000	R\$ 12,11	R\$ 12,11
TOTAL Material:					R\$ 12,11
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 23,50	R\$ 1,18
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 28,25	R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,59

Semille Paiva Oliveira
PORTARIA 157/2025
CREA CE 379384

FNE 32 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM (M)						RUBRICA
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,50	R\$ 10,50
					TOTAL Material:	R\$ 10,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,11	R\$ 19,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 26,25	R\$ 25,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 44,43
					VALOR:	R\$ 54,93

FNE 378 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8451	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PARA UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	SERIPA	UN	1,00000000	R\$ 45,93	R\$ 45,93
38775	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 94,37	R\$ 94,37
				TOTAL Material:		R\$ 140,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 23,50	R\$ 5,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50180000	R\$ 26,25	R\$ 13,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 18,58
				VALOR:		R\$ 158,88

FNE 379 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	SERIPRA	UN	1,00000000	R\$ 94,71	R\$ 94,71
				TOTAL Material:		R\$ 94,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14800000	R\$ 23,50	R\$ 3,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35510000	R\$ 26,25	R\$ 9,33
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 12,81
				VALOR:		R\$ 107,52

FNE 380 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32 W)	SEMPRA	UN	1,10000000	R\$ 91,26	R\$ 99,39
				TOTAL Material:		R\$ 99,39
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14800000	R\$ 23,50	R\$ 3,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35510000	R\$ 26,25	R\$ 9,33
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 12,81
				VALOR:		R\$ 112,20

Samir
SAMI EL RAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 370384

FNDE 381 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11477 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,70	R\$ 42,70
19474 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 125 ATÉ 150W	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 68,69	R\$ 68,69
17996 PROJETO EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO= 400MM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOR E IGNITOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 631,50	R\$ 631,50
TOTAL Material:					R\$ 742,89
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17350000	R\$ 23,50	R\$ 4,06
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41650000	R\$ 26,25	R\$ 11,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,84
VALOR:					R\$ 758,73

FNDE 382 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11477 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,70	R\$ 42,70
19474 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 125 ATÉ 150W	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 68,69	R\$ 68,69
17996 PROJETO EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO= 400MM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOR E IGNITOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 631,50	R\$ 631,50
TOTAL Material:					R\$ 742,89
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17350000	R\$ 23,50	R\$ 4,06
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41650000	R\$ 26,25	R\$ 11,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,84
VALOR:					R\$ 758,73

FNDE 383 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
39753 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 887,62	R\$ 887,62
TOTAL Material:					R\$ 887,62
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53840000	R\$ 23,50	R\$ 12,55
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53840000	R\$ 26,25	R\$ 14,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 26,58
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2018	SINAPI	M3	0,01880000	R\$ 718,43	R\$ 13,50
TOTAL Serviço:					R\$ 13,50
VALOR:					R\$ 924,44

FNDE 384 SWITCH TIPO 48 PORTAS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Samil
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 379104

P.17.006.03149 0	Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 mínimo com porta de saída em fibra	SP Outras	UN	1,00000000	R\$ 2.758,97	
					TOTAL Material:	R\$ 4.317,34
Mão de Obra com Encargos Complementares						
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 23,50	R\$ 188,00
80294	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 28,25	R\$ 226,00
80296	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 38,39	R\$ 307,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 721,12
					VALOR:	R\$ 5.239,46

FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN)						
Material						
33807	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 2,54 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,59	R\$ 31,59
					TOTAL Material:	R\$ 31,59
Mão de Obra com Encargos Complementares						
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,50	R\$ 11,75
80296	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 38,39	R\$ 11,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,27
					VALOR:	R\$ 54,86

FNDE 388 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" (UN)						
Material						
P.13.000.03052 7	Régua com 12 tomadas 2P+T 250 V, com cabo tipo fita de linha	SP Outras	UN	1,00000000	R\$ 96,00	R\$ 96,00
					TOTAL Material:	R\$ 96,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,50	R\$ 11,75
80294	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,25	R\$ 28,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 40,00
					VALOR:	R\$ 136,00

FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U (un)						
Material						
P.17.006.03051 9	Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U	SP Outras	UN	1,00000000	R\$ 19,88	R\$ 19,88
					TOTAL Material:	R\$ 19,88
Mão de Obra com Encargos Complementares						
80294	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 28,25	R\$ 5,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,65
					VALOR:	R\$ 25,53

FNDE 122 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (UN)						
Material						
P.17.006.03050 1	Bandeja deslizante para Rack de 19" padrão, com profundidade de 770 mm	SP Outras	UN	1,00000000	R\$ 160,67	R\$ 160,67

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
				0,75000000	R\$ 22,11
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 28,25
					R\$ 21,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	
				R\$ 27,77	
				VALOR:	
				R\$ 156,44	

FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4374	BUCHA DE NYLON SEM ASA S10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 5,55
P.17.000.03051	Caixa organizadora de cabos para rack, 13" 1 U	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 15,85
					R\$ 15,85
				TOTAL Material:	
				R\$ 21,40	

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000			R\$ 22,11	R\$ 4,42
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000			R\$ 28,25	R\$ 5,85
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 10,27		
				VALOR:		R\$ 31,67		

FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,55
					R\$ 1,55
				TOTAL Material:	
				R\$ 1,55	

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000			R\$ 23,50	R\$ 0,24
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000			R\$ 28,25	R\$ 0,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 0,52		
				VALOR:		R\$ 2,07		

FNDE 354 BUCHA DE NYLON (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4374	BUCHA DE NYLON SEM ASA S10	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,55
					R\$ 3,55
				TOTAL Material:	
				R\$ 3,55	

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000			R\$ 23,50	R\$ 0,24
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000			R\$ 28,25	R\$ 0,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 0,52		
				VALOR:		R\$ 1,97		

FNDE 389 PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MACHO, SEXTAVADO, SEM PORCA (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4328	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MACHO, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,67
					R\$ 2,67
				TOTAL Material:	
				R\$ 2,67	

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000			R\$ 23,50	R\$ 0,24

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 28,25	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,28
VALOR:						R\$ 0,28

FNDE 358 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UND)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30907	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,37
TOTAL Material:					R\$ 3,37
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 23,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 28,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 51,75
VALOR:					R\$ 55,12

FNDE 31 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M (UN)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 190,13
TOTAL Material:					R\$ 190,13
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,75000000	R\$ 27,94
88310	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,75000000	R\$ 27,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 55,88
VALOR:					R\$ 246,01

FNDE 383 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
39763	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 857,82
TOTAL Material:					R\$ 857,82
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53840000	R\$ 28,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53840000	R\$ 28,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 56,75
Serviço	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AT_09/2019	SINAPI	M3	0,21880000	R\$ 716,40
TOTAL Serviço:					R\$ 716,40
VALOR:					R\$ 1630,97

FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,79
TOTAL Material:					R\$ 14,79
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

S. Silva
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
DE 15 DE 379384

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FEINPA	H/	0,20620000	R\$ 23,50	R\$ 4,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 28,25	R\$ 5,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,64
VALOR:						R\$ 25,46

FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1160	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 75,72	R\$ 75,72
C2301	TAMPA NORMAL PRDUTO PERFURADO, ATÉ (100X100)mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 78,79	R\$ 78,79

TOTAL Material: R\$ 149,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 23,50	R\$ 2,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 28,25	R\$ 3,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 6,21

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92557	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA, AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 55,65	R\$ 55,65

TOTAL Serviço: R\$ 55,65

VALOR: R\$ 211,37

FNDE 374 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1552	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 307,01

TOTAL Material: R\$ 307,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 23,50	R\$ 9,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 28,25	R\$ 11,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,70
					VALOR:	R\$ 327,71

FNDE 368 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1550	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 118,23	R\$ 118,23

TOTAL Material: R\$ 118,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,50	R\$ 7,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 28,25	R\$ 8,48
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 15,53
				VALOR:		R\$ 133,76

FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Samlle
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

Eng. Civil
SINAPI
CNPJ 08.118.024/0001-01
Cidade 50.452

1049	CABEOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LIGO DE 300 GRAUS, DE 1 1/2"	SNAP	FLUOR	787	5	00000000	R\$ 9,43	R\$ 9,43	SEM N°
------	---	------	-------	-----	---	----------	----------	----------	--------

LIBRERIA

FRANK A. MATHIAS

RUBRICA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,10000000	R\$ 23,50	R\$ 2,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,10000000	R\$ 28,25	R\$ 2,83
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 5,18
				VALOR:		R\$ 14,88

FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO (UN)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1578 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8.	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 5,29	R\$ 5,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,11	R\$ 4,42
58264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 28,20	R\$ 5,65
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 10,07
				VALOR		R\$ 15,30

FNDE 118 TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FUJO= 18MM	SINAPI	UN	50.40000000	R\$ 1,70	R\$ 86,70
38997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	25.20000000	R\$ 0,37	R\$ 9,32
P.04.000.06218 II	Suporte para eletrodos galvanizado a fogo, 150x50mm	SP Obras	UN	1.00000000	R\$ 13,60	R\$ 13,60
				TOTAL Material:		R\$ 111,62

Itens de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 23,50	R\$ 12,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 28,25	R\$ 14,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 26,46
				VALOR:		R\$ 126,16

FNDE 42 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR (UN)

Equipamento	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	TOTAL
Q.01.000.04750 E	1	UN	R\$ 445,77	R\$ 445,77
TOTAL Equipamento:				R\$ 445,77

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
347	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,80000000	R\$ 14,94	R\$ 11,95
348	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,80000000	R\$ 19,50	R\$ 15,60
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 27,55
				VALOR:		R\$ 473,33

SAMUEL
SAMILLE PATIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 179384

FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.04.000.04217 4	Eletroduto com costura galvanizada eletroliticamente, DN - 4 - NBR13057	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 108,19
TOTAL Material					R\$ 108,19
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,02
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 6,90
TOTAL Mão de Obra					R\$ 17,92
VALOR:					R\$ 126,11

FNDE 45 COIFA EM AÇO INOX 180CM X 150CM (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
N.06.000.05029 8	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²	SP Obras	M2	1,00000000	R\$ 8.858,23
TOTAL Material					R\$ 8.858,23
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,02
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,70
TOTAL Mão de Obra					R\$ 41,72
VALOR:					R\$ 8.900,95

FNDE 71 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.18.000.04807 3	RA solda com carvão para solda exotérmica nº 150 a 250	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 32,74
TOTAL Material					R\$ 32,74
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02115000	R\$ 23,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02115000	R\$ 28,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 51,74
VALOR:					R\$ 84,48

FNDE 74 VERGALHÃO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	0,04000000	R\$ 5,74
TOTAL Material					R\$ 5,74
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R\$ 22,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R\$ 25,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 47,36
VALOR:					R\$ 53,10

FNDE 75 BARRA CHATA EM ALUMINIO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

SAMILE
SAMILE PRIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 379334

553	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 35,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2268 KG/M	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 11,30	SEANNE
				TOTAL Material		
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 26,35	R\$ 8,43
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 21,94	R\$ 6,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 14,99
				VALOR		R\$ 26,27

FNDE 38 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
32	ACAO CA 50, 6,3 MM, VERTICAL	SINAPI	KG	33,50000000	R\$ 6,60	R\$ 201,12
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWD, D = 1,35 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWD, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,35000000	R\$ 16,73	R\$ 9,28
387	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,50000000	R\$ 131,88	R\$ 65,85
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	7,26000000	R\$ 1,54	R\$ 9,30
1347	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADERITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM	SINAPI	M2	3,30000000	R\$ 70,85	R\$ 233,81
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	112,20000000	R\$ 0,32	R\$ 90,64
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	1,80000000	R\$ 7,74	R\$ 13,93
3731	LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 30 CM, E = 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL	SINAPI	M2	4,35000000	R\$ 75,60	R\$ 326,25
3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	2,10000000	R\$ 2,14	R\$ 4,49
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,16000000	R\$ 108,90	R\$ 17,43
4729	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,38000000	R\$ 125,00	R\$ 47,50
40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	SINAPI	KG	0,45000000	R\$ 18,76	R\$ 7,54
4415	SABIAO NAO APARELHADO 10,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PERoba-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 4,72	R\$ 10,62
11.13.000.0695-5	Fios elétricos tipo Snow-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm; ref. ESAB, LINCOLN, WELD ou equivalente	SP Obras	KG	2,89000000	R\$ 52,57	R\$ 53,18
43548	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	SINAPI	L	1,10000000	R\$ 25,91	R\$ 28,50
43548	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	SINAPI	L	0,80000000	R\$ 25,91	R\$ 22,00
21014	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 66 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,20" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	11,00000000	R\$ 95,14	R\$ 1.046,56
21015	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, * 7,32" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	10,50000000	R\$ 109,30	R\$ 1.147,65
					TOTAL Material	R\$ 3.414,88

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34000000	R\$ 23,06	R\$ 53,90
88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 22,88	R\$ 80,43
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 24,76	R\$ 86,66
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34000000	R\$ 27,74	R\$ 94,91
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,50000000	R\$ 27,76	R\$ 152,68
88260	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 27,54	R\$ 96,39
88309	PEDEIREHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,81000000	R\$ 27,80	R\$ 50,29
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,20000000	R\$ 21,04	R\$ 274,28

Samille Paiva Oliveira
PORTARIA 157/2025
CREA CE 379384

Samille Paiva Oliveira
CREA CE 379384
10/05/2025

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 790

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

SEM EFEITO
RUBRICA

Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
122567	MAQUINA SOLD A ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUO BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO: AF_05/2023	H	0,84000000	R\$ 0,65	R\$ 0,55
TOTAL Serviço:					R\$ 0,55
VALOR:					R\$ 4.277,81

FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11725	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. E= "2,5" CM	M2	1,00000000	R\$ 573,58	R\$ 573,58
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,38440000	R\$ 47,85	R\$ 18,41
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,01540000	R\$ 138,51	R\$ 2,13
TOTAL Material:					R\$ 594,12
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32000000	R\$ 27,32	R\$ 32,48
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	R\$ 21,94	R\$ 43,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 76,36
VALOR:					R\$ 670,48

FNDE 46 BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11725	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. E= "2,5" CM	M2	1,00000000	R\$ 573,58	R\$ 573,58
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,38440000	R\$ 47,85	R\$ 18,41
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,01540000	R\$ 138,51	R\$ 2,13
TOTAL Material:					R\$ 594,12
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32000000	R\$ 27,32	R\$ 32,48
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	R\$ 21,94	R\$ 43,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 76,36
VALOR:					R\$ 670,48

FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11725	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. E= "2,5" CM	M2	1,00000000	R\$ 573,58	R\$ 573,58
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,01540000	R\$ 138,51	R\$ 2,13
TOTAL Material:					R\$ 575,71
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000000	R\$ 27,32	R\$ 13,66
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75000000	R\$ 21,94	R\$ 16,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 30,12
VALOR:					R\$ 605,83

FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO (M2)					
---	--	--	--	--	--

Sandra
SANDILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157-2025
CREA CE 379384

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SEM FOLTO

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1340 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,05 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 87,78	R\$ 87,78
34860 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE 2,75 X 1,05 M	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 49,38	R\$ 49,38
1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	SINAPI	KG	0,56000000	R\$ 76,13	R\$ 42,63
TOTAL Material					R\$ 179,79
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86001 CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,08600000	R\$ 26,67	R\$ 55,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 55,90
VALOR:					R\$ 235,69

FNDE 351 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:5 COM ADITIVO - CHUVEIRO. (M)

Equipamento Custo Horário					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81683 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,38800000	R\$ 31,87	R\$ 12,38
81682 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,02100000	R\$ 33,25	R\$ 0,70
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 13,08
Material					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
34747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 15" CM, E= 2,8" CM, COM FREGADEIRA	SINAPI	M	1,04000000	R\$ 75,57	R\$ 78,59
TOTAL Material					R\$ 78,59
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86274 MARACOTEIRO/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41000000	R\$ 27,32	R\$ 11,43
86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20500000	R\$ 21,94	R\$ 4,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 15,93
Serviço					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87285 ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMEA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇAMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2019	SINAPI	M3	0,00600000	R\$ 489,00	R\$ 2,93
TOTAL Serviço					R\$ 2,93
VALOR:					R\$ 118,54

FNDE 49 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM, EM AÇO INOX (M)

Material					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
36205 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO TOTAL DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	0,70000000	R\$ 273,47	R\$ 191,43
7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 8,10 X 85 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,18200000	R\$ 0,92	R\$ 2,01
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - ES615, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,03400000	R\$ 37,08	R\$ 0,13
5164 REBITE DE REPLUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,03200000	R\$ 67,67	R\$ 0,14
TOTAL Material					R\$ 193,68
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86291 ALOJAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95000000	R\$ 23,06	R\$ 21,91
86313 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15600000	R\$ 27,68	R\$ 32,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 53,91

Sandra
GUILHERME OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

VALOR: R\$ 588,73

FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,00000000	R\$ 0,72	R\$ 12,96
TOTAL Material:					R\$ 12,96
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,90	R\$ 27,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 21,94	R\$ 43,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 71,78
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87803 CHARRISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 7,37	R\$ 8,84
84971 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,5:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	8,18300000	R\$ 502,58	R\$ 95,48
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	15,20000000	R\$ 10,25	R\$ 155,80
87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS/GEOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2022	SINAPI	M2	1,20000000	R\$ 40,67	R\$ 48,80
86542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,90000000	R\$ 152,68	R\$ 185,05
TOTAL Serviço:					R\$ 303,98
VALOR:					R\$ 588,73

FNDE 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI (CJ)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
379 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,07700000	R\$ 130,00	R\$ 10,01
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	25,50000000	R\$ 0,72	R\$ 18,32
25339 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 2550 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.147,59	R\$ 2.147,59
S.04.000.035/01 Tampo para suporte rede voleibol / trave de futebol	SP Obras	UN	2,00000000	R\$ 18,10	R\$ 36,20
TOTAL Material:					R\$ 2.215,12
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,60000000	R\$ 23,12	R\$ 83,23
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 27,90	R\$ 150,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 183,67
VALOR:					R\$ 2.398,79

FNDE 326 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA (CJ)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
42058 AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	SINAPI	KG	120,00000000	R\$ 8,20	R\$ 984,00
43132 ARAME RECOZIDO 18 BWS, D = 1,65 MM (3,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,28 MM (3,01 KG/M)	SINAPI	KG	2,10000000	R\$ 15,73	R\$ 33,03

HAMILLE PAIVA OLIVEIRA
POSTARIA 157 2025
CREA CE 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 793
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO

11145	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, BRITA 6 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA); SEM O LANÇAMENTO (NBR 8852)	SINAPI	M3	0,500000	R\$ 573,00	R\$ 286,50
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,07200000	R\$ 198,82	R\$ 14,31
43568	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,47000000	R\$ 13,68	R\$ 6,43
4415	SARRAFO NAO APARELHADO 12,5 X 5 CM EM MACAHANDUBA/MASSAANDUBA ANGELIM, FERROVA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,32000000	R\$ 4,72	R\$ 20,39
43647	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE	SINAPI	L	0,85700000	R\$ 20,65	R\$ 23,01
TOTAL Material:					R\$ 1.886,17	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,20000000	R\$ 27,98	R\$ 73,54
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,91000000	R\$ 24,76	R\$ 47,29
88251	ALMOXARIFE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,40000000	R\$ 20,86	R\$ 216,83
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,30000039	R\$ 27,54	R\$ 88,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,11000000	R\$ 27,90	R\$ 254,17
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,91000000	R\$ 29,40	R\$ 56,15
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,40000000	R\$ 27,68	R\$ 287,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	35,07000000	R\$ 21,64	R\$ 758,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 1.815,91

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPOUNDO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4.033,21	R\$ 4.033,21
					TOTAL Serviço:	R\$ 4.033,21
					VALOR:	R\$ 7.734,89

FNDE 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO (CJ)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRIBUÍDO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,07700000	R\$ 130,00	R\$ 10,01
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-9-32	SINAPI	KG	23,50000000	R\$ 5,72	R\$ 16,30
20398	CONJUNTO PARA FUTSAL, COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3.537,53	R\$ 3.537,53
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,08700000	R\$ 104,92	R\$ 9,48
TOTAL Material:						R\$ 3.572,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,90000000	R\$ 23,12	R\$ 90,25
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,90000000	R\$ 27,90	R\$ 108,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 198,69
				VALOR:		R\$ 3.767,61

FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
626	MAANTA LIQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁSTICA)	SINAPI	KG	1.50000000	R\$ 20,48	R\$ 30,72
					TOTAL Material:	R\$ 30,72

SAMUEL PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05600000	R\$ 20,11	R\$ 1,13
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42900000	R\$ 27,99	R\$ 11,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,03
VALOR:						R\$ 44,89

FNDE 176 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - EXTERNO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06510000	R\$ 27,50	R\$ 1,80
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 21,94	R\$ 0,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,36
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 548,56	R\$ 2,03
TOTAL Serviço:						R\$ 2,03
VALOR:						R\$ 4,43

FNDE 177 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - INTERNO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06510000	R\$ 27,50	R\$ 1,80
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 21,94	R\$ 0,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,36
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 548,56	R\$ 2,03
TOTAL Serviço:						R\$ 2,03
VALOR:						R\$ 4,43

FNDE 178 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15610000	R\$ 15,04	R\$ 2,35
TOTAL Material:						R\$ 2,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40300000	R\$ 27,50	R\$ 11,17
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40300000	R\$ 21,94	R\$ 8,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,04
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87262	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02190000	R\$ 617,94	R\$ 13,53
TOTAL Serviço:						R\$ 13,53
VALOR:						R\$ 40,89

FNDE 179 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

SAMUEL PAIVA OLIVEIRA
FORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 15,04	
TOTAL Material						R\$ 9,34
Mão de Obra com Encargos Complementares						
58309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40500000	R\$ 27,90	R\$ 11,21
58310	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40500000	R\$ 21,94	R\$ 8,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 20,18
Serviço						
67292	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF, 08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 611,94	R\$ 17,93
TOTAL Serviço						R\$ 17,93
VALOR:						R\$ 46,99

FNDE 196 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO (M2)						
Material						
7356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,77850000	R\$ 32,63	R\$ 7,46
TOTAL Material						R\$ 7,46
Mão de Obra com Encargos Complementares						
98310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R\$ 29,40	R\$ 4,80
98315	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 21,94	R\$ 1,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 5,99
VALOR:						R\$ 13,44

FNDE 352 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO - FACE EXTERNA MURO (M2)						
Material						
7356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 32,63	R\$ 7,46
TOTAL Material						R\$ 7,46
Mão de Obra com Encargos Complementares						
98310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R\$ 29,40	R\$ 4,80
98315	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 21,94	R\$ 1,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 5,99
VALOR:						R\$ 13,44

Samuel
SANTOS OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CNEC-CE 970384

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS PRÓPRIAS

GUARACIABA
DO NORTE

SECRETARIA DE PARÁMETROS, TAREFAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 796
RUBRICACOMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

Composição COMP01

4.17 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

C	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	R\$ 437,79	0,0019	M3	R\$ 0,83
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 30,19	0,0580	H	R\$ 1,75
C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 26,04	0,0860	H	R\$ 2,24
C	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	R\$ 171,43	0,2140	M2	R\$ 36,69
C	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	R\$ 8,65	0,7900	KG	R\$ 6,83
C	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	R\$ 356,78	0,0240	M3	R\$ 8,56
I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	R\$ 6,54	0,0070	L	R\$ 0,05
I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	R\$ 0,20	6,0000	UN	R\$ 1,18
CUSTO TOTAL						R\$ 58,13

Composição COMP02

4.18 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

C	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	R\$ 437,79	0,0019	M3	R\$ 0,83
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 30,19	0,0680	H	R\$ 2,05
C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 26,04	0,0940	H	R\$ 2,45
C	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	R\$ 171,43	0,2170	M2	R\$ 37,20
C	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	R\$ 8,65	0,7900	KG	R\$ 6,83
C	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	R\$ 356,78	0,0240	M3	R\$ 8,56
I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	R\$ 6,54	0,0070	L	R\$ 0,05
I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	R\$ 0,20	5,3500	UN	R\$ 1,06
CUSTO TOTAL						R\$ 59,03

Composição COMP03

4.19 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

RANILCE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

C	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	R\$ 437,79	0,0019	M3	R\$	
							RUBRICA
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 30,19	0,0840	H	R\$	2,54
C	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 26,04	0,1020	H	R\$	2,66
C	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	R\$ 171,43	0,1700	M2	R\$	29,14
C	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	R\$ 8,69	0,4900	KG	R\$	4,26
C	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	R\$ 356,78	0,0180	M3	R\$	6,42
I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	R\$ 6,54	0,0060	L	R\$	0,04
I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4.2 A 12.5" MM, COBRIMENTO 20 MM	R\$ 0,20	2,6500	UN	R\$	0,52
							CUSTO TOTAL R\$ 46,41

Composição COMP04

4.29 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

C	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	R\$ 437,79	0,0019	M3	R\$	0,83
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 30,19	0,0680	H	R\$	2,05
C	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 26,04	0,0940	H	R\$	2,45
C	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	R\$ 171,43	0,2130	M2	R\$	36,52
C	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	R\$ 8,69	0,4900	KG	R\$	4,26
C	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	R\$ 356,78	0,0240	M3	R\$	8,56
I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	R\$ 6,54	0,0070	L	R\$	0,05
I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4.2 A 12.5" MM, COBRIMENTO 20 MM	R\$ 0,20	3,0500	UN	R\$	0,60
							CUSTO TOTAL R\$ 55,32

Composição COMP05

5.5 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

C	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	R\$ 437,79	0,0024	M3	R\$	1,03
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 30,19	0,1500	H	R\$	4,53
C	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 26,04	0,0300	H	R\$	0,78
							CUSTO TOTAL R\$ 6,34

Composição COMP06

17.31 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 23,87	0,2600	H	R\$ 6,21
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 28,71	0,2600	H	R\$ 7,47
I	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, "75" G	R\$ 21,75	0,0090	UN	R\$ 0,20
I	44257	ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 35 MM, CAIXA D'ÁGUA PARA ÁGUA QUENTE	R\$ 41,00	1,0000	UN	R\$ 41,00
CUSTO TOTAL						R\$ 54,87

Composição COMP07

18.42 - CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLÁSTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES, 150 X 150 X "109" MM

C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 31,00	0,3460	H	R\$ 10,72
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 41,58	0,3460	H	R\$ 14,39
I	20254	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X "10" CM	R\$ 18,99	1,0000	UN	R\$ 18,99
CUSTO TOTAL						R\$ 44,10

Composição COMP08

18.93 - LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

C	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	R\$ 21,26	1,5000	H	R\$ 31,89
C	12312	ELETRICISTA	R\$ 27,05	1,5000	H	R\$ 40,57
C	11373	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (4 X 32) W	R\$ 170,13	1,0000	UM	R\$ 170,13
CUSTO TOTAL						R\$ 242,59

Composição COMP09

18.95 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 31,00	0,1480	H	R\$ 4,59
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 41,58	0,3551	H	R\$ 14,77
I	39510	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LÂMPADAS)	R\$ 247,56	1,0000	UN	R\$ 247,56
CUSTO TOTAL						R\$ 266,91

Composição COMP10

18.99 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 31,00	0,1735	H	R\$ 5,38
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 41,58	0,4165	H	R\$ 17,32
I	3749	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 250 W (BASE E40)	R\$ 38,68	1,0000	UN	R\$ 38,68
I	13390	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO/SÓDIO, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI, PARA LÂMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO	R\$ 126,99	1,0000	UN	R\$ 126,99
I	39374	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W, ALTO FATOR DE POTÊNCIA	R\$ 137,30	1,0000	UN	R\$ 137,30

CUSTO TOTAL R\$ 325,66

Composição COMP11						
24.27 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF. 03/2018						
C	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019	R\$ 437,79	0,0030	M3	R\$ 1,31
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 30,19	0,1454	H	R\$ 4,39
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 26,04	0,0250	H	R\$ 0,65
						CUSTO TOTAL R\$ 6,35



Documento assinado digitalmente
SAMILLE PAVIA OLIVEIRA
Data: 25/04/2025 17:22:34-0300
Verifique em <https://validar.dig.gov.br>

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 349
RUBRICA



00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	55.007,02	R\$ 1,80	R\$ 27.756,64	1,30	42,48	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	47,70	R\$ 503,88	R\$ 28.098,45	1,31	44,71	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	22,875,60	R\$ 1,70	R\$ 34.984,86	1,23	42,01	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	1,388,89	R\$ 18,84	R\$ 23.388,96	1,14	40,08	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	1,288,12	R\$ 18,78	R\$ 22.799,88	1,11	40,14	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	773,54	R\$ 29,90	R\$ 21.334,92	1,04	41,29	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	27,90	R\$ 80,73	R\$ 21.334,92	1,03	52,27	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	837,83	R\$ 28,22	R\$ 20.273,71	0,99	52,26	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	2,814,82	R\$ 7,46	R\$ 19.067,27	0,85	54,21	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	332,42	R\$ 82,50	R\$ 18.448,47	0,89	56,17	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	509,31	R\$ 33,82	R\$ 18.273,03	0,88	56,11	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	388,48	R\$ 49,31	R\$ 18.057,94	0,89	61,54	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	1,000,85	R\$ 18,28	R\$ 18.289,51	0,80	61,84	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	72,880,46	R\$ 1,43	R\$ 17.947,02	0,88	64,82	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	123,43	R\$ 130,20	R\$ 17.285,02	0,89	69,87	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	327,50	R\$ 52,58	R\$ 17.222,45	0,84	69,51	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	4,025,30	R\$ 4,15	R\$ 17.120,00	0,84	61,26	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	971,16	R\$ 16,74	R\$ 16.098,19	0,80	62,15	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	178,07	R\$ 174,02	R\$ 15.775,89	0,74	62,88	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	1,203,16	R\$ 11,88	R\$ 14.833,18	0,73	63,58	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	4,028,96	R\$ 2,23	R\$ 13.462,47	0,68	64,25	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	1,008,12	R\$ 8,73	R\$ 13.454,28	0,64	64,91	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	282,36	R\$ 43,42	R\$ 13.343,21	0,89	69,37	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	1,029,86	R\$ 12,86	R\$ 13.182,56	0,84	66,21	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	323,16	R\$ 43,97	R\$ 13.134,83	0,84	66,85	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	168,16	R\$ 79,32	R\$ 12.783,24	0,83	67,48	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	967,14	R\$ 12,86	R\$ 12.443,09	0,81	68,09	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	969,32	R\$ 12,86	R\$ 12.227,82	0,80	64,89	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	289,46	R\$ 38,35	R\$ 11.329,33	0,78	68,24	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	8,007,36	R\$ 1,12	R\$ 11.089,23	0,54	64,79	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	1,074,86	R\$ 8,48	R\$ 10.827,87	0,83	70,31	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	618,45	R\$ 16,78	R\$ 10.713,14	0,52	70,86	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	669,42	R\$ 15,24	R\$ 10.643,90	0,51	71,35	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	137,38	R\$ 15,47	R\$ 10.519,20	0,51	71,86	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	602,58	R\$ 15,41	R\$ 10.183,79	0,50	72,26	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	911,79	R\$ 19,72	R\$ 10.062,54	0,49	72,89	A
00000000	ALCOA - FUNDADO / TUBO DE VÁZIO PARA ALIMENTAR DE USUÁRIOS FLUTUANTE NA VERTICAL DE 14 X 19 CM (L X A X C)	SHAFT	Material	LNH	88,84	R\$ 181,73	R\$ 10.029,09	0,49	73,34	A

[illegible]

SA001	Material	LN	45.50	RS 101.00	RS 4.688.80	0.20	88.87	C	
SA002	Weld on Pipe	M	888.17	RS 12.10	RS 4.607.80	0.20	88.00	C	
SA003	Material	LN	104.00	RS 22.80	RS 4.488.72	0.20	88.31	C	
SA004	Material	M	48.88	RS 00.00	RS 4.471.20	0.20	88.73	C	
SA005	Material	M	41.88	RS 00.80	RS 4.307.91	0.20	88.79	C	
SA006	Material	LN	12.00	RS 707.64	RS 3.804.48	0.19	88.82	C	
SA007	Material	LN	88.82	RS 60.10	RS 3.803.79	0.19	87.11	C	
SA008	Material	M	68.82	RS 07.20	RS 3.807.80	0.19	87.30	C	
SA009	Weld on Pipe	M	803.00	RS 13.60	RS 3.887.74	0.18	87.49	C	
SA010	Material	L	141.73	RS 21.87	RS 3.884.30	0.19	87.88	C	
SA011	Fireproof Construction	M	1.885.20	RS 1.87	RS 3.871.54	0.19	87.87	C	
SA012	Material	M	285.84	RS 14.42	RS 3.834.86	0.18	88.88	C	
SA013	Material	KD	8.250.00	RS 0.40	RS 3.712.77	0.18	88.24	C	
SA014	Equipment	LN	0.008100677301739	RS 418.873.04	RS 3.403.18	0.17	88.47	C	
SA015	Fireproof Construction	M	1.885.20	RS 1.72	RS 3.598.86	0.17	88.87	C	
SA016	Material	LN	4.00	RS 308.00	RS 3.187.20	0.16	88.74	C	
SA017	Weld on Pipe	M	20.55	RS 108.87	RS 3.139.24	0.16	88.80	C	
SA018	Material	LN	1.00	RS 2.202.48	RS 3.075.86	0.16	88.86	C	
SA019	Material	LN	39.30	RS 84.00	RS 3.079.80	0.16	88.82	C	
SA020	Material	LN	28.80	RS 88.00	RS 2.945.80	0.16	88.38	C	
SA021	Material	LN	42.80	RS 78.00	RS 3.028.80	0.16	88.54	C	
SA022	Equipment	LN	0.008354624	RS 800.000.00	RS 3.163.87	0.15	88.73	C	
SA023	Material	LN	12.48	RS 290.00	RS 3.125.00	0.15	88.85	C	
SA024	Material	LN	1.203.80	RS 2.04	RS 3.080.76	0.17	88.00	C	
SA025	Material	M	817.20	RS 8.80	RS 3.078.87	0.16	88.16	C	
SA026	Weld on Pipe	M	163.80	RS 18.24	RS 3.067.72	0.16	88.38	C	
SA027	Material	M	48.78	RS 44.00	RS 3.073.87	0.15	88.44	C	
SA028	Weld on Pipe	M	138.80	RS 21.00	RS 3.062.80	0.16	88.58	C	
SA029	Material	LN	321.84	RS 5.50	RS 2.944.87	0.14	88.72	C	
SA030	Material	LN	45.80	RS 61.00	RS 2.780.20	0.14	88.88	C	
SA031	Material	LN	18.80	RS 148.80	RS 2.697.64	0.13	88.88	C	
SA032	Material	LN	1.885.20	RS 1.38	RS 2.688.10	0.13	87.12	C	
SA033	Fireproof Construction	M	4.248.84	RS 8.87	RS 2.603.33	0.13	87.25	C	
SA034	Material	M	288.88	RS 8.14	RS 2.673.86	0.13	87.38	C	
SA035	Material	M		RS 24.44	RS 2.688.70	0.12	87.50	C	

[illegible]

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 813
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 813
RUBRICA

UNIDADE	ESPECIALIDADES - FÁBULA ENGENHEIRO CIVIL - MONTELAZEM CARLOS EMMERSON S. COELHO CARVAL	SAFARI	Material	UN	1,00	R\$ 1,50	R\$ 1,50	0,00	100,00	C
UNIDADE	SEÇÃO DE AÇO POLODO COM CARGA 17 X 28 (2 1/4 X 11)	SAFARI	Material	R\$	6.100,00	R\$ 13,50	R\$ 1,37	0,00	100,00	C
UNIDADE	SEÇÃO DE AÇO 1/2 X 2 1/4 COM CARGA 17 X 28	SAFARI	Material	UN	1,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33	0,00	100,00	C
UNIDADE	SEÇÃO DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLA, PRO AL, FAIXA DE FIBRA 1/2 X 1,0, COMPRIMENTO DE 1,97 M E	SAFARI	Material	R\$	0,00	R\$ 9,10	R\$ 0,90	0,00	100,00	C
UNIDADE	SEÇÃO DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLA, PRO AL, FAIXA DE FIBRA 1/2 X 1,0, COMPRIMENTO DE 1,97 M E	SAFARI	Material	UN	1,00	R\$ 8,19	R\$ 0,80	0,00	100,00	C
UNIDADE	SEÇÃO DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLA, PRO AL, FAIXA DE FIBRA 1/2 X 1,0, COMPRIMENTO DE 1,97 M E	SAFARI	Material	R\$	0,00	R\$ 10,00	R\$ 0,97	0,00	100,00	C
UNIDADE	SEÇÃO DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLA, PRO AL, FAIXA DE FIBRA 1/2 X 1,0, COMPRIMENTO DE 1,97 M E	SAFARI	Material	R\$	0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26	0,00	100,00	C

STAVILLE FAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 379384

13/09/2024
Prefeitura Municipal de Itapiúna - Convênio nº 939734
Construção de Creche Pré-Escola, no município de Guaraciaba do Norte/CE – FNDE - Creche Tipo 1

ESCOLA	Construção de Edifícios
--------	-------------------------

1 Declarações de responsabilidade do ORÇAMENTISTA

1.1 Fórmula de cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{1 - I} - 1$$

A fórmula do BDI e os valores de referência de suas parcelas constam no Acórdão 2.622/2013 – Plenário.

BDI SEM DESONERAÇÃO	24,99%
<i>Este percentual está na faixa de Referência do BDI.</i>	

O Orçamento é Desonerado?	NÃO
O BDI ADOPTADO é:	25,00%

PARCELAS DO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
AC	Administração central	5,50%
S + G	Seguro e garantia	0,80%
R	Risco	1,27%
DF	Despesas financeiras	1,23%
L	Lucro	8,30%
I	Impostos	5,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%

O Memorando-Circular 1651/2018/DIREX/SEDE do DNIT trata do cálculo das despesas financeiras com base na taxa SELIC. Ele foi aplicado?

NÃO

1.2 Declaração referente ao SINAPI

Os valores dos serviços com itens que possuem a legenda "AS" (ou seja, que possuem custos referentes a São Paulo) são adequados ao empreendimento em questão.

1.3 Os serviços orçados são suficientes para a execução do objeto.



Documento assinado digitalmente:
 SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
 Data: 29/04/2025 17:21:59-0300
 Verifique em: https://validar.it.gov.br

Responsável Técnico pelo Orçamento

SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
 CREA 379384

2 Declarações de responsabilidade do TOMADOR

2.1 Declaração informativa referente ao ISS

- A alíquota de ISS prevista no Código Tributário Municipal, para o tipo de intervenção em tela é de:
- A base de cálculo sobre a qual incide a referida alíquota equivale ao seguinte percentual do valor da obra, em virtude da exclusão dos valores referentes aos materiais não produzidos em canteiro:
- A alíquota efetiva de ISS a ser utilizada no BDI é:

5,00%

40,00%

2,00%

2.2 Declaração referente ao Tipo de Orçamento

O Orçamento NÃO Desonerado é mais adequada para a Administração Pública que o Desonerado.

2.3 Declaração referente ao Regime de Execução

O regime de execução da obra em tela será:

EPU - EMPREITADA PREÇO UNITÁRIO

2.4 Declaração referente à Data Base do Orçamento

A data base do orçamento é

jun/24

2.5 Ratificamos o BDI adotado: 25%. Este percentual está na faixa de Referência do BDI.

**JOSE CEFAS
PONTES
MELO:6234143032**

5

**José Cefas Pontes Melo
Prefeito Municipal**

Assinado digitalmente por JOSE CEFAS PONTES
MELO:6234143032
MD: C=BR, CN=CPF, OU=AC SOLUTIS
Múltipla ID: CN=2996258183/118, OU=Vínculo/Arquivo, OU=Cartão de P. A. 1, CN=JOSE CEFAS PONTES MELO:6234143032
Preenche-se com o texto do documento
Local: São Paulo
Data: 2023.04.26 14:22:30-0210P
Trust: PDF Reader Versão: 1024 3.0

Obra: Creche Tipo 2 - opção 220V

Unidade federativa: CEARÁ

Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

Local: Distrito de Amanaira, Reriutaba/Ce

TABELAS:

SEINFRA SEM DESONERAÇÃO - 28
SINAPI SEM DESONERAÇÃO - JUN/2024
SP OBRAS SEM DESONERAÇÃO - 194

HORA	MÊS
114,15%	71,31%
114,15%	71,31%
128,23%	-

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	18,29	7,38

A + B + C + D = 114,15 71,31

Samir
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

Samir
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

COD	DESCRIÇÃO	RUBRICA	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A			
A1	INSS		20,00	20,00
A2	SESI		1,50	1,50
A3	SENAI		1,00	1,00
A4	INCRA		0,20	0,20
A5	SEBRAE		0,60	0,60
A6	Salário Educação		2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00	3,00
A8	FGTS		8,00	8,00
A9	SECONCI		0,00	0,00
	TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,85	0,00
B2	Feriados		3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade		0,87	0,66
B4	13º Salário		11,03	8,33
B5	Licença Paternidade		0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas		0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas		1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,11	0,08
B9	Férias Gozadas		12,35	9,33
B10	Salário Maternidade		0,04	0,03
	TOTAL		48,36	19,04

C	GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado		5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas		1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		2,87	2,17
C5	Indenização Adicional		0,46	0,35
	TOTAL		10,70	8,09

D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,49	0,37
	TOTAL		18,29	7,38

A + B + C + D = 114,15 71,31

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	Previdência Social	20,00	0,00
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00	0,00
A3	Salário-Educação	2,50	0,00
A4	Serviços Social da Indústria (Sesi)	1,50	0,00
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00	0,00
A6	Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60	0,00
A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20	0,00
A8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00	0,00
A9	Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)	1,00	0,00
	TOTAL	37,80	0,00

SAMUEL PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
CNPJ 08.000.000/0001-91
CNPJ 08.000.000/0001-91

B GRUPO B			
B1	Auxílio enfermidade	0,79	0,00
B2	Repouso semanal e feriados	22,90	0,00
B3	Licença-paternidade	0,34	0,00
B4	13º Salário	10,57	0,00
B5	Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços	4,57	0,00
TOTAL		39,17	0,00

C GRUPO C			
C1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	4,45	0,00
C2	Férias (indenizadas)	14,06	0,00
C3	Aviso-prévio (indenizado)	13,12	0,00
TOTAL		31,63	0,00

D GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	14,80	0,00
D2	Reincidência de (A - A9) sobre C3	4,83	0,00
TOTAL		19,63	0,00

A + B + C + D = 128,23 0,00

**CAU/BR**Conselho de Arquitetos
e Urbanistas do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 000000833415
INICIAL
EQUIPE - RRT PRINCIPALCOMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO

RUBRICA

**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: VIVIAN MAURER BORTOLOTTI

Registro Nacional: A47733-8

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 219

RUBRICA

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação

CNPJ: 00.378.257/0001-81

Contrato: 005/2016

Valor Contrato/Honorários: R\$ 1,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Celebrado em: 23/02/2016

Data de Início: 26/03/2016

Previsão de término: 20/06/2019

Situação: BAIXA

Data Situação: 07/06/2019

Data de término da atividade: 07/06/2019

Motivo: AS ATIVIDADES CONTIDAS NESTE RRT FORAM CONCLUÍDAS

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: QUADRA 2

Nº: 2

Complemento: Bloco F Ed. FNDE

Bairro: ASA SUL

UF: DF CEP: 70070-120 Cidade: BRASÍLIA

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 1.514,30

Unidade: m²

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRIÇÃO

Revisão (R02) Projeto Arquitetônico Creche Proinfância Tipo 1 Modelo Padrão FNDE

6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 94,76

Pago em: 04/06/2019

Total Pago: R\$ 94,76

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

BRASILIA, 07 de JUNHO de 2019

Local

Dia

Mês

Ano

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - Ministério da Educação
CNPJ: 00.378.257/0001-81VIVIAN MAURER BORTOLOTTI
CPF: 969.230.400-00



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou Serviço
072018002

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Compensar à 100% (100%)

1. Responsável Técnico

KAREN CRISTINA ALCANTARA KLEIN

Título profissional: Engenheira Eletricista, Engenheira Civil

RNM: 0709001762

Registro: 18296/D-DF

2. Dados do Contrato

Contratante: **FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC**

CNPJ: 00.378.257/0001-81

SBS Quadra 2 Bloco F Número: 2

Bairro: Asa Sul

CEP: 70070-929

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento:

E-Mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br

Fone: (61) 20224338

Contrato:

Celebrado em: 26/03/2018

Valor Obra/Serviço: R\$ 500,00

Modalidade ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Nenhuma Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SBS Quadra 2 Bloco F Número: 2

Bairro: Asa Sul

CEP: 70070-929

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento:

Data de Início: 26/03/2018

Previsão Término: 16/12/2018

Coordenadas Geográficas:

Condição pública:

Finalidade: **Escolar**

Procedente: **FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC**

CNPJ: 00.378.257/0001-81

E-Mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br

Fone: (61) 20224338

4. Atividade Técnica

Realização

Projeto Básico Estrutura Apo
Projeto Básico Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
Projeto Básico Rede de gás
Projeto Básico Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio
Projeto Básico Instalação sanitária
Projeto Básico Instalação elétrica
Projeto Básico Instalação hidráulica
Projeto Básico Instalação elétrica de baixa tensão
Projeto Básico Fachada - Canteiro Amado
Projeto Básico Rede Logica

Quantidade

1.514,3000 metros quadrados
1.514,3000 metros quadrados
1.514,3000 metros quadrados
1.514,3000 metros quadrados
1.514,3000 metros quadrados
1.514,3000 metros quadrados
1.514,3000 metros quadrados
1.514,3000 metros quadrados
1.514,3000 metros quadrados
1.514,3000 metros quadrados
1.514,3000 metros quadrados

Unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Revisão (R02) dos projetos complementares para Creche-Prontinha Tipo 1 - Modelo Padrão FNDE

6. Declarações

Quaisquer conflitos ou litígios oriundos da presente certidão, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do Impedimento regulamentar de arbitragem, ou, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acesso: 04/04/2018. S.M. Declaro assentimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Estado da Obra

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaram serem verdadeiras as informações acima:

Local: Brasília, 15 de Abril de 2018

KAREN CRISTINA ALCANTARA KLEIN - CPF: 006.915.251-30

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC -
CPF: CNPJ: 00.378.257/0001-81

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou consignação no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3981-3600 Fax: (61) 3723-1619

CREA DF

Registrada em: 04/04/2018, às 14h05m00s. Início: Nenhum/Baixa: 04/04/2018
Coordenador de Projetos
CCEST



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 821
RUBRICA
CREA-DF

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
ART Obra ou Serviço
0720150030267

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

CARLOS BRUNO PEDROSA

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 0712785680

Registro: 21106/D-DF

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

QUADRA SBS QUADRA 2 BL

FED. FNDE

Número: 0

Bairro: ASA SUL

CEP: 70070-120

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Complemento:

E-Mail: bruno@minasprojetos.eng.br

Fone: (61)82137647

Contrato:

Celebrado em: 01/01/2015

Valor Obra/Serviço R\$: 1.000,00

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa física

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

QUADRA SBS QUADRA 2 BL

Número: 0

Bairro: ASA SUL

CEP: 70070-120

FED. FNDE

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Complemento:

Data de início: 01/01/2015

Previsão término: 21/12/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Escolar

Código Obra pública

Proprietário: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

E-Mail: bruno@minasprojetos.eng.br

Fone:

4. Atividade Técnica

Realização

Projeto Elétrica de baixa tensão

Quantidade

Unidade

Projeto Redes de Dados

1.510,2300

metros quadrados

Projeto Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio

1.510,2300

metros quadrados

Projeto Ligação de esgoto

1.510,2300

metros quadrados

Projeto Ligação de água

1.510,2300

metros quadrados

Projeto Instalação sanitária

1.510,2300

metros quadrados

Projeto Instalação pluvial

1.510,2300

metros quadrados

Projeto Instalação hidráulica

1.510,2300

metros quadrados

Projeto Hidrantes

1.510,2300

metros quadrados

Projeto Extintores

1.510,2300

metros quadrados

Projeto Instalação telefônica

1.510,2300

metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Sim. Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Carlos Bruno Pedrosa

Engenheiro Civil

CREA 01.19810-DF

CARLOS BRUNO PEDROSA - CPF: 075.523.010-8

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.confec.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br - informacao@creadf.org.br

Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619

CREA-DF

Registrada em: 05/05/2015

Valor Pago: R\$ 57,65

Nosso Número/Baixa: 0115023311



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou Serviço
0720180066229



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Complementar à 0720180066229

1. Responsável Técnico

KAREN CRISTINA VIEIRA DE ALCANTARA

Título profissional: Engenheira Eletricista, Engenheira Civil

RNP: 0709001762
Registro: 18296/D-DF

2. Dados do Contrato

Contratante: **FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC**

CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

SBS Quadra 2 Bloco F Número: 2

Barro: Asa Sul

CEP: 70070-929

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento:

E-Mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br

Fone: (61) 20224338

Contrato:

Celebrado em: 28/09/2018

Valor Obra-Serviço: R\$ 67.500,00

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SBS Quadra 2 Bloco F Número: 2

Barro: Asa Sul

CEP: 70070-929

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento:

Data de início: 28/09/2018

Previsão término: 26/12/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ecolar**

Código Obra pública

Proprietário: **FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC**

CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

E-Mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br

Fone: (61) 20224338

4. Atividade Técnica

Realização

Projeto Básico Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

Quantidade Unidade

1 510,2300 metros quadrados

Projeto Básico Rede de gás Em edificações

1 510,2300 metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração dos projetos complementares para Creche Proinfância Tipo 1 - Modelo Padrão FNDE

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Acessibilidade: Sim. Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de ABNT e na Lei de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

Data

KAREN CRISTINA VIEIRA DE ALCANTARA - CPF: 009.815.251-30

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC -
CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

9. Informações

- A ART é válida somente quando unida ao documento apresentação de comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4818

CREA-DF

Registrada em 28/09/2018

Nosso Número/Baixa: marcosjgm

Rudubert Barros Von Eye
Coordenador de Desenvolvimento e
Análise de Infraestrutura
CODAN/CGEST/DIGAP

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000003575246
INICIAL
EQUIPE - RRT PRINCIPALCOMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO

RUBRICA

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: VIVIAN MAURER BORTOLOTO

Registro Nacional: A47733-8

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 823
RUBRICA**2. DADOS DO CONTRATO**

Contratante: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação

CNPJ: 00.378.257/0001-81

Contrato: 54/2011

Valor: R\$ 1,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Celebrado em: 21/12/2011

Data de Início: 21/12/2011

Previsão de término: 22/12/2016

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

QUADRA SBS QUADRA 2

Nº: 2

Complemento: Bloco F Ed. FNDE

Bairro: ASA SUL

UF: DF CEP: 70070120 Cidade: BRASÍLIA

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 1.510,23

Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Projeto Arquitetônico Creche Proinfância Tipo 1 Modelo Padrão FNDE

6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 75,32

Pago em: 03/06/2015

Total Pago: R\$ 75,32

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Brasília 08 de junho de 2015
 Local Dia Mês Ano

Fábio Lúcio de Almeida Cardoso
 Coordenador Geral de
 Infraestrutura Educacional
 Fundo Nacional de Desenvolvimento da
 Educação - Ministério da Educação
 CNPJ: 00.378.257/0001-81

Vivian Maurer Bortolotto
 VIVIAN MAURER BORTOLOTO
 CPF: 969.230.400-00



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA - SERVIÇO
Nº CE20251584504
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM FEITO
INICIAR RUBRICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

1. Responsável Técnico

SAMILE PAIVA OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0622919350

Registro: 379384CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura de Guaraciaba do Norte - CE

AVENIDA Monsenhor Furtado

Complemento:

Cidade: GUARACIABA DO NORTE

Bairro: Centro

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.569.205/0001-31

Nº: 55

CEP: 62380000

ART Vinculada: CE20251584504

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 07/03/2025

Valor: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Alfredo Fernandes Alves Neto

Complemento: Cajueiro

Cidade: GUARACIABA DO NORTE

Data de início: 07/03/2025

Previsão de término: 31/12/2025

Coordenadas Geográficas: -4.158391, -40.743408

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: Prefeitura de Guaraciaba do Norte - CE

Nº: SN

CEP: 62380000

CPF/CNPJ: 07.569.205/0001-31

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS

Quantidade

Unidade

1.324,27

m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1,00

un

40 - Estudo > GEOTECNIA E GEOLÓGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO

1,00

un

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Referente ao projeto de fundação, projeto padrão, estudo de sondagem, orçamento e fiscalização de uma creche pré-escola tipo I (Operação 1095054-36 Tgov 962027).

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, de _____ de _____
Local Data



Documento assinado eletronicamente

com credencial de login e senha

SAMILE PAIVA OLIVEIRA

RNP: 0622919350

Data: 16/04/2025 09:55:01

SAMILE PAIVA OLIVEIRA - CPF: 073.135.733-75

João Carlos Pereira Melo

Assinado em 16/04/2025 por 4402

João Carlos Pereira Melo

Data: 2025-04-16 11:11:11 -0300

Prefeitura de Guaraciaba do Norte - CE - CPF: 07.569.205/0001-31

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em: 17/03/2025

Valor pago: R\$ 103,03

Nosso Número: 8217747642

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.artex.com.br/publicar/>, com a chave: ydc22
Impresso em: 16/04/2025 às 09:55:01 por: .ip: 191.7.212.101

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800


teleconexao@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
HUBRICA


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
Fl. No 826
RUBRICA

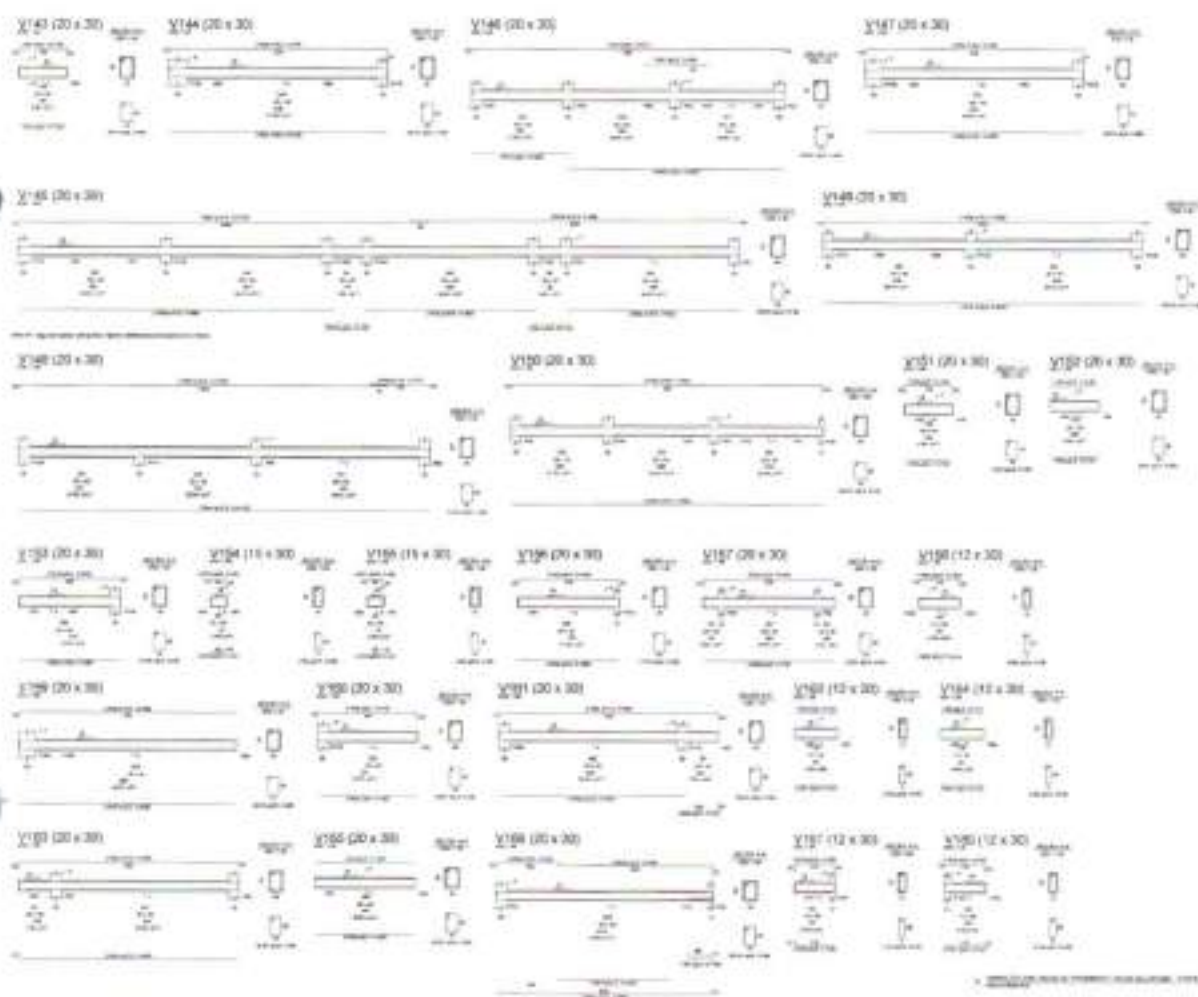

RAMBLE FAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

SAMILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

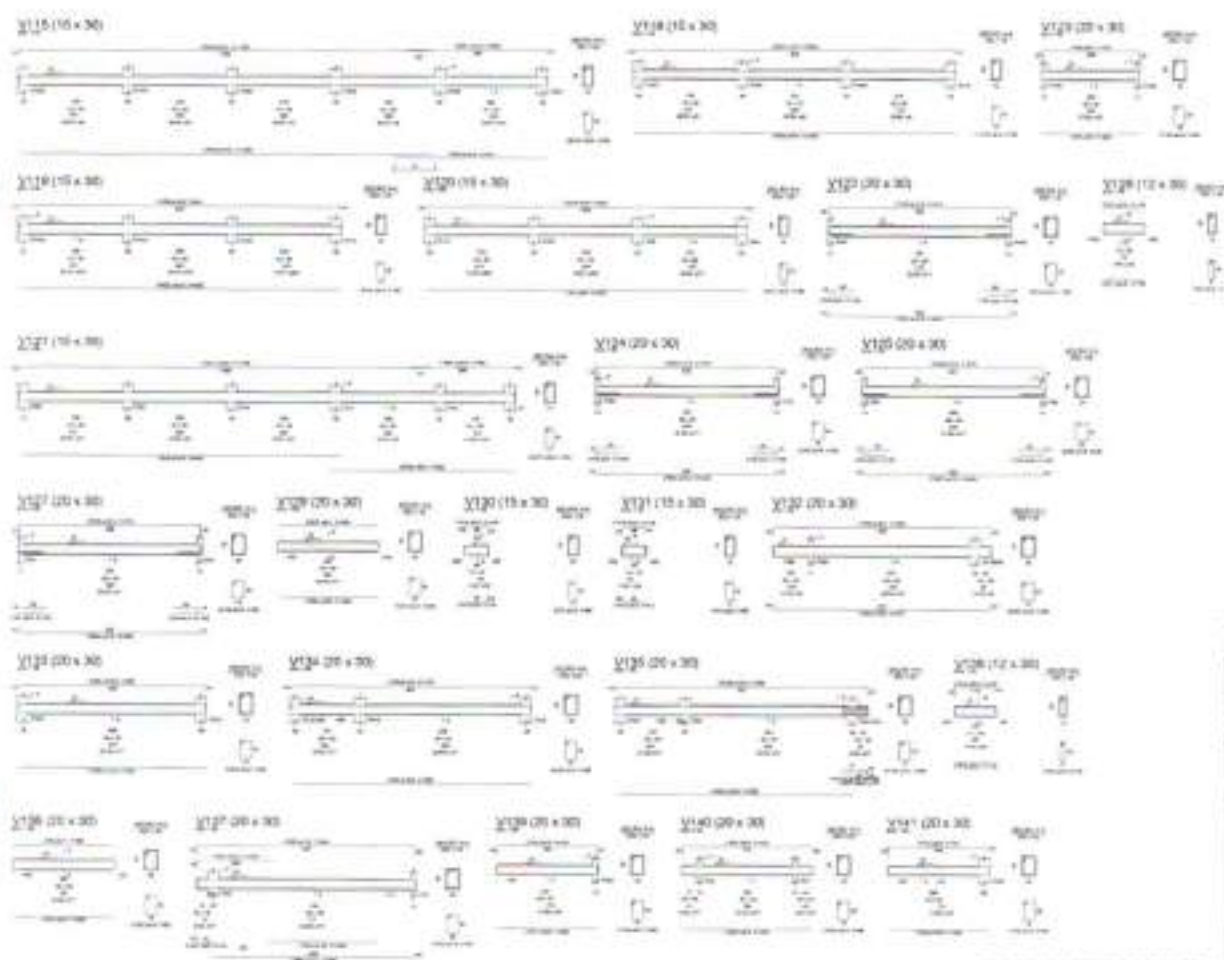

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525





SAMILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. Nº 3
SEM EFEITO
RUBRICA

Sample 03





FAMÍLIA PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384



1. **Nome e Cognome:** _____
 2. **Matrícula:** _____
 3. **Data de Nascimento:** ____/____/____
 4. **Endereço:** _____
 5. **Cidade:** _____
 6. **Estado:** _____
 7. **País:** _____
 8. **Telefone:** _____
 9. **E-mail:** _____
 10. **Assinatura:** _____
 11. **Assinatura do Responsável:** _____
 12. **Assinatura do Coordenador:** _____
 13. **Assinatura do Diretor:** _____
 14. **Assinatura do Presidente:** _____
 15. **Assinatura do Vice-Presidente:** _____
 16. **Assinatura do Tesoureiro:** _____
 17. **Assinatura do Secretário:** _____
 18. **Assinatura do Provedor:** _____
 19. **Assinatura do Conselho:** _____
 20. **Assinatura do Conselho de Administração:** _____
 21. **Assinatura do Conselho de Fiscalização:** _____
 22. **Assinatura do Conselho de Controle:** _____
 23. **Assinatura do Conselho de Defesa:** _____
 24. **Assinatura do Conselho de Educação:** _____
 25. **Assinatura do Conselho de Esportes:** _____
 26. **Assinatura do Conselho de Cultura:** _____
 27. **Assinatura do Conselho de Meio Ambiente:** _____
 28. **Assinatura do Conselho de Saúde:** _____
 29. **Assinatura do Conselho de Segurança:** _____
 30. **Assinatura do Conselho de Trabalho:** _____
 31. **Assinatura do Conselho de Comunidade:** _____
 32. **Assinatura do Conselho de Paz:** _____
 33. **Assinatura do Conselho de Justiça:** _____
 34. **Assinatura do Conselho de Economia:** _____
 35. **Assinatura do Conselho de Tecnologia:** _____
 36. **Assinatura do Conselho de Inovação:** _____
 37. **Assinatura do Conselho de Sustentabilidade:** _____
 38. **Assinatura do Conselho de Governança:** _____
 39. **Assinatura do Conselho de Ética:** _____
 40. **Assinatura do Conselho de Integridade:** _____
 41. **Assinatura do Conselho de Compliance:** _____
 42. **Assinatura do Conselho de Risco:** _____
 43. **Assinatura do Conselho de Qualidade:** _____
 44. **Assinatura do Conselho de Eficiência:** _____
 45. **Assinatura do Conselho de Produtividade:** _____
 46. **Assinatura do Conselho de Inovação:** _____
 47. **Assinatura do Conselho de Pesquisa:** _____
 48. **Assinatura do Conselho de Desenvolvimento:** _____
 49. **Assinatura do Conselho de Planejamento:** _____
 50. **Assinatura do Conselho de Gestão:** _____
 51. **Assinatura do Conselho de Operações:** _____
 52. **Assinatura do Conselho de Logística:** _____
 53. **Assinatura do Conselho de Marketing:** _____
 54. **Assinatura do Conselho de Vendas:** _____
 55. **Assinatura do Conselho de Atendimento:** _____
 56. **Assinatura do Conselho de Relacionamento:** _____
 57. **Assinatura do Conselho de Imagem:** _____
 58. **Assinatura do Conselho de Reputação:** _____
 59. **Assinatura do Conselho de Responsabilidade:** _____
 60. **Assinatura do Conselho de Cidadania:** _____
 61. **Assinatura do Conselho de Engajamento:** _____
 62. **Assinatura do Conselho de Participação:** _____
 63. **Assinatura do Conselho de Inclusão:** _____
 64. **Assinatura do Conselho de Diversidade:** _____
 65. **Assinatura do Conselho de Igualdade:** _____
 66. **Assinatura do Conselho de Justiça Social:** _____
 67. **Assinatura do Conselho de Direitos Humanos:** _____
 68. **Assinatura do Conselho de Liberdade:** _____
 69. **Assinatura do Conselho de Democracia:** _____
 70. **Assinatura do Conselho de Transparência:** _____
 71. **Assinatura do Conselho de Acesso:** _____
 72. **Assinatura do Conselho de Participação:** _____
 73. **Assinatura do Conselho de Inclusão:** _____
 74. **Assinatura do Conselho de Diversidade:** _____
 75. **Assinatura do Conselho de Igualdade:** _____
 76. **Assinatura do Conselho de Justiça Social:** _____
 77. **Assinatura do Conselho de Direitos Humanos:** _____
 78. **Assinatura do Conselho de Liberdade:** _____
 79. **Assinatura do Conselho de Democracia:** _____
 80. **Assinatura do Conselho de Transparência:** _____
 81. **Assinatura do Conselho de Acesso:** _____
 82. **Assinatura do Conselho de Participação:** _____
 83. **Assinatura do Conselho de Inclusão:** _____
 84. **Assinatura do Conselho de Diversidade:** _____
 85. **Assinatura do Conselho de Igualdade:** _____
 86. **Assinatura do Conselho de Justiça Social:** _____
 87. **Assinatura do Conselho de Direitos Humanos:** _____
 88. **Assinatura do Conselho de Liberdade:** _____
 89. **Assinatura do Conselho de Democracia:** _____
 90. **Assinatura do Conselho de Transparência:** _____
 91. **Assinatura do Conselho de Acesso:** _____
 92. **Assinatura do Conselho de Participação:** _____
 93. **Assinatura do Conselho de Inclusão:** _____
 94. **Assinatura do Conselho de Diversidade:** _____
 95. **Assinatura do Conselho de Igualdade:** _____
 96. **Assinatura do Conselho de Justiça Social:** _____
 97. **Assinatura do Conselho de Direitos Humanos:** _____
 98. **Assinatura do Conselho de Liberdade:** _____
 99. **Assinatura do Conselho de Democracia:** _____
 100. **Assinatura do Conselho de Transparência:** _____
 101. **Assinatura do Conselho de Acesso:** _____
 102. **Assinatura do Conselho de Participação:** _____
 103. **Assinatura do Conselho de Inclusão:** _____
 104. **Assinatura do Conselho de Diversidade:** _____
 105. **Assinatura do Conselho de Igualdade:** _____
 106. **Assinatura do Conselho de Justiça Social:** _____
 107. **Assinatura do Conselho de Direitos Humanos:** _____
 108. **Assinatura do Conselho de Liberdade:** _____
 109. **Assinatura do Conselho de Democracia:** _____
 110. **Assinatura do Conselho de Transparência:** _____
 111. **Assinatura do Conselho de Acesso:** _____
 112. **Assinatura do Conselho de Participação:** _____
 113. **Assinatura do Conselho de Inclusão:** _____
 114. **Assinatura do Conselho de Diversidade:** _____
 115. **Assinatura do Conselho de Igualdade:** _____
 116. **Assinatura do Conselho de Justiça Social:** _____
 117. **Assinatura do Conselho de Direitos Humanos:** _____
 118. **Assinatura do Conselho de Liberdade:** _____
 119. **Assinatura do Conselho de Democracia:** _____
 120. **Assinatura do Conselho de Transparência:** _____
 121. **Assinatura do Conselho de Acesso:** _____
 122. **Assinatura do Conselho de Participação:** _____
 123. **Assinatura do Conselho de Inclusão:** _____
 124. **Assinatura do Conselho de Diversidade:** _____
 125. **Assinatura do Conselho de Igualdade:** _____
 126. **Assinatura do Conselho de Justiça Social:** _____
 127. **Assinatura do Conselho de Direitos Humanos:** _____
 128. **Assinatura do Conselho de Liberdade:** _____
 129. **Assinatura do Conselho de Democracia:** _____
 130. **Assinatura do Conselho de Transparência:** _____
 131. **Assinatura do Conselho de Acesso:** _____
 132. **Assinatura do Conselho de Participação:** _____
 133. **Assinatura do Conselho de Inclusão:** _____
 134. **Assinatura do Conselho de Diversidade:** _____
 135. **Assinatura do Conselho de Igualdade:** _____
 136. **Assinatura do Conselho de Justiça Social:** _____
 137. **Assinatura do Conselho de Direitos Humanos:** _____
 138. **Assinatura do Conselho de Liberdade:** _____
 139. **Assinatura do Conselho de Democracia:** _____
 140. **Assinatura do Conselho de Transparência:** _____
 141. **Assinatura do Conselho de Acesso:** _____
 142. **Assinatura do Conselho de Participação:** _____
 143. **Assinatura do Conselho de Inclusão:** _____
 144. **Assinatura do Conselho de Diversidade:** _____
 145. **Assinatura do Conselho de Igualdade:** _____
 146. **Assinatura do Conselho de Justiça Social:** _____
 147. **Assinatura do Conselho de Direitos Humanos:** _____
 148. **Assinatura do Conselho de Liberdade:** _____
 149. **Assinatura do Conselho de Democracia:** _____
 150. **Assinatura do Conselho de Transparência:** _____
 151. **Assinatura do Conselho de Acesso:** _____
 152. **Assinatura do Conselho de Participação:** _____
 153. **Assinatura do Conselho de Inclusão:** _____
 154. **Assinatura do Conselho de Diversidade:** _____
 155. **Assinatura do Conselho de Igualdade:** _____
 156. **Assinatura do Conselho de Justiça Social:** _____
 157. **Assinatura do Conselho de Direitos Humanos:** _____
 158. **Assinatura do Conselho de Liberdade:** _____
 159. **Assinatura do Conselho de Democracia:** _____
 160. **Assinatura do Conselho de Transparência:** _____
 161. **Assinatura do Conselho de Acesso:** _____
 162. **Assinatura do Conselho de Participação:** _____
 163. **Assinatura do Conselho de Inclusão:** _____
 164. **Assinatura do Conselho de Diversidade:** _____
 165. **Assinatura do Conselho de Igualdade:** _____
 166. **Assinatura do Conselho de Justiça Social:** _____
 167. **Assinatura do Conselho de Direitos Humanos:** _____
 168. **Assinatura do Conselho de Liberdade:** _____
 169. **Assinatura do Conselho de Democracia:** _____
 170. **Assinatura do Conselho de Transparência:** _____
 171. **Assinatura do Conselho de Acesso:** _____

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. Nº 839
SEM EFEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. Nº 839
RUBRICA

P100 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P101 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P102 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P103 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P104 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA
P105 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P106 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P107 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P108 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P109 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA
P110 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P111 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P112 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P113 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P114 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA
P115 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P116 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P117 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P118 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P119 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA
P120 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P121 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P122 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P123 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P124 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA
P125 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P126 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P127 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P128 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P129 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA
P130 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P131 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P132 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P133 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P134 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA
P135 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P136 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P137 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P138 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P139 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA
P140 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P141 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P142 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P143 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P144 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA
P145 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P146 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P147 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P148 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P149 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA
P150 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P151 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P152 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P153 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA	P154 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO FL. Nº 839 RUBRICA

Relatório de Apoio

Item	Valor	Valor	Valor	Valor
1	100	100	100	100
2	100	100	100	100
3	100	100	100	100
4	100	100	100	100
5	100	100	100	100
6	100	100	100	100
7	100	100	100	100
8	100	100	100	100
9	100	100	100	100
10	100	100	100	100

Relatório de Apoio

Item	Valor	Valor	Valor	Valor
1	100	100	100	100
2	100	100	100	100
3	100	100	100	100
4	100	100	100	100
5	100	100	100	100
6	100	100	100	100
7	100	100	100	100
8	100	100	100	100
9	100	100	100	100
10	100	100	100	100

Formulário de Registro de Atividade

Nome: _____

CPF: _____

Data: _____


Assinatura: _____

Carimbo: _____

SAMUEL
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 334
RUBRICA

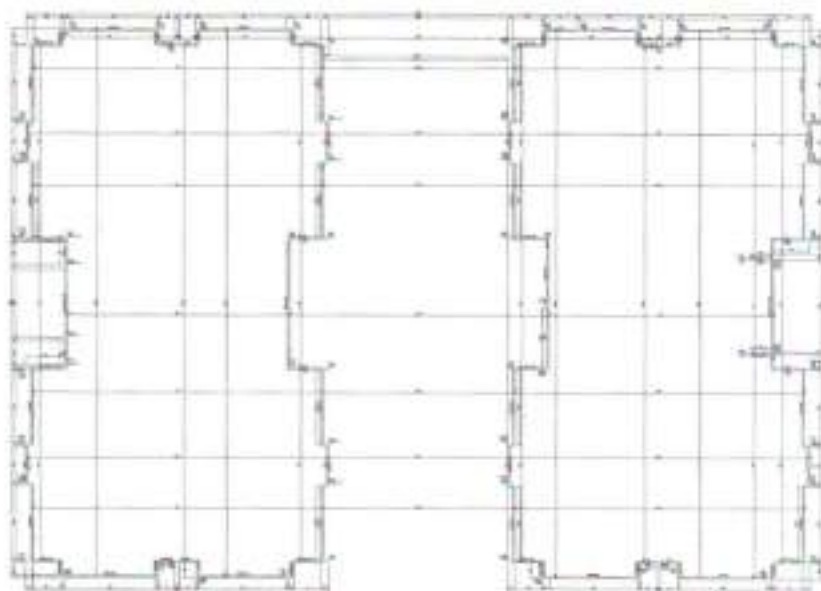

SAMILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA GE 379384

[illegible]

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº ~~835~~
 SEM EFEITO
 RUBRICA


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº 835
 RUBRICA

Legenda		Tabela de Medidas		Tabela de Cálculos		Tabela de Observações	
Item	Descrição	Medida	Unidade	Cálculo	Resultado	Observação	Assinatura
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...

SATILUX
 SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CREA CE 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
551
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 836
RUBRICA

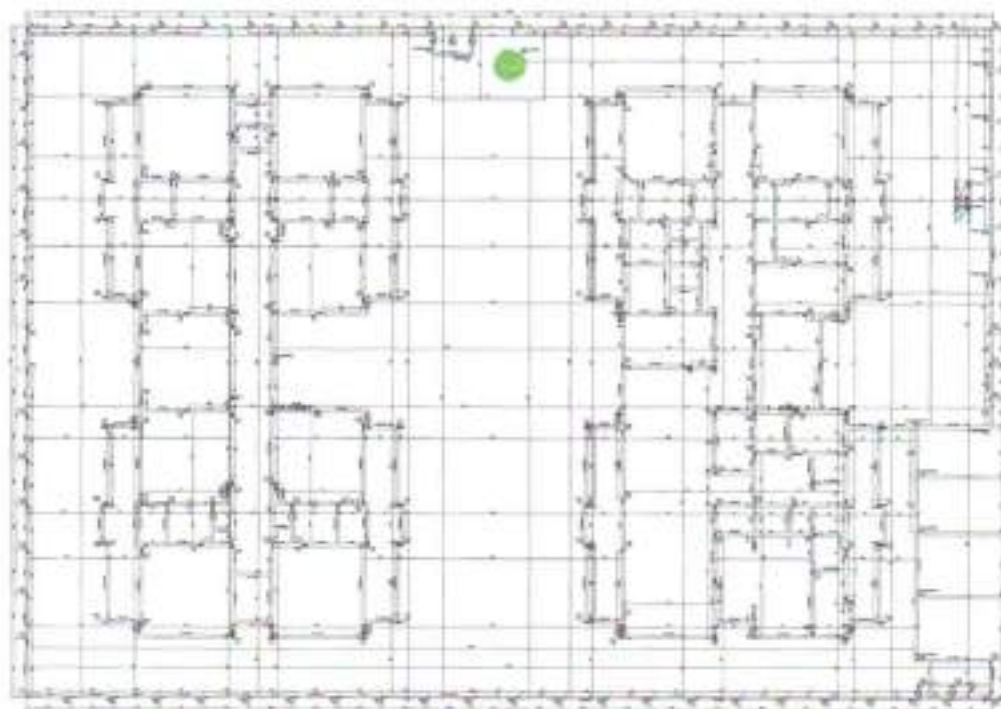

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1	100,00	100,00
2	1	200,00	200,00
3	1	300,00	300,00
4	1	400,00	400,00
5	1	500,00	500,00
6	1	600,00	600,00
7	1	700,00	700,00
8	1	800,00	800,00
9	1	900,00	900,00
10	1	1000,00	1000,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1	100,00	100,00
2	1	200,00	200,00
3	1	300,00	300,00
4	1	400,00	400,00
5	1	500,00	500,00
6	1	600,00	600,00
7	1	700,00	700,00
8	1	800,00	800,00
9	1	900,00	900,00
10	1	1000,00	1000,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1	100,00	100,00
2	1	200,00	200,00
3	1	300,00	300,00
4	1	400,00	400,00
5	1	500,00	500,00
6	1	600,00	600,00
7	1	700,00	700,00
8	1	800,00	800,00
9	1	900,00	900,00
10	1	1000,00	1000,00

Formulário de Registro de Alterações

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Data: _____

Local: _____

Observações: _____

Samuel
SAMUEL PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 338
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 338
SEM EFEITO
RUBRICA


Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	...	...	...	...
02	...	...	...	...
03	...	...	...	...
04	...	...	...	...
05	...	...	...	...
06	...	...	...	...
07	...	...	...	...
08	...	...	...	...
09	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...

INSC. ESTADUAL		Nº 00000000000000000000	
CNPJ		00.000.000/0000-00	
NOME		SANTANA, MARIA DA SILVA	
ENDEREÇO		RUA SANTANA, 123 - JARDIM PAZ - RECIFE/PE	
CEP		51000-000	
MUNICÍPIO		RECIFE	
UF		PE	
DATA DE EMISSÃO		15/03/2025	
VALOR TOTAL		R\$ 1.000,00	
VALOR DE DESCONTO		R\$ 0,00	
VALOR LÍQUIDO		R\$ 1.000,00	

SAMUELA
SÂMUELA PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384



Samir
SAMUEL ALVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA-CE-379384

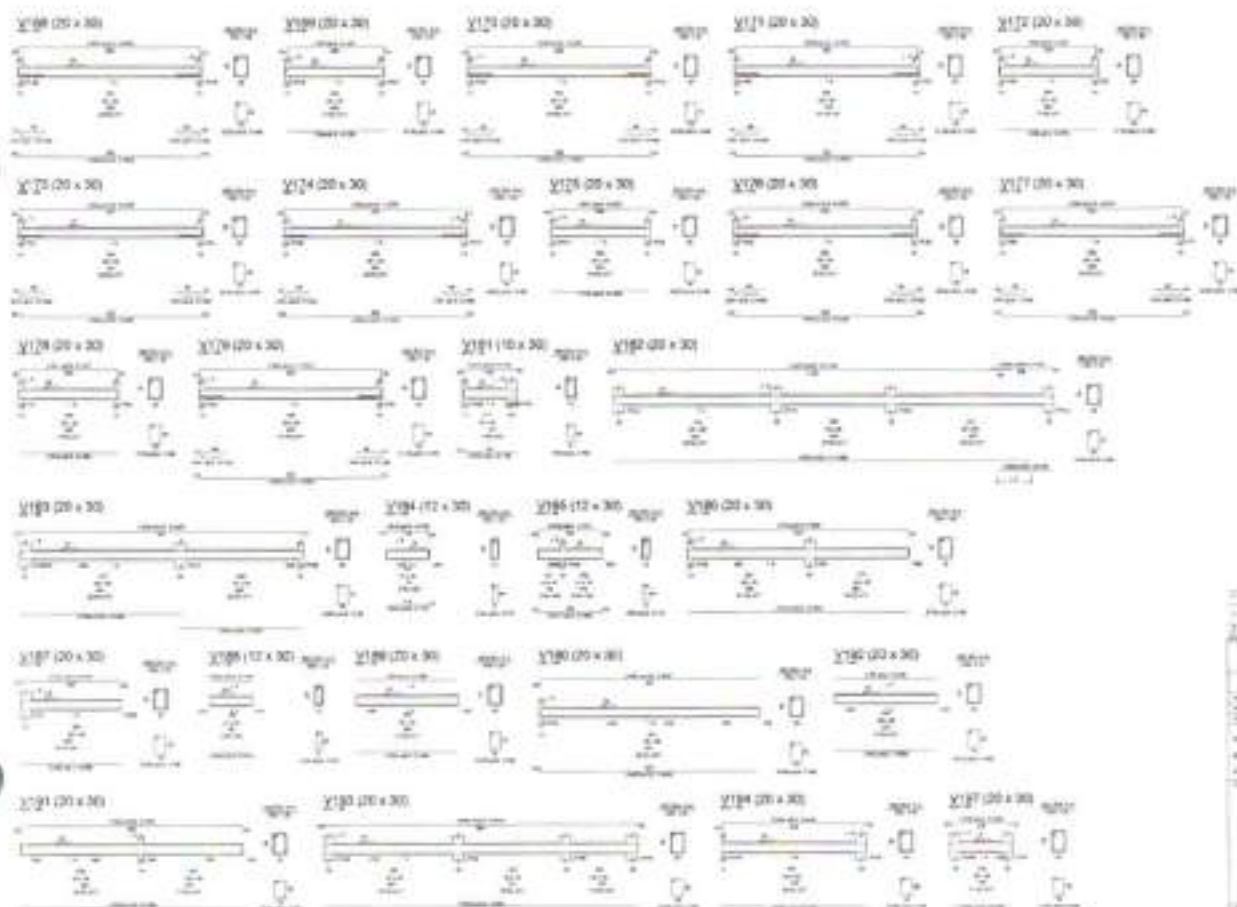


Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...

FNOE	
RELATÓRIO DE PREÇOS	
Item	Descrição
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
165
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 844
RUBRICA

Santill
SANTILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 370384

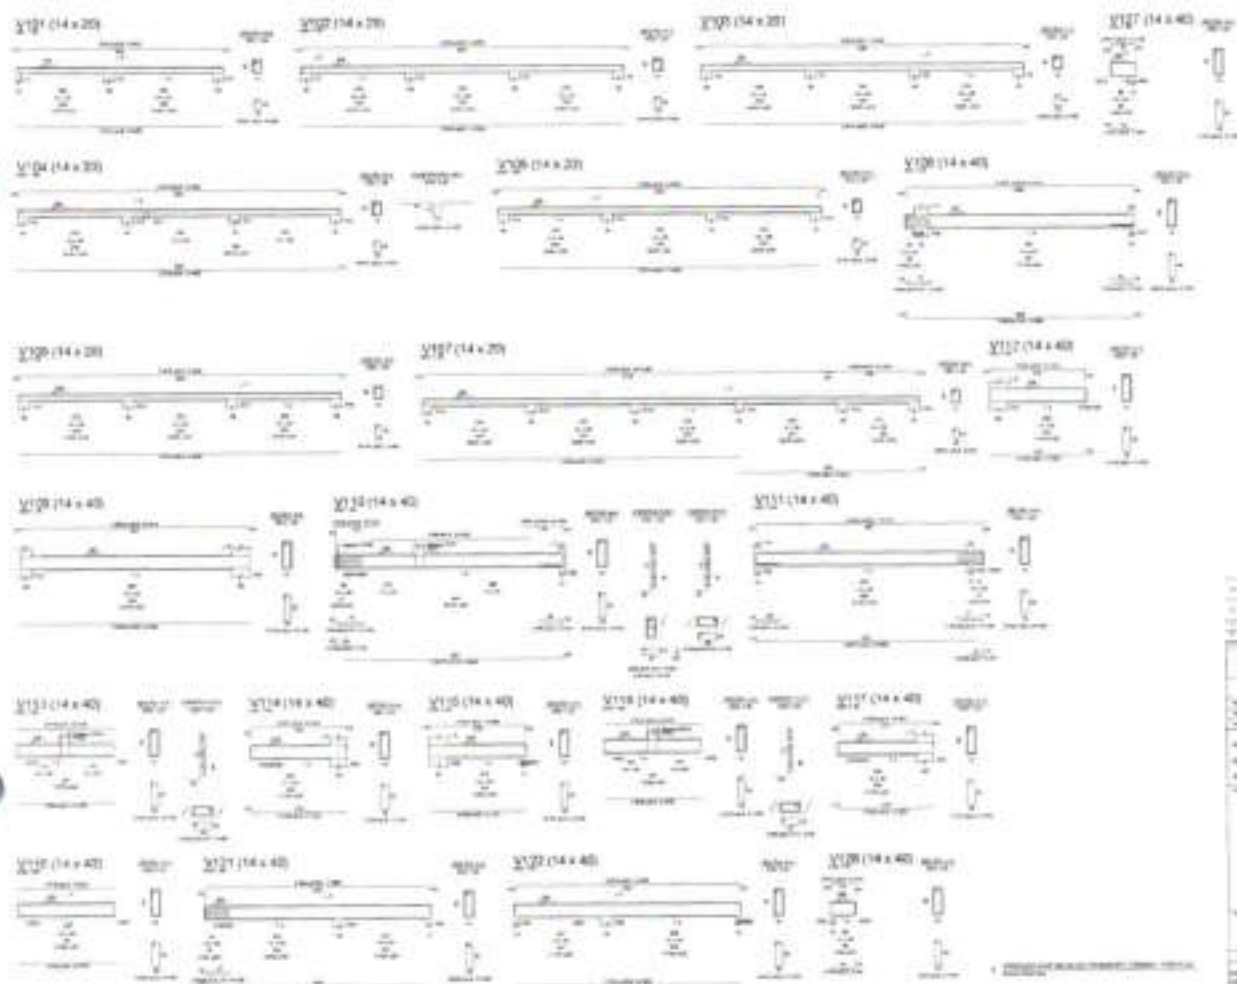

Observações:
1. As dimensões dos materiais devem ser verificadas antes da execução das obras.
2. As dimensões dos materiais devem ser verificadas antes da execução das obras.
3. As dimensões dos materiais devem ser verificadas antes da execução das obras.


Observações:
1. As dimensões dos materiais devem ser verificadas antes da execução das obras.
2. As dimensões dos materiais devem ser verificadas antes da execução das obras.
3. As dimensões dos materiais devem ser verificadas antes da execução das obras.

PROJETO DE OBRAS	
NOME DO PROJETO: _____	
LOCALIZAÇÃO: _____	
DATA: _____	
AUTOR: _____	
REVISOR: _____	
APROVADO: _____	
DATA DE APROVAÇÃO: _____	
NOME DO APROVADO: _____	
FUNÇÃO: _____	
ASSINATURA: _____	
DATA: _____	

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 845
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 845
SEM PEEITO
RUBRICA

SAMUEL P.
SAMUEL PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 37938-4

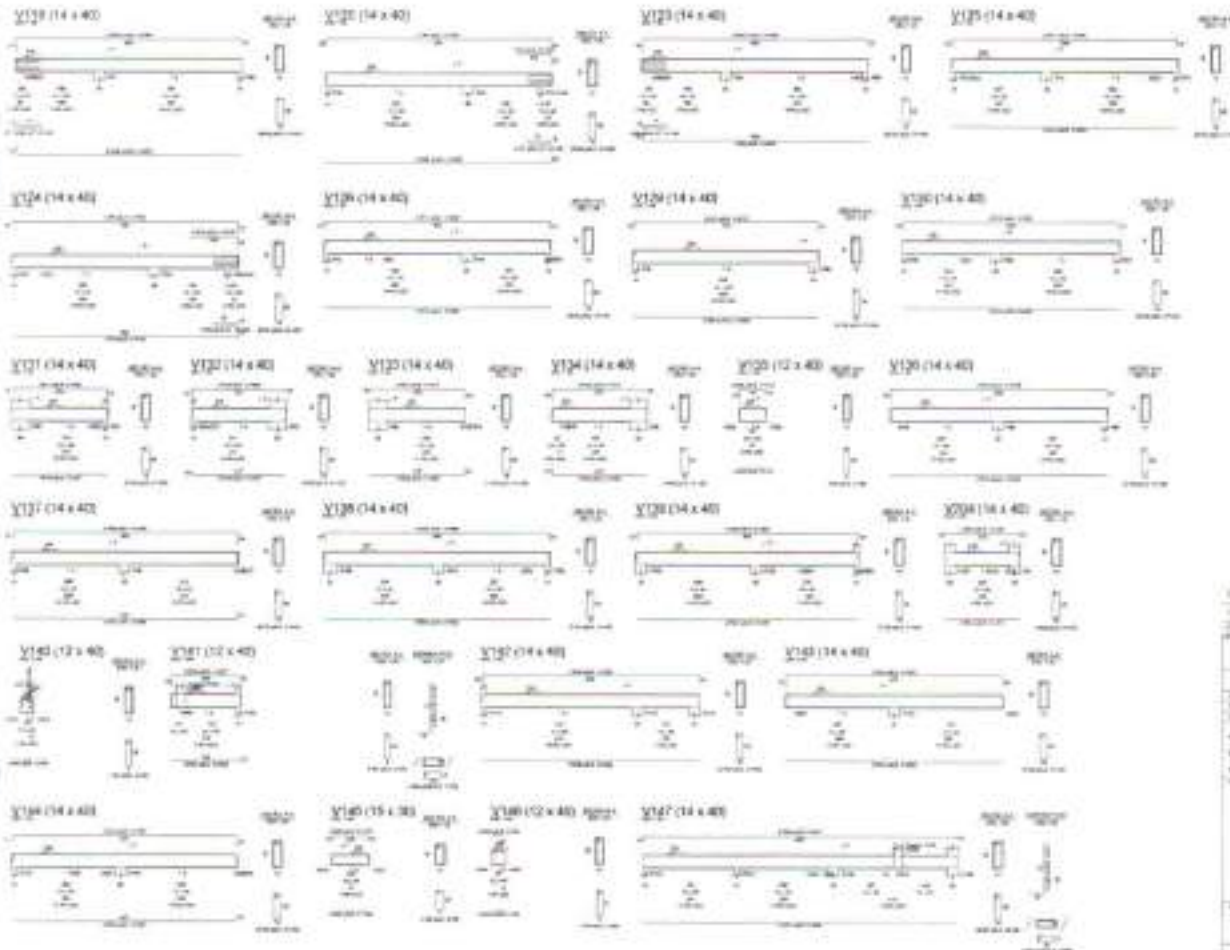


REVISÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PROJETO DE ARQUITETURA	
PROJETO DE ESTRUTURA	
PROJETO DE INSTALAÇÕES	
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	
PROJETO DE SANEAMENTO	
PROJETO DE ILUMINAÇÃO	
PROJETO DE MOBILIÁRIO	
PROJETO DE VENTILAÇÃO	
PROJETO DE AQUECIMENTO	
PROJETO DE REFRIGERAÇÃO	
PROJETO DE SEGURANÇA	
PROJETO DE ACÚSTICO	
PROJETO DE PAISAGISMO	
PROJETO DE ORÇAMENTO	
PROJETO DE cronograma	
PROJETO DE ROTEIRO	
PROJETO DE PLANO DE MANUTENÇÃO	
PROJETO DE PLANO DE SEGURANÇA	
PROJETO DE PLANO DE QUALIDADE	
PROJETO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO	
PROJETO DE PLANO DE RISCO	
PROJETO DE PLANO DE MONITORAMENTO	
PROJETO DE PLANO DE AVALIAÇÃO	
PROJETO DE PLANO DE ENCERRAMENTO	




Sandra
SANDRE PAVIA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

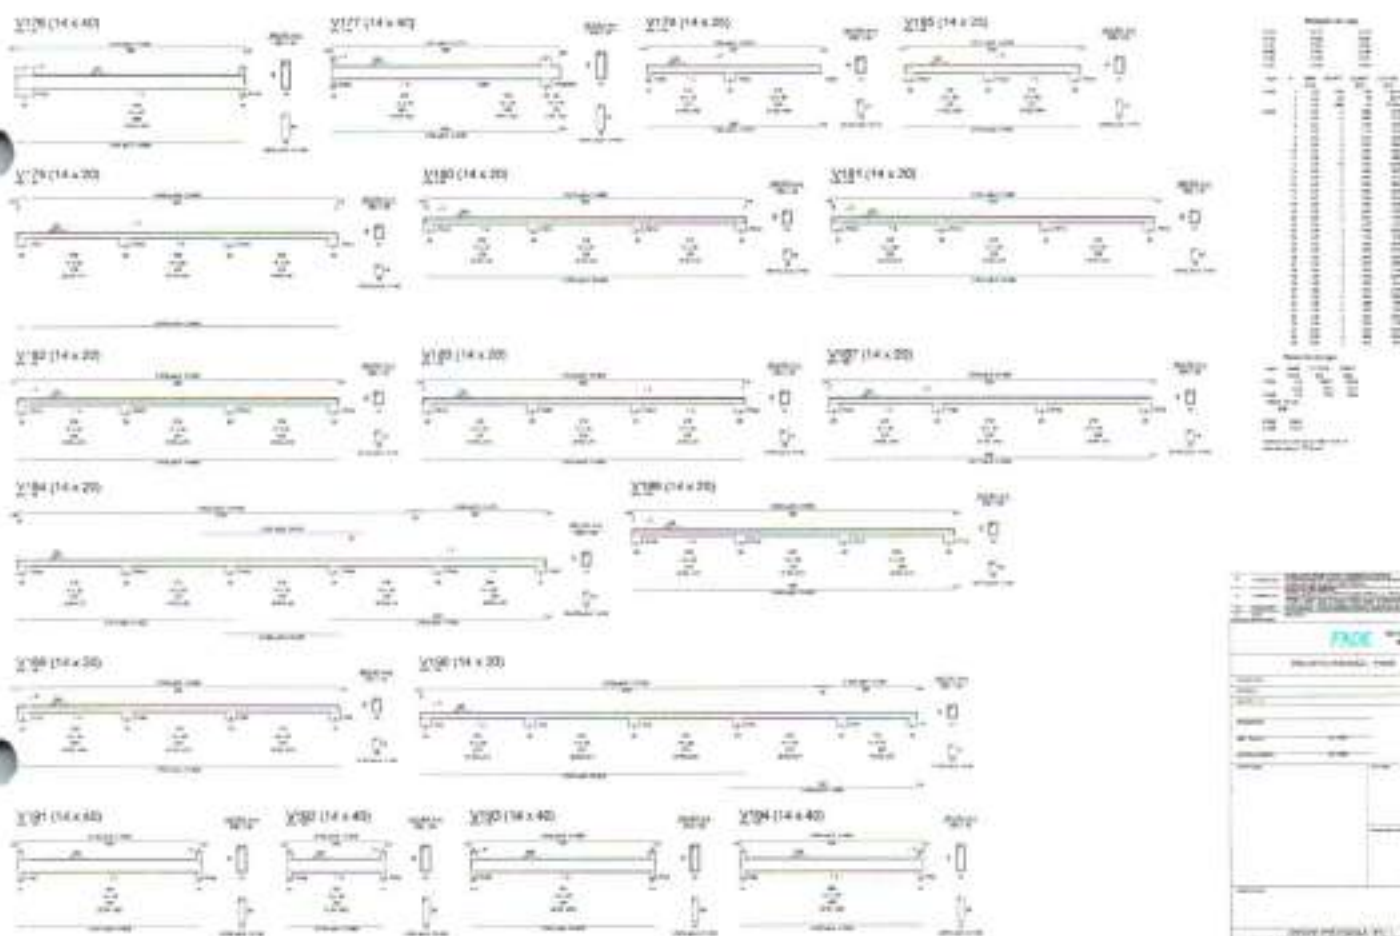[illegible]

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 848
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 848
SEM EFEITO
RUBRICA

Samir
SAMIRLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

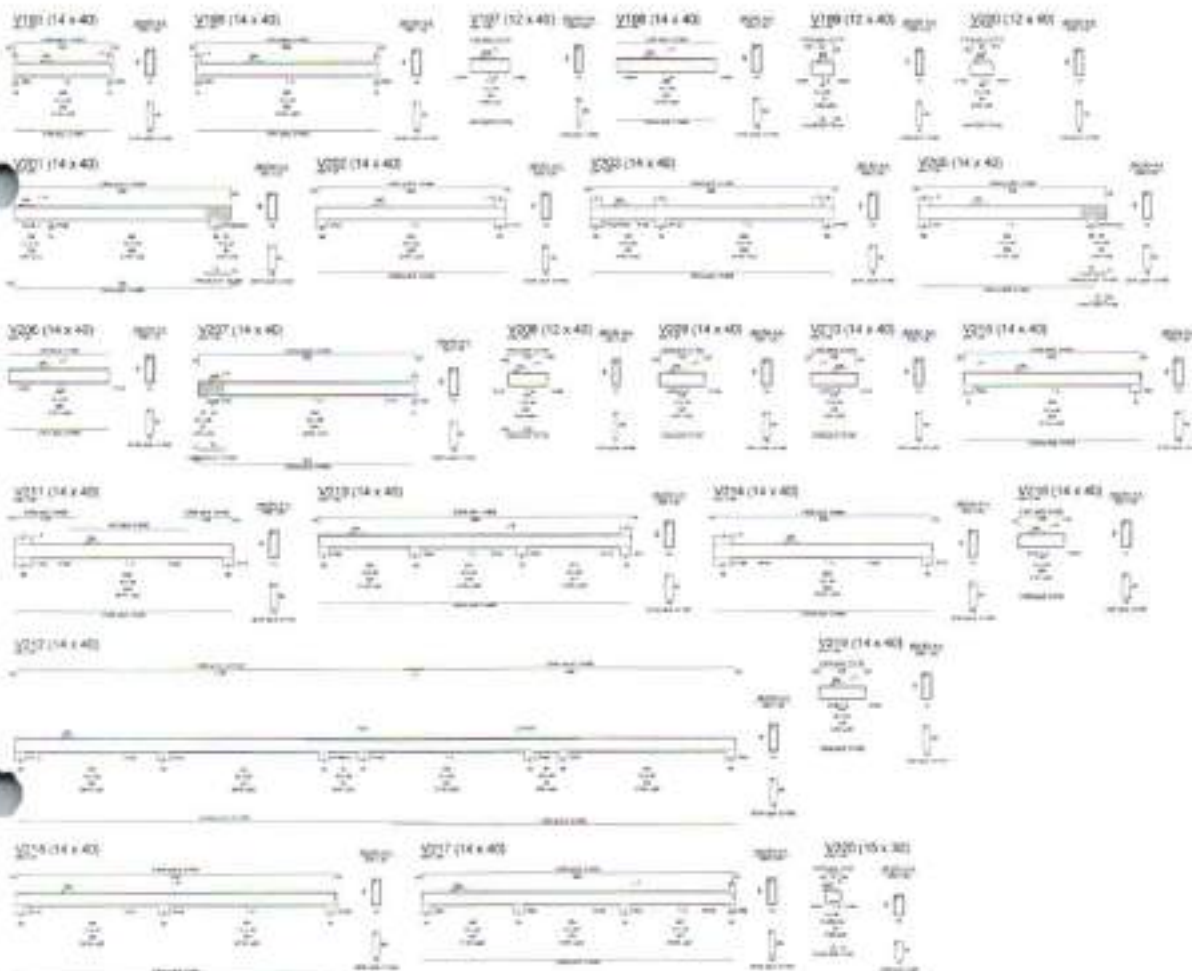


Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1	1000000	1000000
2	1	1000000	1000000
3	1	1000000	1000000
4	1	1000000	1000000
5	1	1000000	1000000
6	1	1000000	1000000
7	1	1000000	1000000
8	1	1000000	1000000
9	1	1000000	1000000
10	1	1000000	1000000
11	1	1000000	1000000
12	1	1000000	1000000
13	1	1000000	1000000
14	1	1000000	1000000
15	1	1000000	1000000
16	1	1000000	1000000
17	1	1000000	1000000
18	1	1000000	1000000
19	1	1000000	1000000
20	1	1000000	1000000
21	1	1000000	1000000
22	1	1000000	1000000
23	1	1000000	1000000
24	1	1000000	1000000

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	
Nome do Projeto:	
Localização:	
Objetivo:	
Responsável Técnico:	
Assinatura:	
Carimbo:	
Data de Emissão: 15/07/2025	
Versão: 1.0	

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 850
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 850
SEM EFEITO
RUBRICA

PORTARIA 157 2025
CREA CE 379284

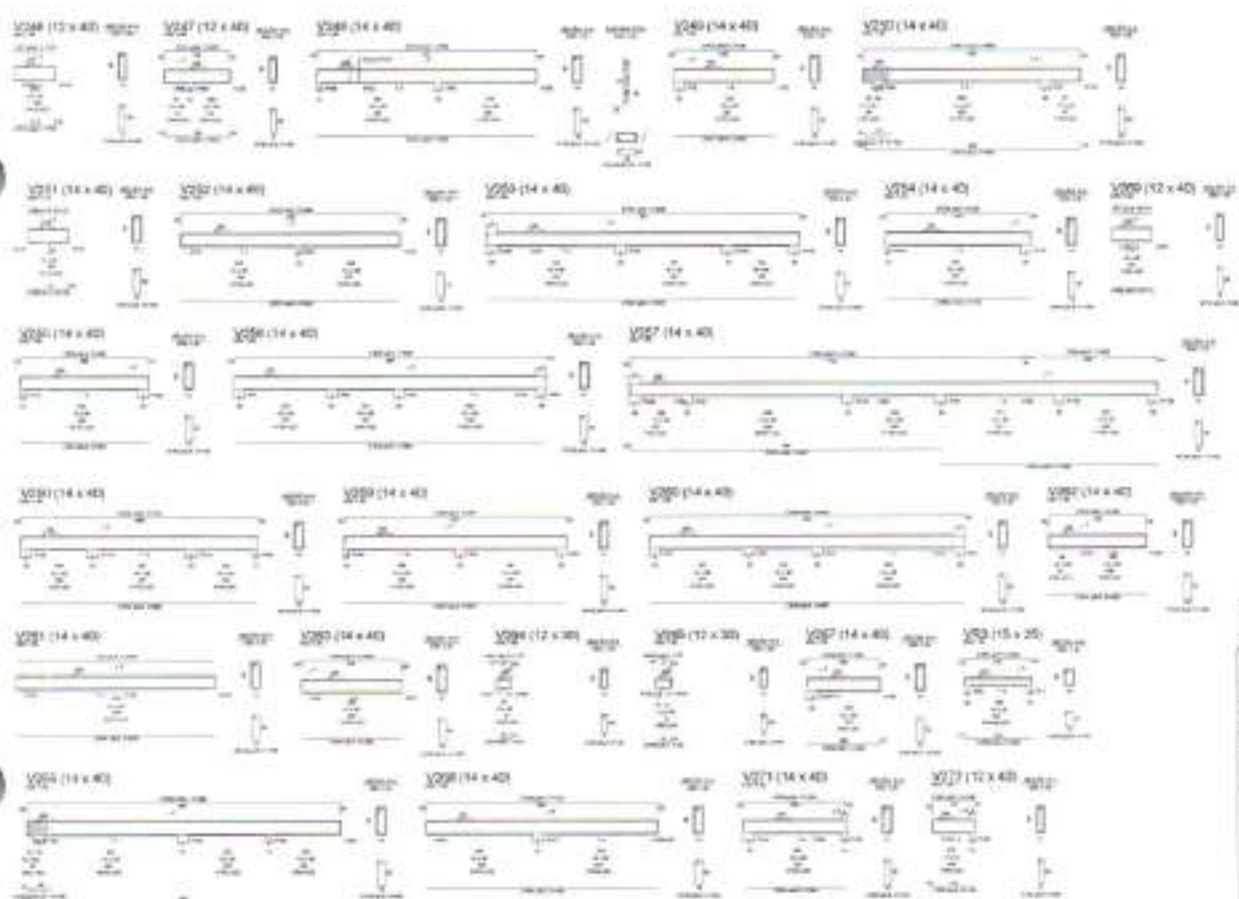

REVISÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FICHA	
PROJETO: PORTARIA - 157	
AUTOR: []	
REVISOR: []	
APROVADO: []	
DATA: []	
LUGAR: []	
OBSERVAÇÃO: []	
ASSINATURA: []	
DATA: []	

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 851
RUBRICA

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023


FICHA DE AVALIAÇÃO	
NOME DO ALUNO: _____	
NOME DO PROFESSOR: _____	
DATA: _____	
TURMA: _____	
MATERIAL: _____	
CONTEÚDO: _____	
MÉTODO: _____	
DURAÇÃO: _____	
OBSERVAÇÕES: _____	
AVALIAÇÃO: _____	
ASSINATURA DO PROFESSOR: _____	
ASSINATURA DO ALUNO: _____	
DATA DA AVALIAÇÃO: _____	

SANDILE PATIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 853
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 853
SEM EFEITO
RUBRICA


Sarvik
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
PRE Nº 170384

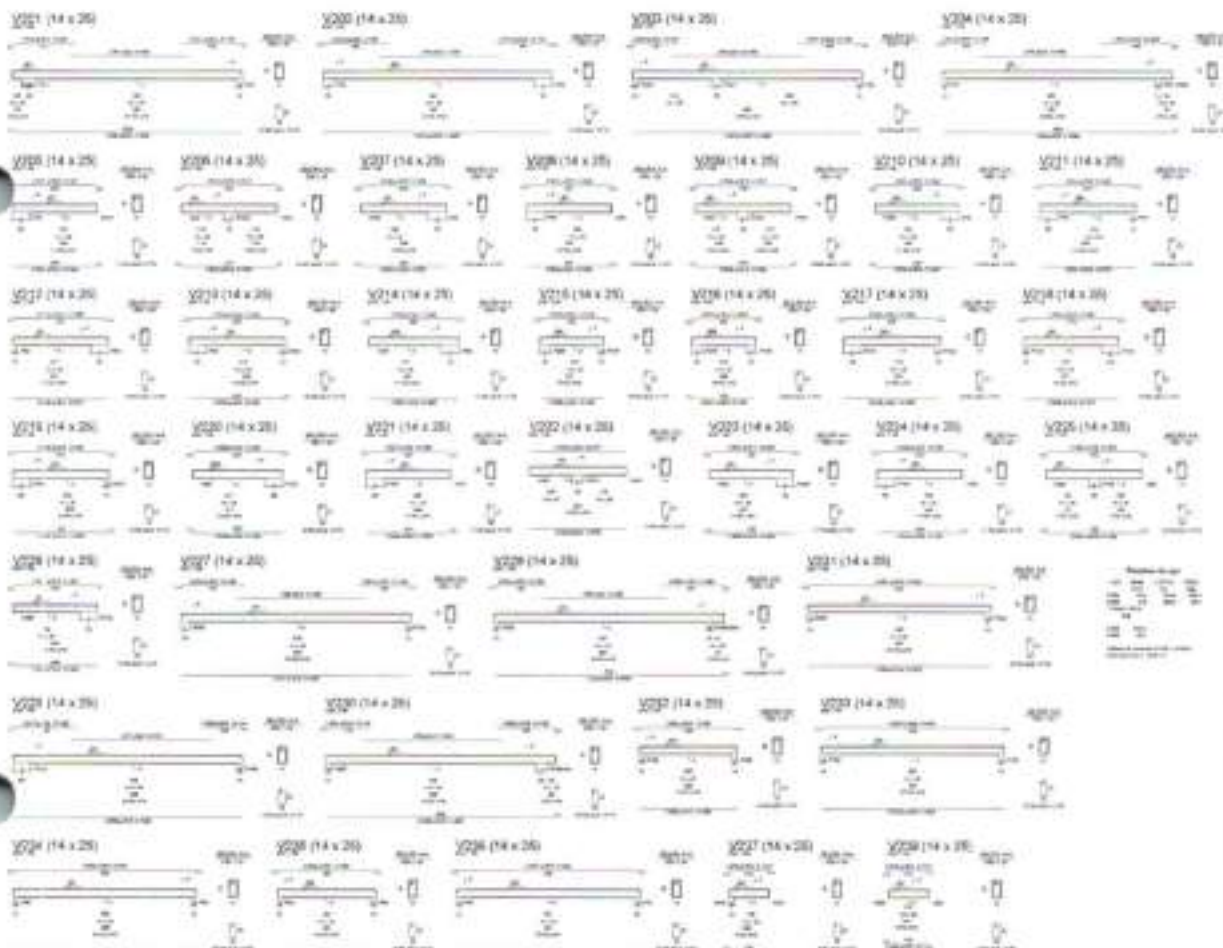

Formulário de registro e controle de documentos, contendo campos para data, número, e assinaturas, além de uma seção para observações e anexos.



SAMUEL
SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CPF: 00.379384

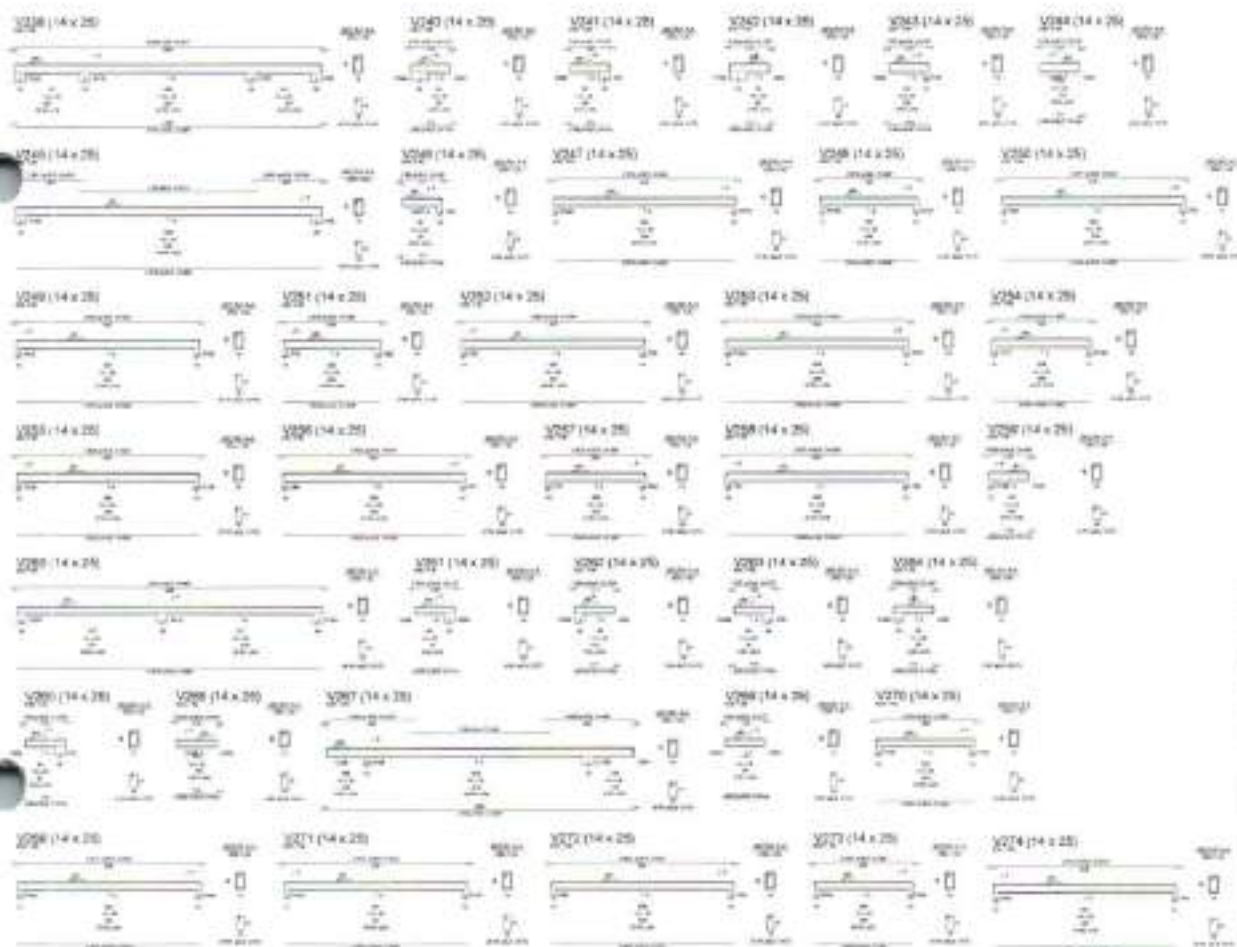

Formulario de Registro

Nombre: _____

Apellido: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

País: _____

Fecha de Registro: _____

Información de Contacto

Teléfono: _____

Correo Electrónico: _____

Profesión: _____

Estado Civil: _____

Grupos de Interés: _____


Notas:

Observaciones:

Observaciones:

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 846
RUBRICA


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 846
SEM EFEITO
RUBRICA

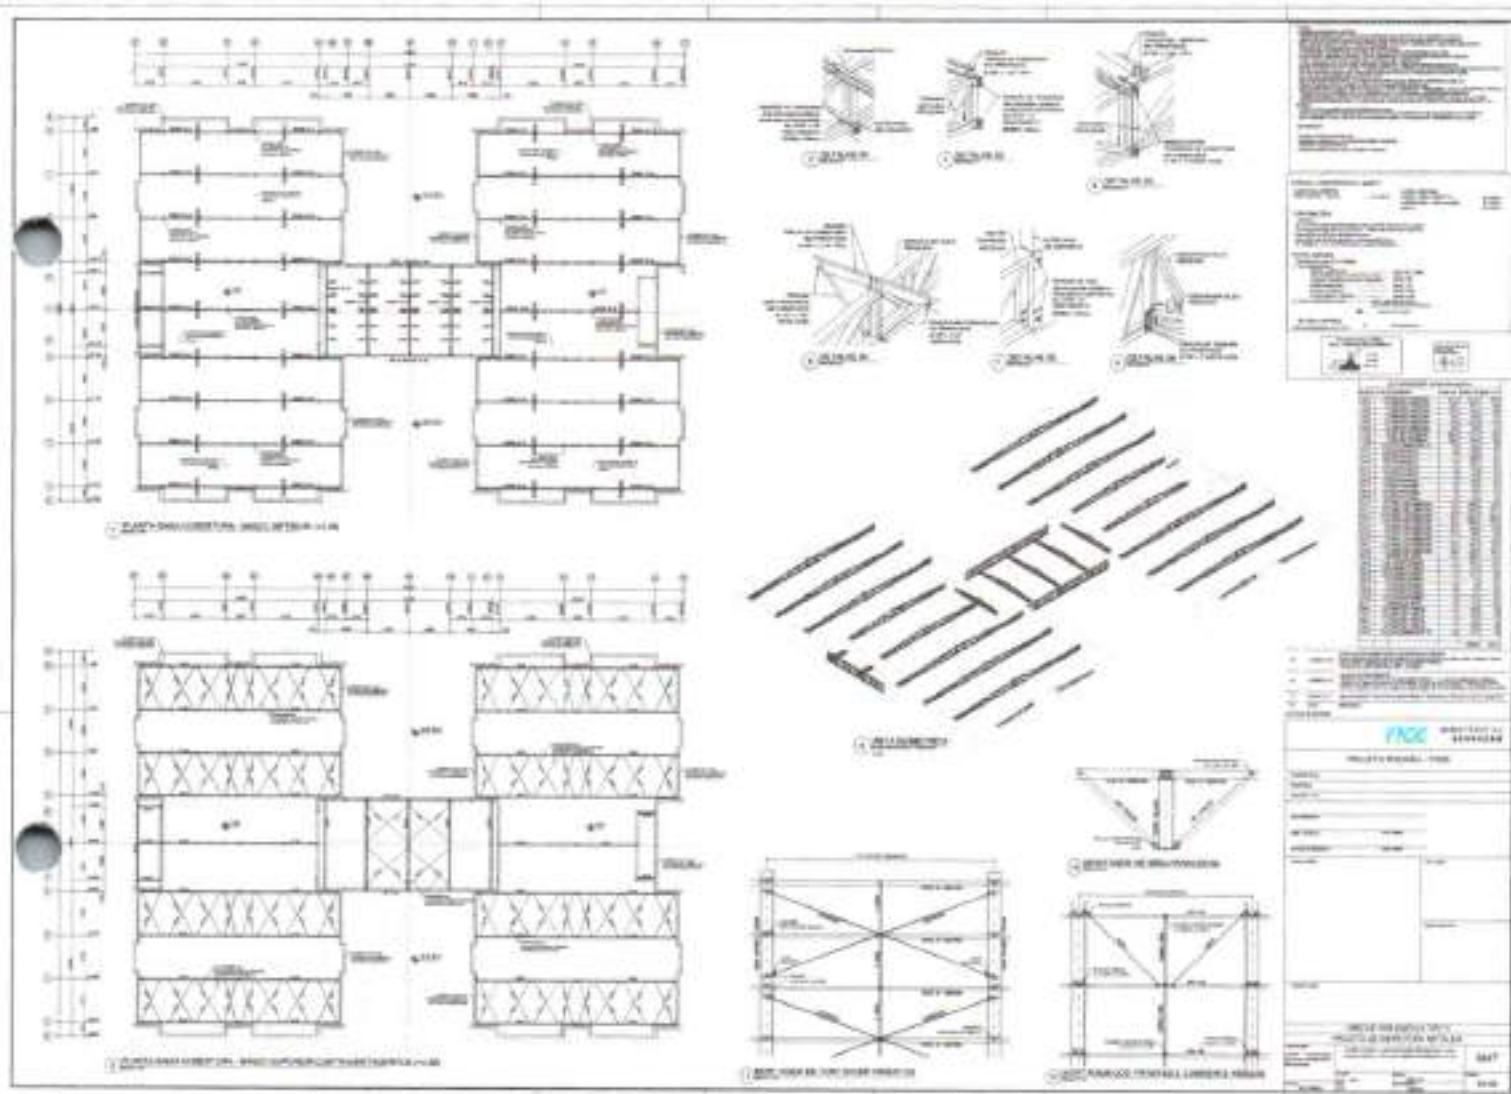

Samuel
FELIPE OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CNS 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. Nº 851
SEM EFEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. Nº 851
RUBRICA

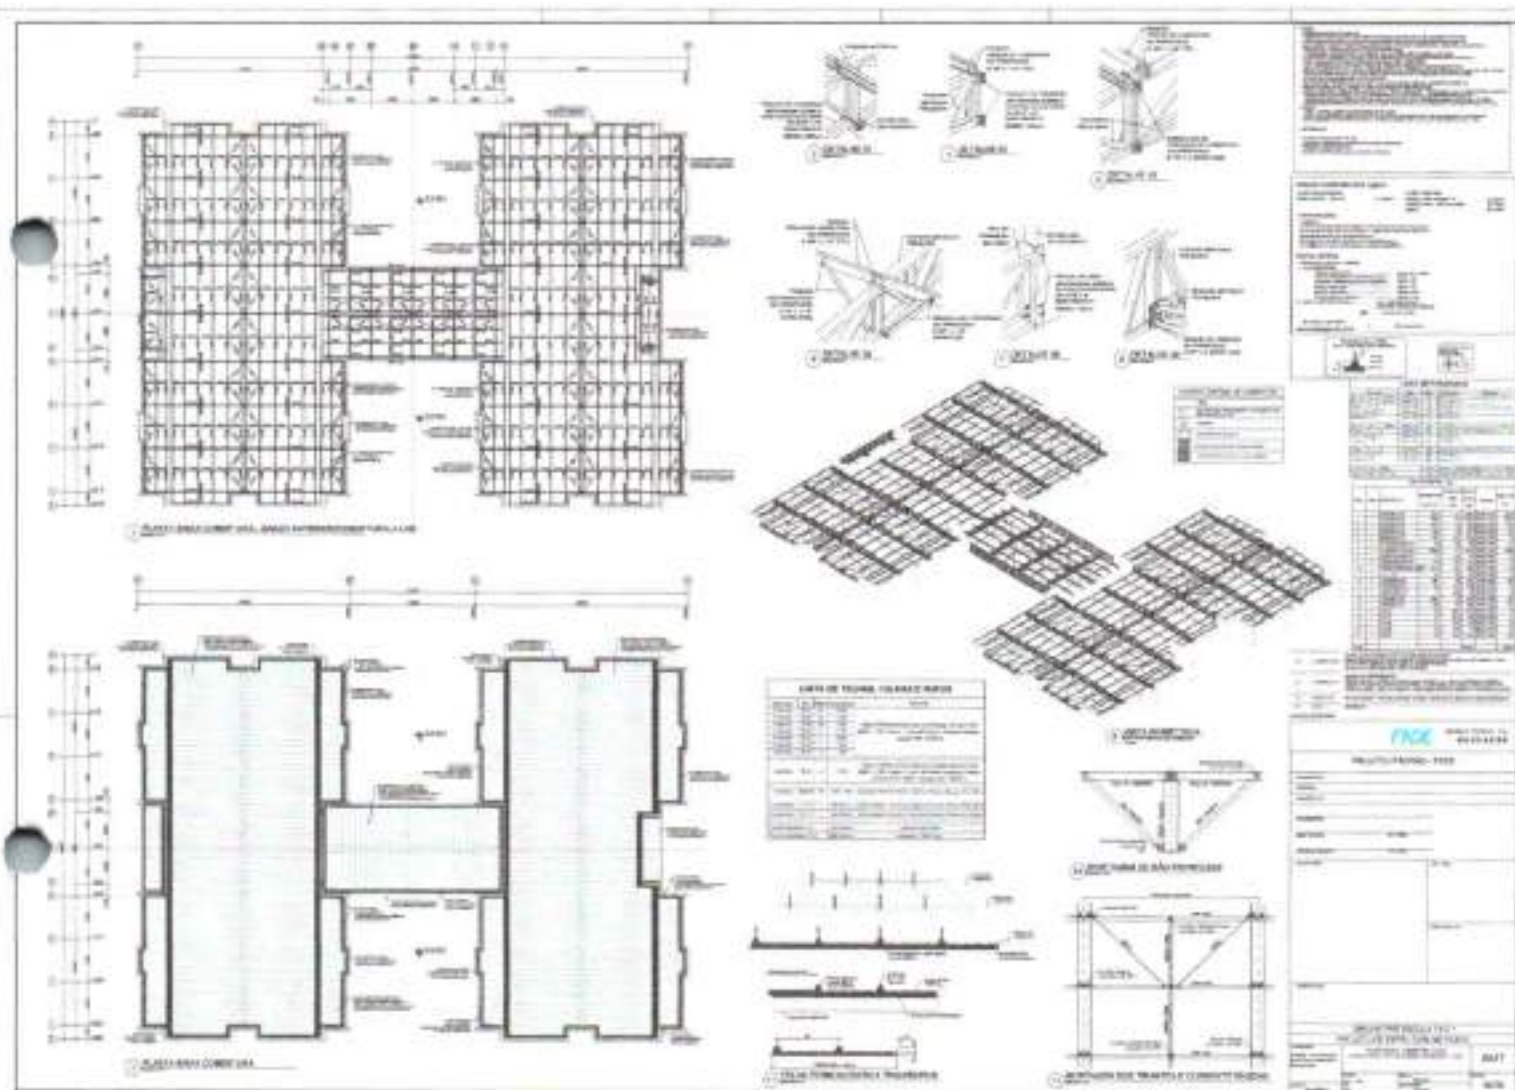


Sanit
SANDILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CCEA CE 379384



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. Nº **859**
SEM EFEITO
RUBRICA


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. Nº **859**
4
RUBRICA

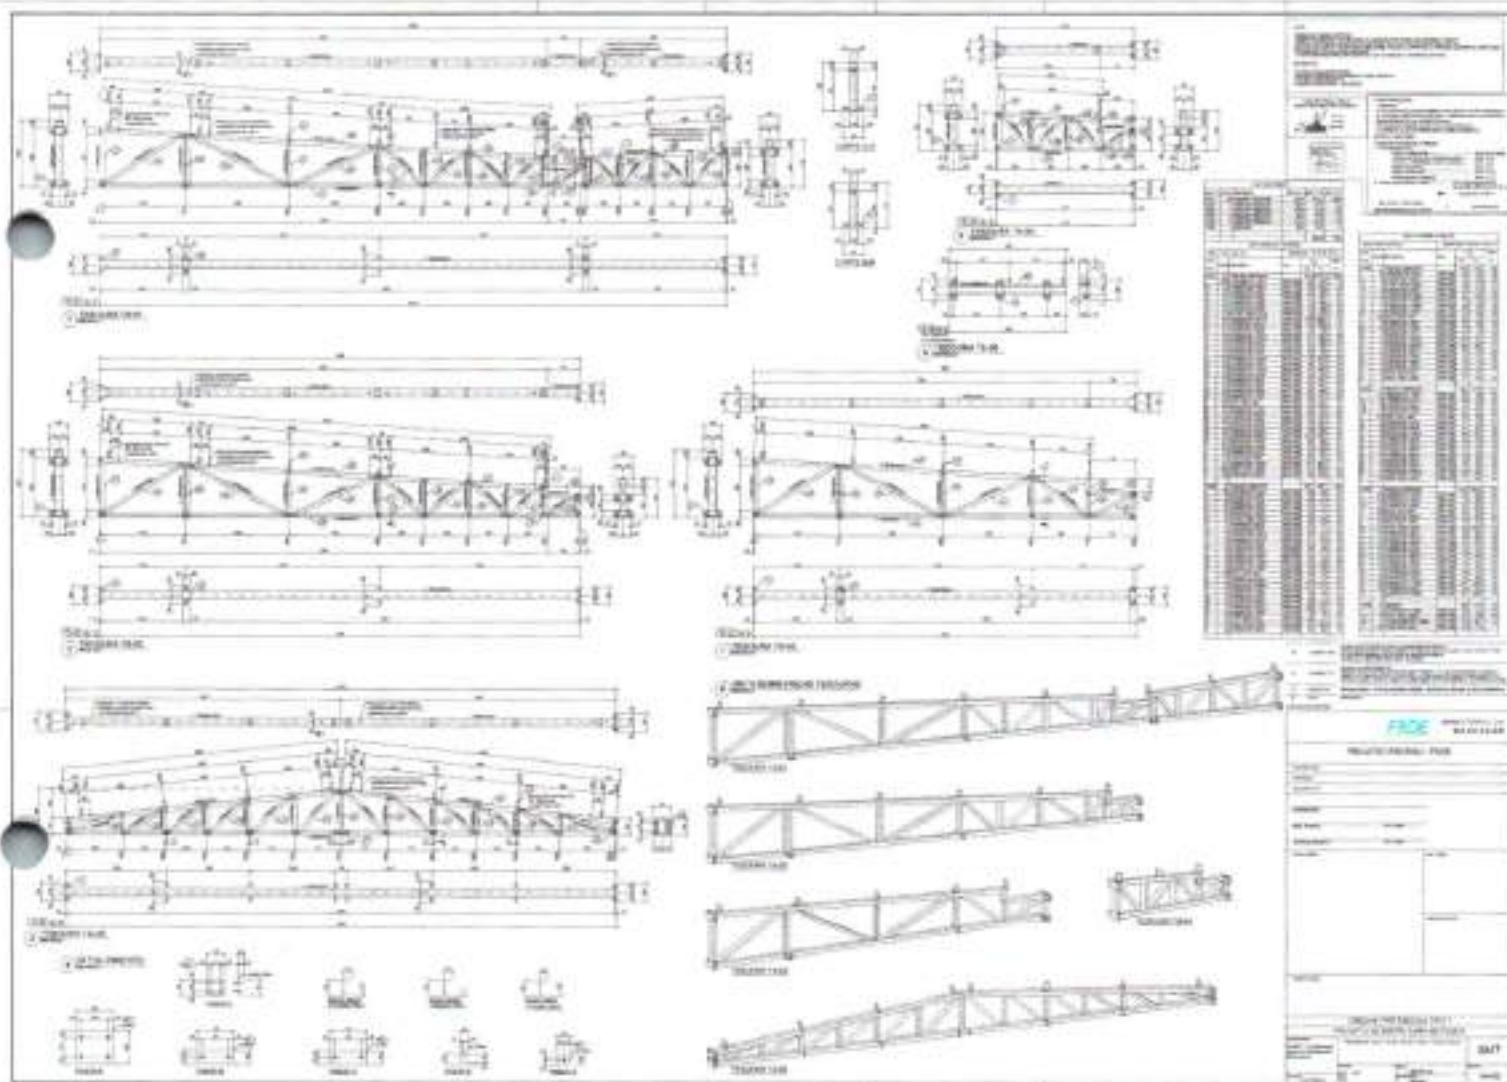

Samuel
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 370384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 860
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 860
RUBRICA

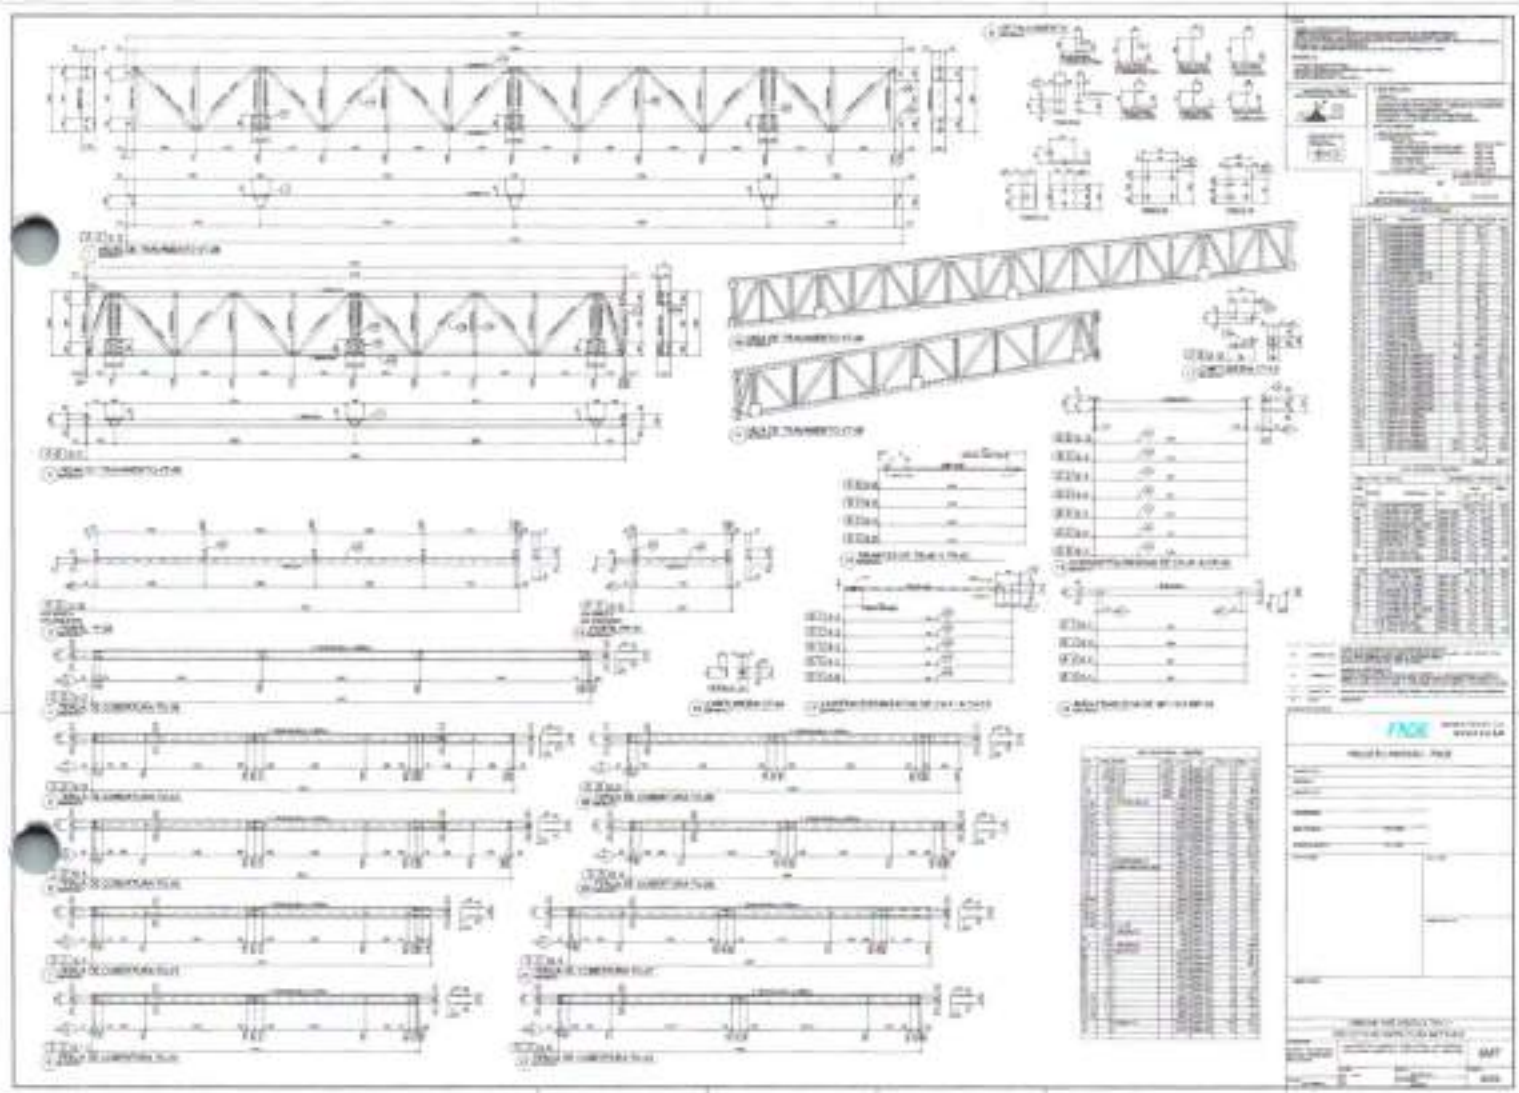

Samuel
LUIZ OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 370384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

SAMILE PAIVA OLIVEIRA
157 2025
SAMILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CPA CE 379384



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

Legenda

Amarelo	Revestimento de parede em cerâmica
Verde	Revestimento de parede em madeira
Vermelho	Revestimento de parede em pedra
Azul	Revestimento de parede em vidro

Título





Escola Municipal de Educação Infantil
Projeto de Renovação do Ambiente
Fazenda

Arquiteta: Samille Paiva Oliveira
Portaria 157/2025
CREA CE 379274

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 85
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 85
SEM EFEITO
RUBRICA

1. INTRODUÇÃO

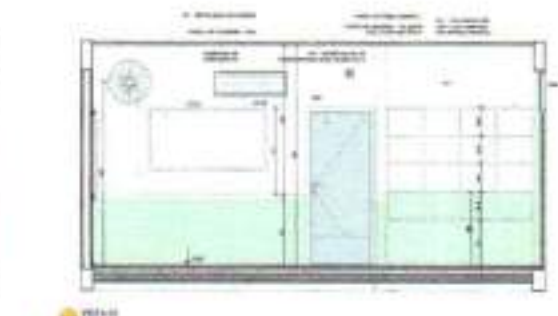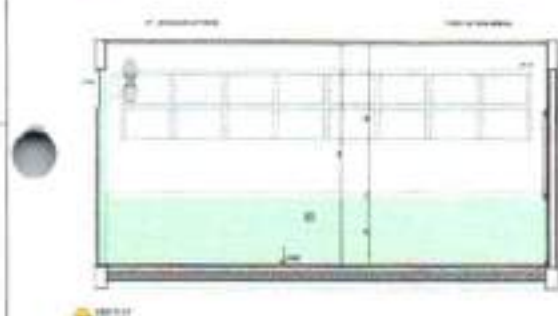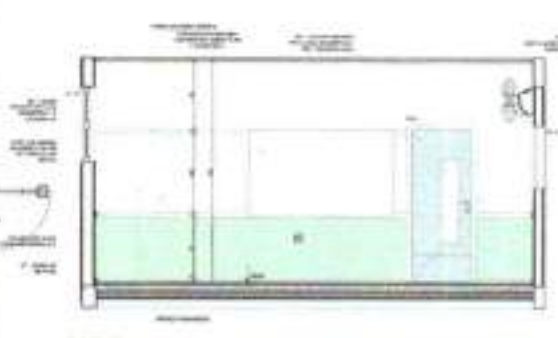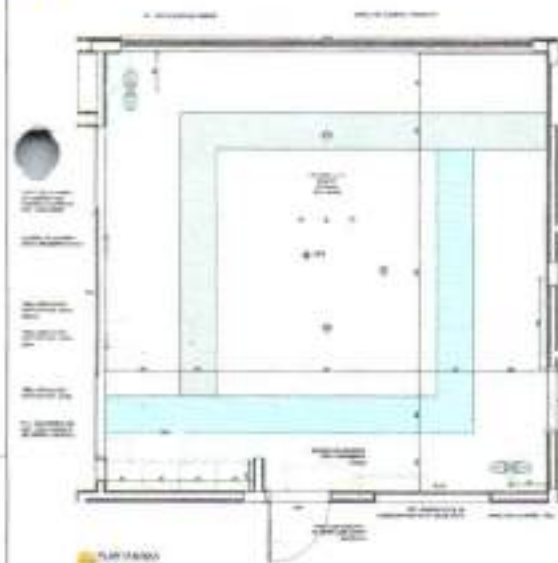

Este projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas vigentes e as especificações do cliente. O projeto é de caráter consultivo e não constitui garantia de resultados. O cliente é responsável por verificar a viabilidade técnica e econômica do projeto antes de sua aprovação.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Projeto de Arquitetura	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
2	Projeto de Engenharia	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
3	Projeto de Instalações	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
4	Projeto de Paisagismo	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
5	Projeto de Iluminação	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
6	Projeto de Acústica	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
7	Projeto de Ventilação	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
8	Projeto de Segurança	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
9	Projeto de Acessibilidade	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
10	Projeto de Sustentabilidade	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00



Este projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas vigentes e as especificações do cliente. O projeto é de caráter consultivo e não constitui garantia de resultados. O cliente é responsável por verificar a viabilidade técnica e econômica do projeto antes de sua aprovação.

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
PROJETO PADRÃO - FINE

Samir
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 370384

ENGENHEIRO PRECATORIO
PROJETO DE ARQUITETURA
ARQ
01/01

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 86
RUBRICA

[illegible]

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 867
RUBRICA

[illegible]

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 263
RUBRICA

The architectural drawings include a site plan, a floor plan, and two section views. The site plan shows the building's location within a larger urban context. The floor plan shows the internal layout of the building, including classrooms, a library, and administrative offices. The section views show the building's profile and internal structure. The drawings are labeled with 'FIDE' and 'PROJETO PADRÃO - FIDE'.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 869
RUBRICA

[illegible]

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 810
SEM FEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 810
SEM FEITO
RUBRICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO
LABORATÓRIO DE PROJETOS DE ARQUITETURA

PROJETO: **PROJETO PADRÃO - TICE**

PROFESSOR: **SAMUEL PAIVA OLIVEIRA**

ALUNO: **SAMUEL PAIVA OLIVEIRA**

DISCIPLINA: **PROJETO DE ARQUITETURA**

DATA: **10/05/2017**

LOCAL: **CRP**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO
LABORATÓRIO DE PROJETOS DE ARQUITETURA

PROJETO: **PROJETO PADRÃO - TICE**




PROFESSOR: **SAMUEL PAIVA OLIVEIRA**

ALUNO: **SAMUEL PAIVA OLIVEIRA**


DISCIPLINA: **PROJETO DE ARQUITETURA**

DATA: **10/05/2017**

LOCAL: **CRP**

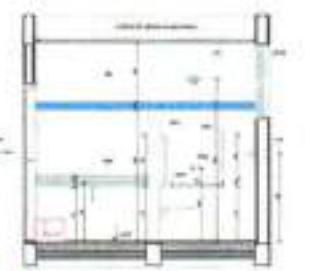

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...




PLANTAS

PLANTAS

PLANTAS





COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 310
RUBRICA

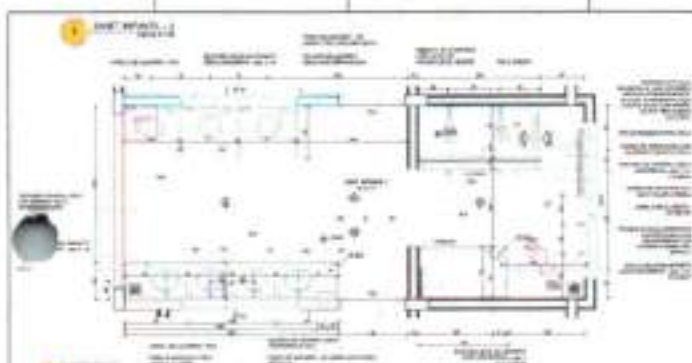

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Material de construção	100	100,00	10.000,00
2	Material de acabamento	200	50,00	10.000,00
3	Material de instalação	50	200,00	10.000,00
4	Material de mobiliário	100	100,00	10.000,00
5	Material de transporte	50	200,00	10.000,00
6	Material de manutenção	50	200,00	10.000,00
7	Material de segurança	50	200,00	10.000,00
8	Material de saneamento	50	200,00	10.000,00
9	Material de energia	50	200,00	10.000,00
10	Material de comunicação	50	200,00	10.000,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Material de construção	100	100,00	10.000,00
2	Material de acabamento	200	50,00	10.000,00
3	Material de instalação	50	200,00	10.000,00
4	Material de mobiliário	100	100,00	10.000,00
5	Material de transporte	50	200,00	10.000,00
6	Material de manutenção	50	200,00	10.000,00
7	Material de segurança	50	200,00	10.000,00
8	Material de saneamento	50	200,00	10.000,00
9	Material de energia	50	200,00	10.000,00
10	Material de comunicação	50	200,00	10.000,00

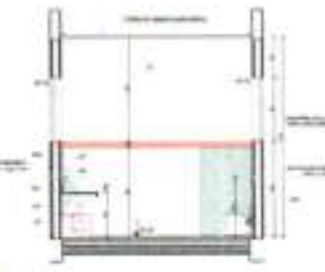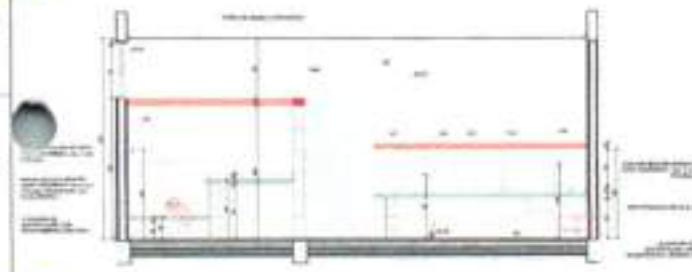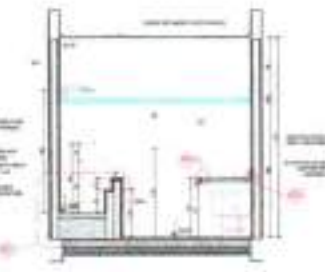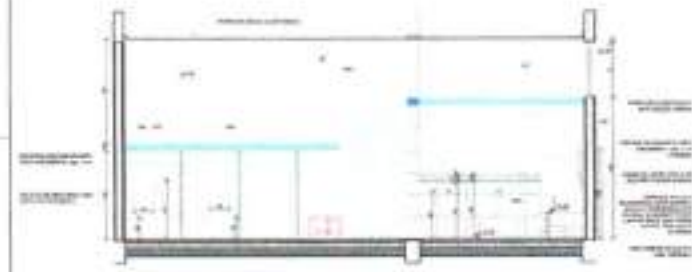

FACE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PROJETO PADRÃO - TIPO

SOMILIA PRATA OLIVEIRA

PORTA...

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PROJETO PADRÃO - TIPO

SOMILIA PRATA OLIVEIRA

PORTA...

ARQ

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº 313
 RUBRICA



PROJETO PADRÃO - FINE

FADE - Ministério da Educação

SASILE PAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157/2025
 CREA CE 379384

UNIDADE PRÉ-ESCOLAR TIPO 1
 PROJETO DE ARQUITETURA


ARE

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
395
8
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 874
2
RUBRICA



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

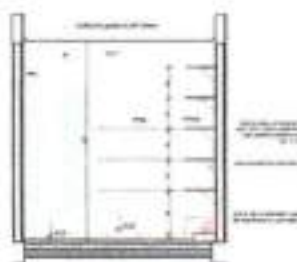

PROJETO PADRÃO - FINE

FADE INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FINE

PROJETO PADRÃO - FINE

PROJETO PADRÃO - FINE

PROJETO PADRÃO - FINE

PROJETO PADRÃO - FINE

PROJETO PADRÃO - FINE

PROJETO PADRÃO - FINE

PROJETO PADRÃO - FINE

PROJETO PADRÃO - FINE

PROJETO PADRÃO - FINE

PROJETO PADRÃO - FINE

PROJETO PADRÃO - FINE

PROJETO PADRÃO - FINE

PROJETO PADRÃO - FINE

PROJETO PADRÃO - FINE

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL No 875
RUBRICA

The image displays a set of architectural drawings for a building project. The drawings include:

- Floor Plans:** Several floor plans are shown, including a large main floor plan (top left) and smaller plans for specific areas (bottom left, bottom right). The plans are detailed with room numbers, dimensions, and furniture placement.
- Sections:** Two vertical sections are shown, labeled 'SEÇÃO A-A' and 'SEÇÃO B-B', illustrating the building's profile and internal structure.
- Site Plan:** A small site plan is located in the top right corner, showing the building's location within a larger context.
- Table of Contents:** A table of contents is visible on the right side of the page, listing the various drawings and their corresponding page numbers.

The drawings are presented in a professional, technical style, typical of architectural blueprints. The use of color (yellow and blue) highlights specific areas and features. The overall layout is organized and easy to navigate.



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 817
RUBRICA

SAMILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 370364



(C) 2018 THE ARQ GROUP PRODUCTIONS ARQ GROUP		ARQ
(C) 2018 THE ARQ GROUP PRODUCTIONS ARQ GROUP	(C) 2018 THE ARQ GROUP PRODUCTIONS ARQ GROUP	

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 879
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SÉM EFEITO
 +
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº 870
 +
 RUBRICA

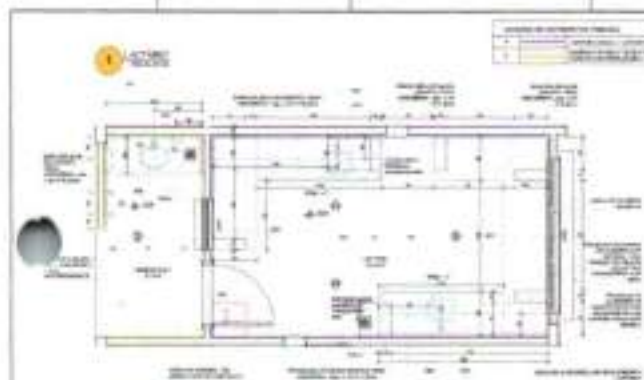

PROJETO PADRÃO - FIDE

PROJETO PADRÃO - FIDE


Saville
 SAVILLE PAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CREA CE 379304

UNIDADE PRECATORIA Nº 1
 PROJETOS ARQUITETURA

PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº **881**
 SEM EFEITO
 RUBRICA


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº **881**
 RUBRICA

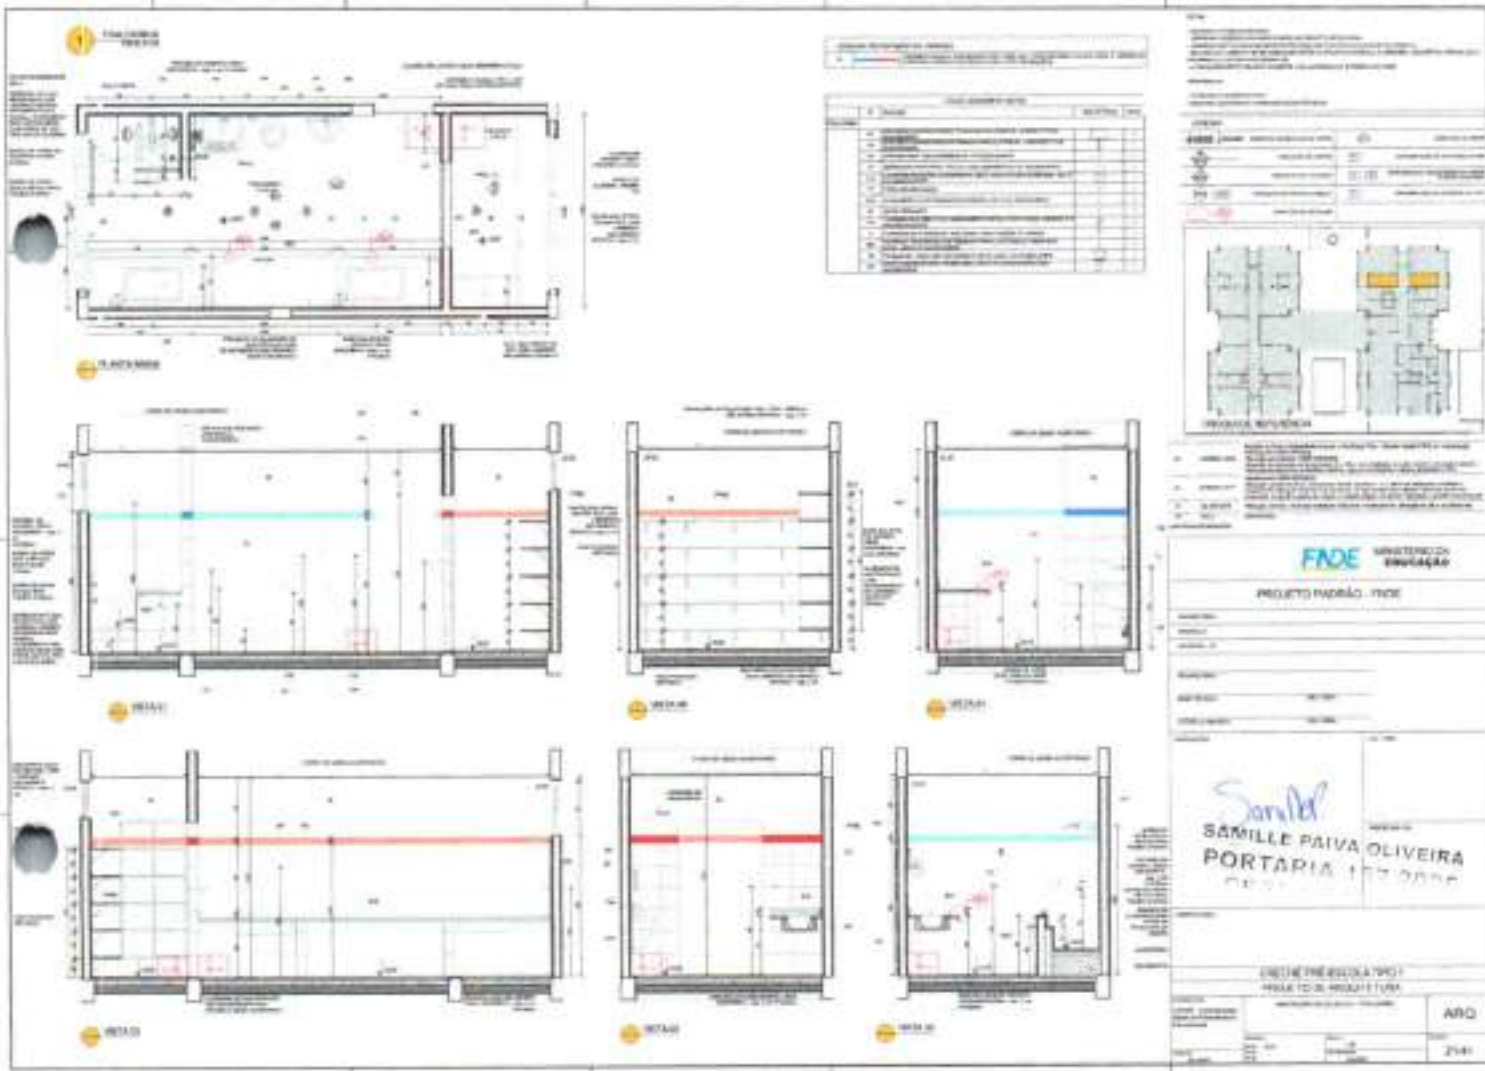

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 88
SEM EFEITO
RUBRICA


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 88
RUBRICA

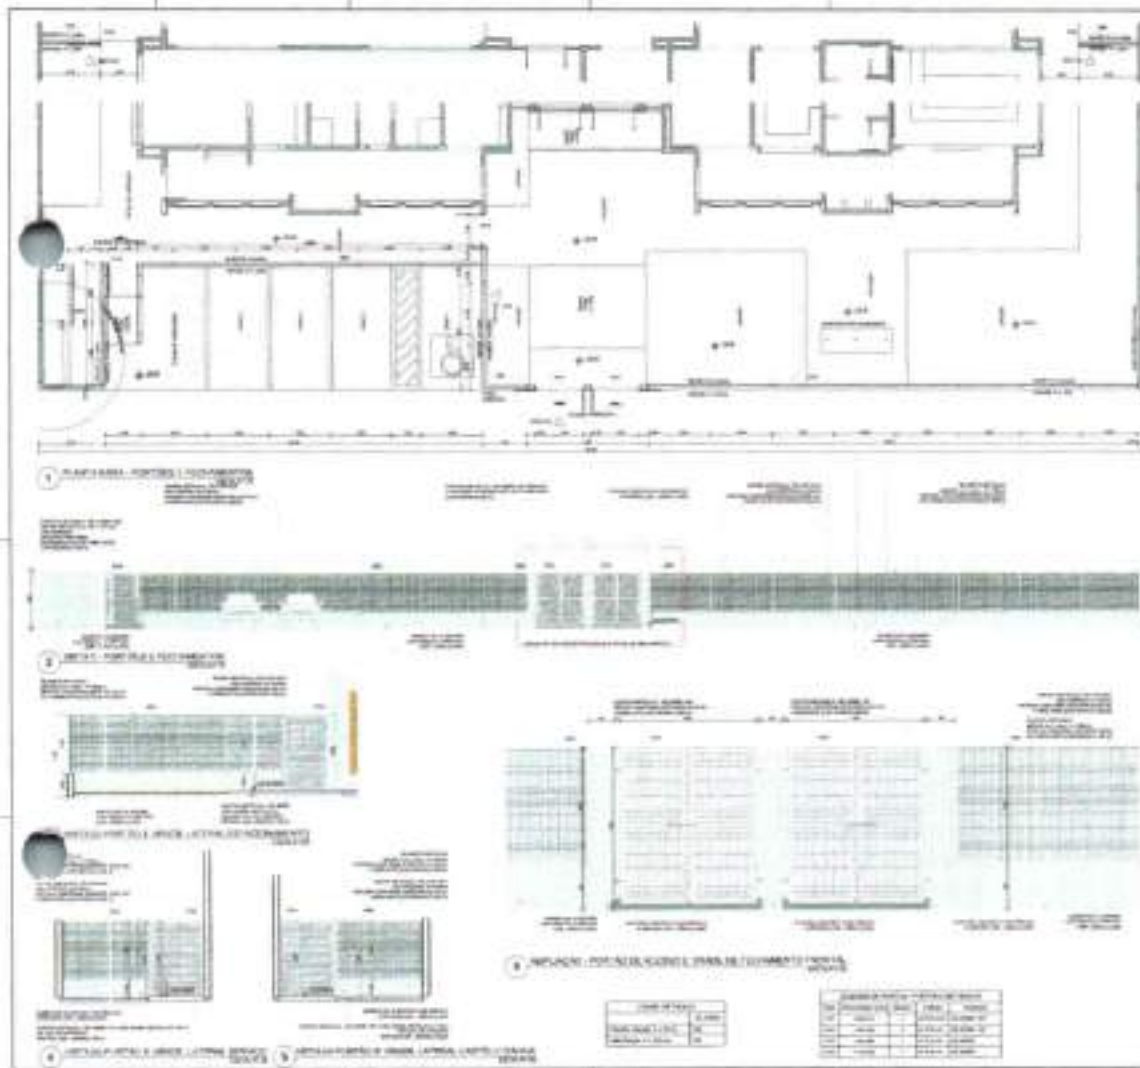




[illegible]

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 885
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 885
SEM EFEITO
RUBRICA

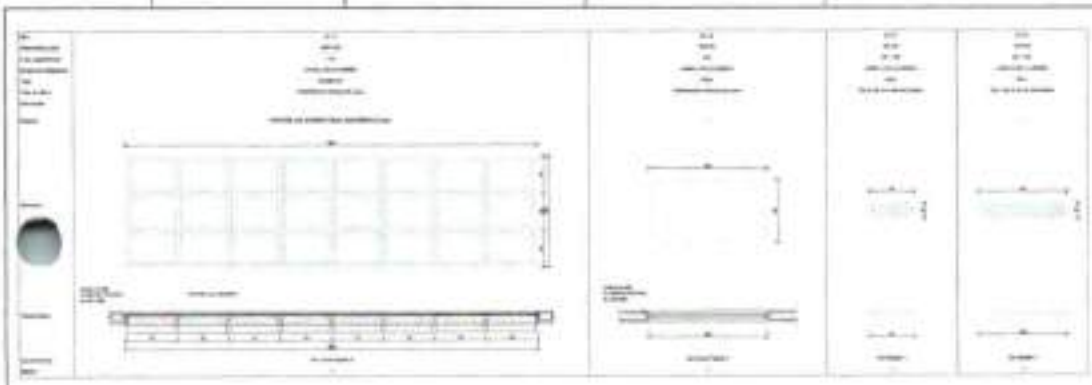

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

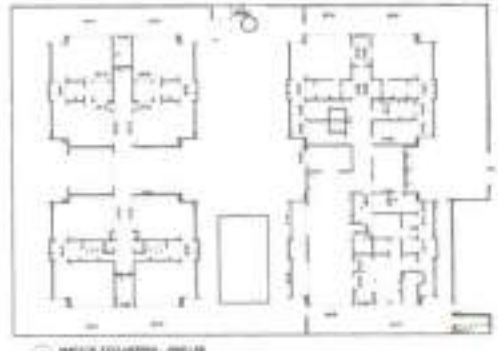

FADE UNIVERSIDADE EDUCAR

PROJETO PADRÃO - TICO

SAMUEL PAIVA OLIVEIRA

PORTARIA 157 2025

CREA CE 379384

ARQ

The architectural drawings include five detailed floor plans of individual classrooms or small units, each showing furniture placement like desks and chairs. There are also two larger longitudinal sections showing the internal layout and structural elements of longer rooms. At the bottom center is a large site plan showing the overall footprint of the building complex, including multiple interconnected structures and surrounding areas. To the right of the drawings is a technical specification table detailing materials and construction methods for various parts of the building, such as walls, floors, roofs, and doors. The table includes columns for item number, description, quantity, and unit. Below the table is a section for project information, including the name of the institution (FADE - Fundação de Amparo à Educação), the project title (Projeto Pedagógico - PPE), and the names of the architect and engineer. A stamp from the State Office of Education (SEEDUC) is visible, along with a signature and date.


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 887
RUBRICA

PROJETO PADRÃO - FIDE
 UNIDADE FME BICCA 1901
 PROJETO DE ARQUITETURA
 15/04/2024

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL No 889
RUBRICA

[illegible]



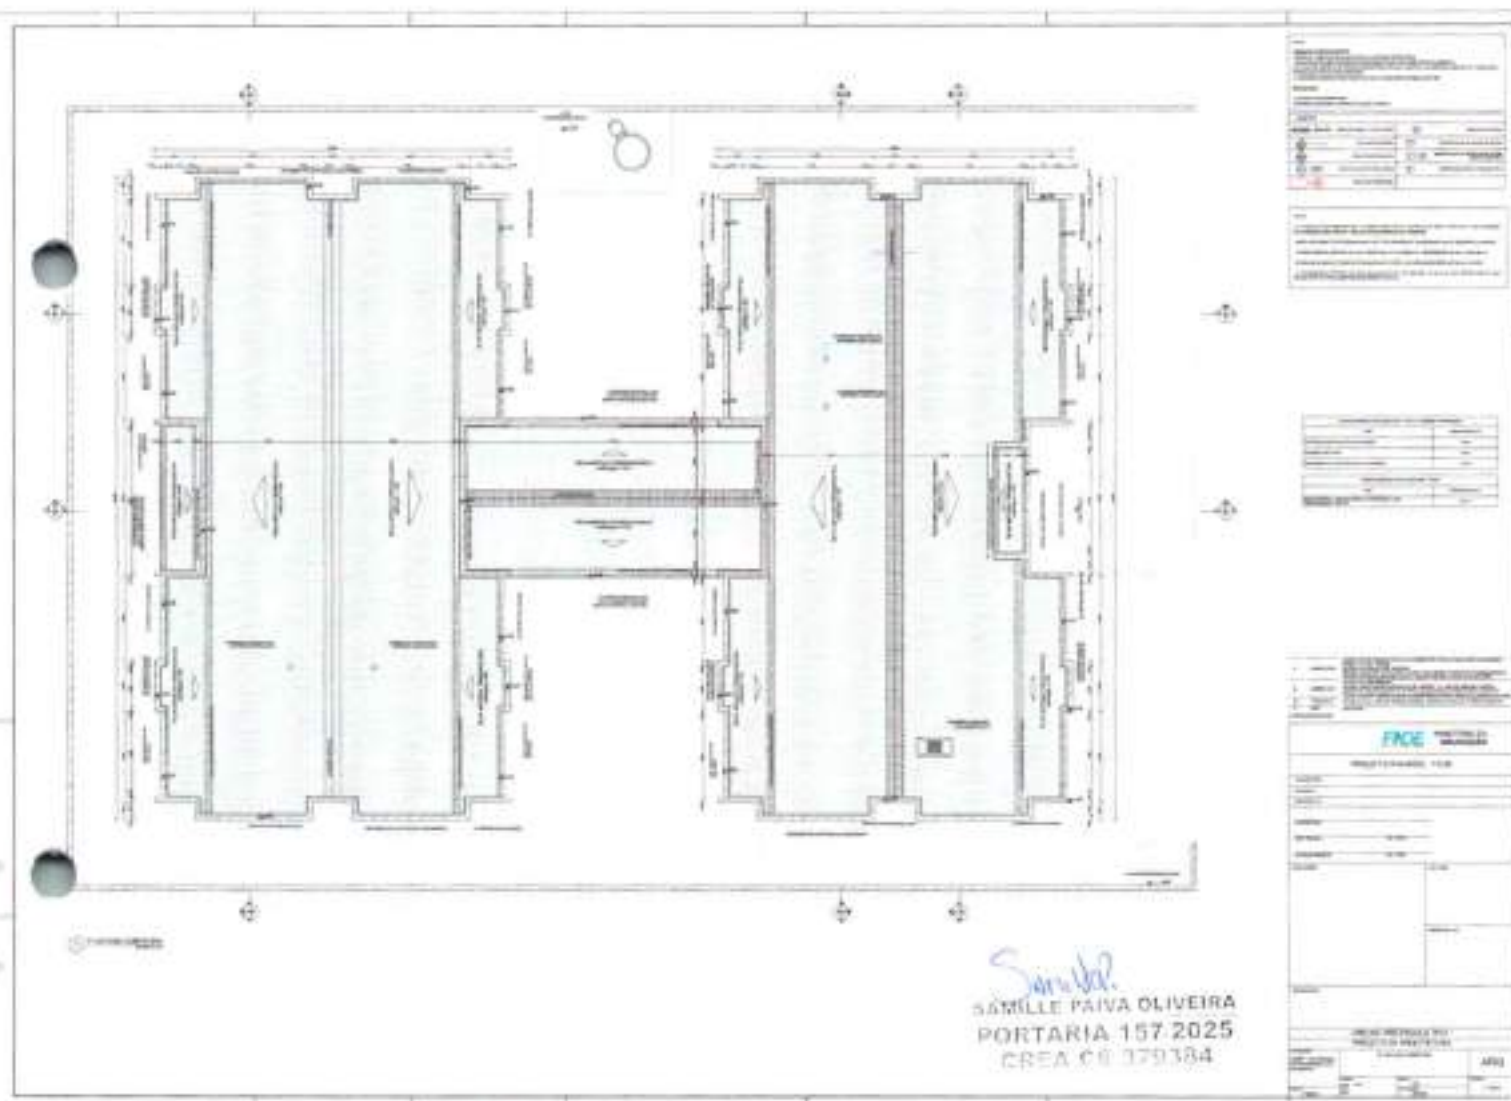

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. Nº 893
SEM EFEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. Nº 893
RUBRICA




TÍTULO	
AUTOR	
DATA	
LUGAR	
PROJETO	
FOLHA	
TOTAL	

TÍTULO	
AUTOR	
DATA	
LUGAR	
PROJETO	
FOLHA	
TOTAL	

TÍTULO	
AUTOR	
DATA	
LUGAR	
PROJETO	
FOLHA	
TOTAL	

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº **893**
RUBRICA

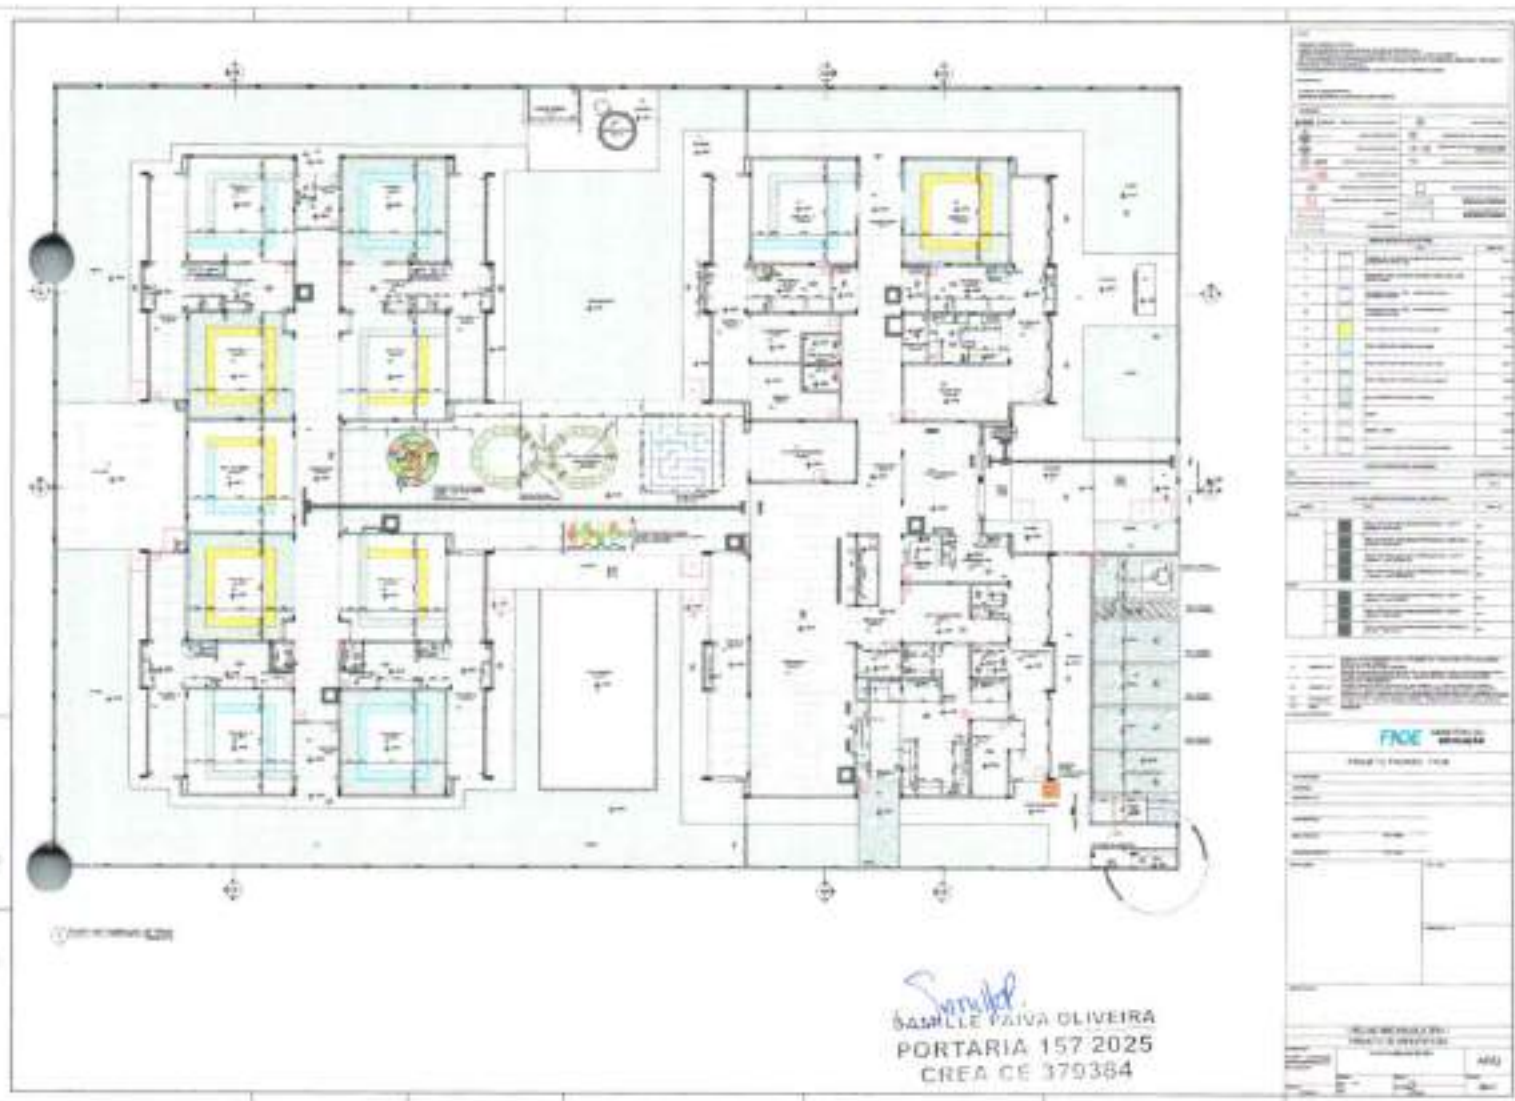

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SENTEFEITO
RUBRICA


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº **895**
RUBRICA



S. Paiva
ANILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº 897
 RUBRICA

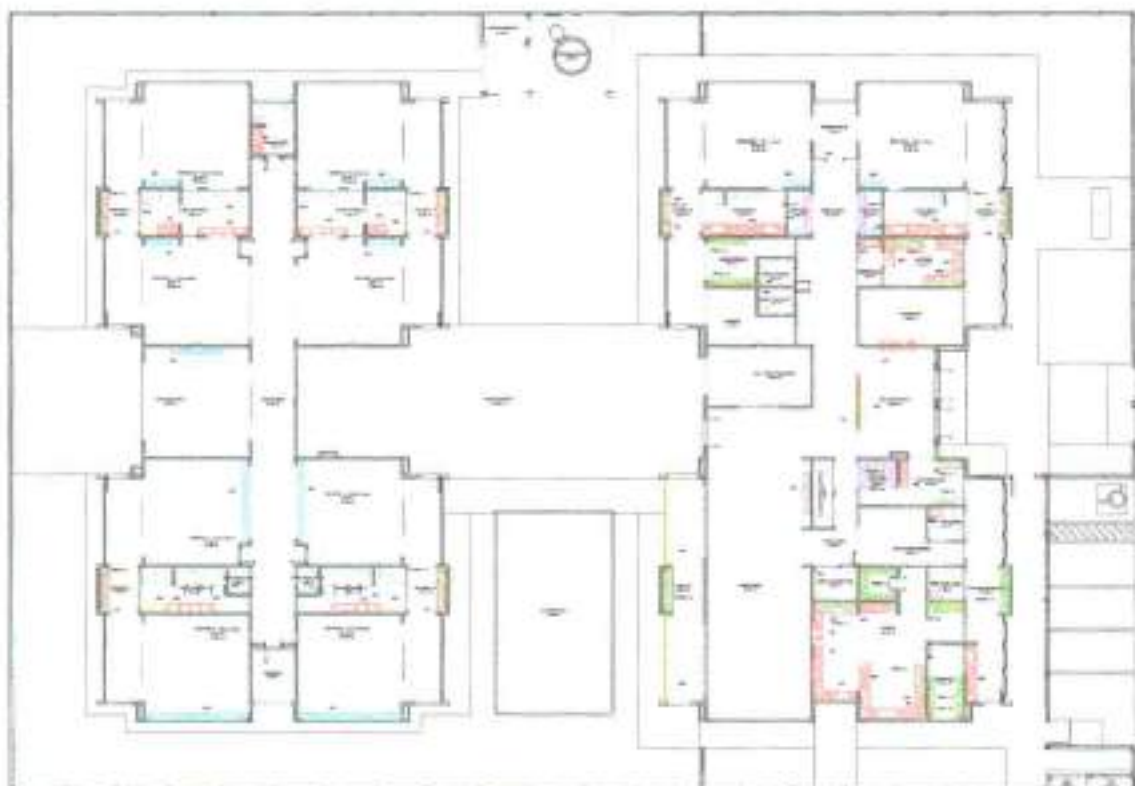

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...

Sami K.
 SAMILE FAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CREA CE 379384

FACE FICHA DE PREÇOS PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL	
NOME ENDEREÇO CIDADE ESTADO CEP	DATA VALOR VALOR
ASSINATURA RUBRICA	

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
419
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 898
RUBRICA



TÍTULO		PROJETO	
AUTOR		PROJETO	
DATA		PROJETO	
LOCAL		PROJETO	
OBJETO		PROJETO	
FOLHA		PROJETO	
TOTAL		PROJETO	

SAMUEL PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

TÍTULO		PROJETO	
AUTOR		PROJETO	
DATA		PROJETO	
LOCAL		PROJETO	
OBJETO		PROJETO	
FOLHA		PROJETO	
TOTAL		PROJETO	

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FIM
SEM EFEITO
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº 399
 RUBRICA



Samuel
 SAMUEL ALVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157-2025
 CREA CE 379384

TÍTULO		PROPOSTA DE REFORMA DE PLANEJAMENTO	
AUTOR		SANTO AMARAL	
DATA		15/05/2025	
LOCAL		CAMPUS	
OBJETIVO		REFORMA DE PLANEJAMENTO	
STATUS		EM ANÁLISE	

TÍTULO		PROPOSTA DE REFORMA DE PLANEJAMENTO	
AUTOR		SANTO AMARAL	
DATA		15/05/2025	
LOCAL		CAMPUS	
OBJETIVO		REFORMA DE PLANEJAMENTO	
STATUS		EM ANÁLISE	


Item	Descrição	Valor	Observações
1	Material de consumo	100,00	
2	Manutenção de equipamentos	200,00	
3	Aluguel de espaço	500,00	
4	Salários	1000,00	
5	Outros	50,00	
Total		1850,00	

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 900
RUBRICA

1. **NAME** _____
 2. **DATE** _____
 3. **TIME** _____
 4. **LOCATION** _____
 5. **REASON** _____
 6. **REMARKS** _____
 7. **SIGNATURE** _____
 8. **DATE** _____
 9. **TIME** _____
 10. **LOCATION** _____
 11. **REASON** _____
 12. **REMARKS** _____
 13. **SIGNATURE** _____
 14. **DATE** _____
 15. **TIME** _____
 16. **LOCATION** _____
 17. **REASON** _____
 18. **REMARKS** _____
 19. **SIGNATURE** _____
 20. **DATE** _____
 21. **TIME** _____
 22. **LOCATION** _____
 23. **REASON** _____
 24. **REMARKS** _____
 25. **SIGNATURE** _____
 26. **DATE** _____
 27. **TIME** _____
 28. **LOCATION** _____
 29. **REASON** _____
 30. **REMARKS** _____
 31. **SIGNATURE** _____
 32. **DATE** _____
 33. **TIME** _____
 34. **LOCATION** _____
 35. **REASON** _____
 36. **REMARKS** _____
 37. **SIGNATURE** _____
 38. **DATE** _____
 39. **TIME** _____
 40. **LOCATION** _____
 41. **REASON** _____
 42. **REMARKS** _____
 43. **SIGNATURE** _____
 44. **DATE** _____
 45. **TIME** _____
 46. **LOCATION** _____
 47. **REASON** _____
 48. **REMARKS** _____
 49. **SIGNATURE** _____
 50. **DATE** _____
 51. **TIME** _____
 52. **LOCATION** _____
 53. **REASON** _____
 54. **REMARKS** _____
 55. **SIGNATURE** _____
 56. **DATE** _____
 57. **TIME** _____
 58. **LOCATION** _____
 59. **REASON** _____
 60. **REMARKS** _____
 61. **SIGNATURE** _____
 62. **DATE** _____
 63. **TIME** _____
 64. **LOCATION** _____
 65. **REASON** _____
 66. **REMARKS** _____
 67. **SIGNATURE** _____
 68. **DATE** _____
 69. **TIME** _____
 70. **LOCATION** _____
 71. **REASON** _____
 72. **REMARKS** _____
 73. **SIGNATURE** _____
 74. **DATE** _____
 75. **TIME** _____
 76. **LOCATION** _____
 77. **REASON** _____
 78. **REMARKS** _____
 79. **SIGNATURE** _____
 80. **DATE** _____
 81. **TIME** _____
 82. **LOCATION** _____
 83. **REASON** _____
 84. **REMARKS** _____
 85. **SIGNATURE** _____
 86. **DATE** _____
 87. **TIME** _____
 88. **LOCATION** _____
 89. **REASON** _____
 90. **REMARKS** _____
 91. **SIGNATURE** _____
 92. **DATE** _____
 93. **TIME** _____
 94. **LOCATION** _____
 95. **REASON** _____
 96. **REMARKS** _____
 97. **SIGNATURE** _____
 98. **DATE** _____
 99. **TIME** _____
 100. **LOCATION** _____
 101. **REASON** _____
 102. **REMARKS** _____
 103. **SIGNATURE** _____
 104. **DATE** _____
 105. **TIME** _____
 106. **LOCATION** _____
 107. **REASON** _____
 108. **REMARKS** _____
 109. **SIGNATURE** _____
 110. **DATE** _____
 111. **TIME** _____
 112. **LOCATION** _____
 113. **REASON** _____
 114. **REMARKS** _____
 115. **SIGNATURE** _____
 116. **DATE** _____
 117. **TIME** _____
 118. **LOCATION** _____
 119. **REASON** _____
 120. **REMARKS** _____
 121. **SIGNATURE** _____
 122. **DATE** _____
 123. **TIME** _____
 124. **LOCATION** _____
 125. **REASON** _____
 126. **REMARKS** _____
 127. **SIGNATURE** _____
 128. **DATE** _____
 129. **TIME** _____
 130. **LOCATION** _____
 131. **REASON** _____
 132. **REMARKS** _____
 133. **SIGNATURE** _____
 134. **DATE** _____
 135. **TIME** _____
 136. **LOCATION** _____
 137. **REASON** _____
 138. **REMARKS** _____
 139. **SIGNATURE** _____
 140. **DATE** _____
 141. **TIME** _____
 142. **LOCATION** _____
 143. **REASON** _____
 144. **REMARKS** _____
 145. **SIGNATURE** _____
 146. **DATE** _____
 147. **TIME** _____
 148. **LOCATION** _____
 149. **REASON** _____
 150. **REMARKS** _____
 151. **SIGNATURE** _____
 152. **DATE** _____
 153. **TIME** _____
 154. **LOCATION** _____
 155. **REASON** _____
 156. **REMARKS** _____
 157. **SIGNATURE** _____
 158. **DATE** _____
 159. **TIME** _____
 160. **LOCATION** _____
 161. **REASON** _____
 162. **REMARKS** _____
 163. **SIGNATURE** _____
 164. **DATE** _____
 165. **TIME** _____
 166. **LOCATION** _____
 167. **REASON** _____
 168. **REMARKS** _____
 169. **SIGNATURE** _____
 170. **DATE** _____
 171. **TIME** _____
 172. **LOCATION** _____
 173. **REASON** _____
 174. **REMARKS** _____
 175. **SIGNATURE** _____
 176. **DATE** _____
 177. **TIME** _____
 178. **LOCATION** _____
 179. **REASON** _____
 180. **REMARKS** _____
 181. **SIGNATURE** _____
 182. **DATE** _____
 183. **TIME** _____
 184. **LOCATION** _____
 185. **REASON** _____
 186. **REMARKS** _____
 187. **SIGNATURE** _____
 188. **DATE** _____
 189. **TIME** _____
 190. **LOCATION** _____
 191. **REASON** _____
 192. **REMARKS** _____
 193. **SIGNATURE** _____
 194. **DATE** _____
 195. **TIME** _____
 196. **LOCATION** _____
 197. **REASON** _____
 198. **REMARKS** _____
 199. **SIGNATURE** _____
 200. **DATE** _____
 201. **TIME** _____
 202. **LOCATION** _____
 203. **REASON** _____
 204. **REMARKS** _____
 205. **SIGNATURE** _____
 206. **DATE** _____
 207. **TIME** _____
 208. **LOCATION** _____
 209. **REASON** _____
 210. **REMARKS** _____
 211. **SIGNATURE** _____
 212. **DATE** _____
 213. **TIME** _____
 214. **LOCATION** _____
 215. **REASON** _____
 216. **REMARKS** _____
 217. **SIGNATURE** _____
 218. **DATE** _____
 219. **TIME** _____
 220. **LOCATION** _____
 221. **REASON** _____
 222. **REMARKS** _____
 223. **SIGNATURE** _____
 224. **DATE** _____
 225. **TIME** _____
 2


SAMILE PAIVA OLIVEIRA
TATIANA 157 2025



The image shows a blank FICO credit report form. At the top, there is a header section with the FICO logo and the text "FICO CREDIT REPORT". Below this, there are several sections for personal information, including "PERSONAL INFORMATION", "CREDIT HISTORY", and "CREDIT SCORE". The form is designed to be filled out by a credit reporting agency, with various fields for data entry and a large section for comments or notes.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SÉM EFETO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 905
RUBRICA

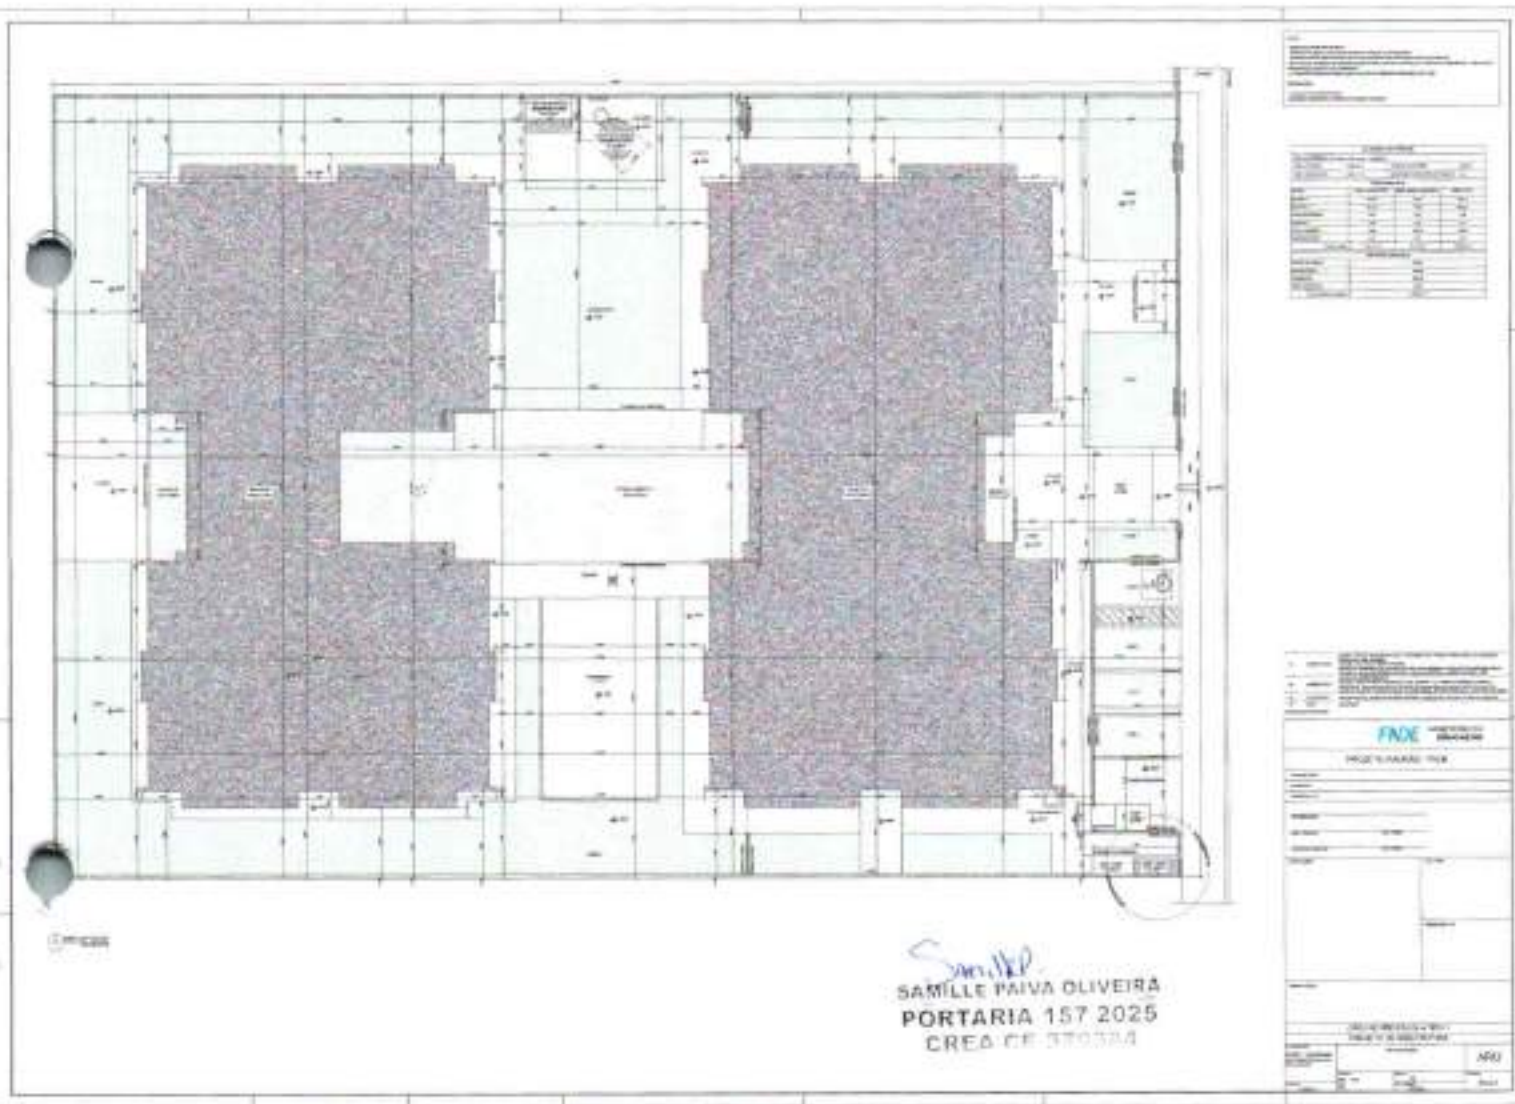

Summed

SAMUELLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

FACE www.face.com.au


www.elsevier.com/locate/jmb

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. 10
SEM EFEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
Fl. Nº 23
RUBRICA

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

Year	Number of cases	Rate per 100,000
1990	1,000	1.0
1991	1,100	1.1
1992	1,200	1.2
1993	1,300	1.3
1994	1,400	1.4
1995	1,500	1.5
1996	1,600	1.6
1997	1,700	1.7
1998	1,800	1.8
1999	1,900	1.9
2000	2,000	2.0
2001	2,100	2.1
2002	2,200	2.2
2003	2,300	2.3
2004	2,400	2.4
2005	2,500	2.5
2006	2,600	2.6
2007	2,700	2.7
2008	2,800	2.8
2009	2,900	2.9
2010	3,000	3.0
2011	3,100	3.1
2012	3,200	3.2
2013	3,300	3.3
2014	3,400	3.4
2015	3,500	3.5
2016	3,600	3.6
2017	3,700	3.7
2018	3,800	3.8
2019	3,900	3.9
2020	4,000	4.0

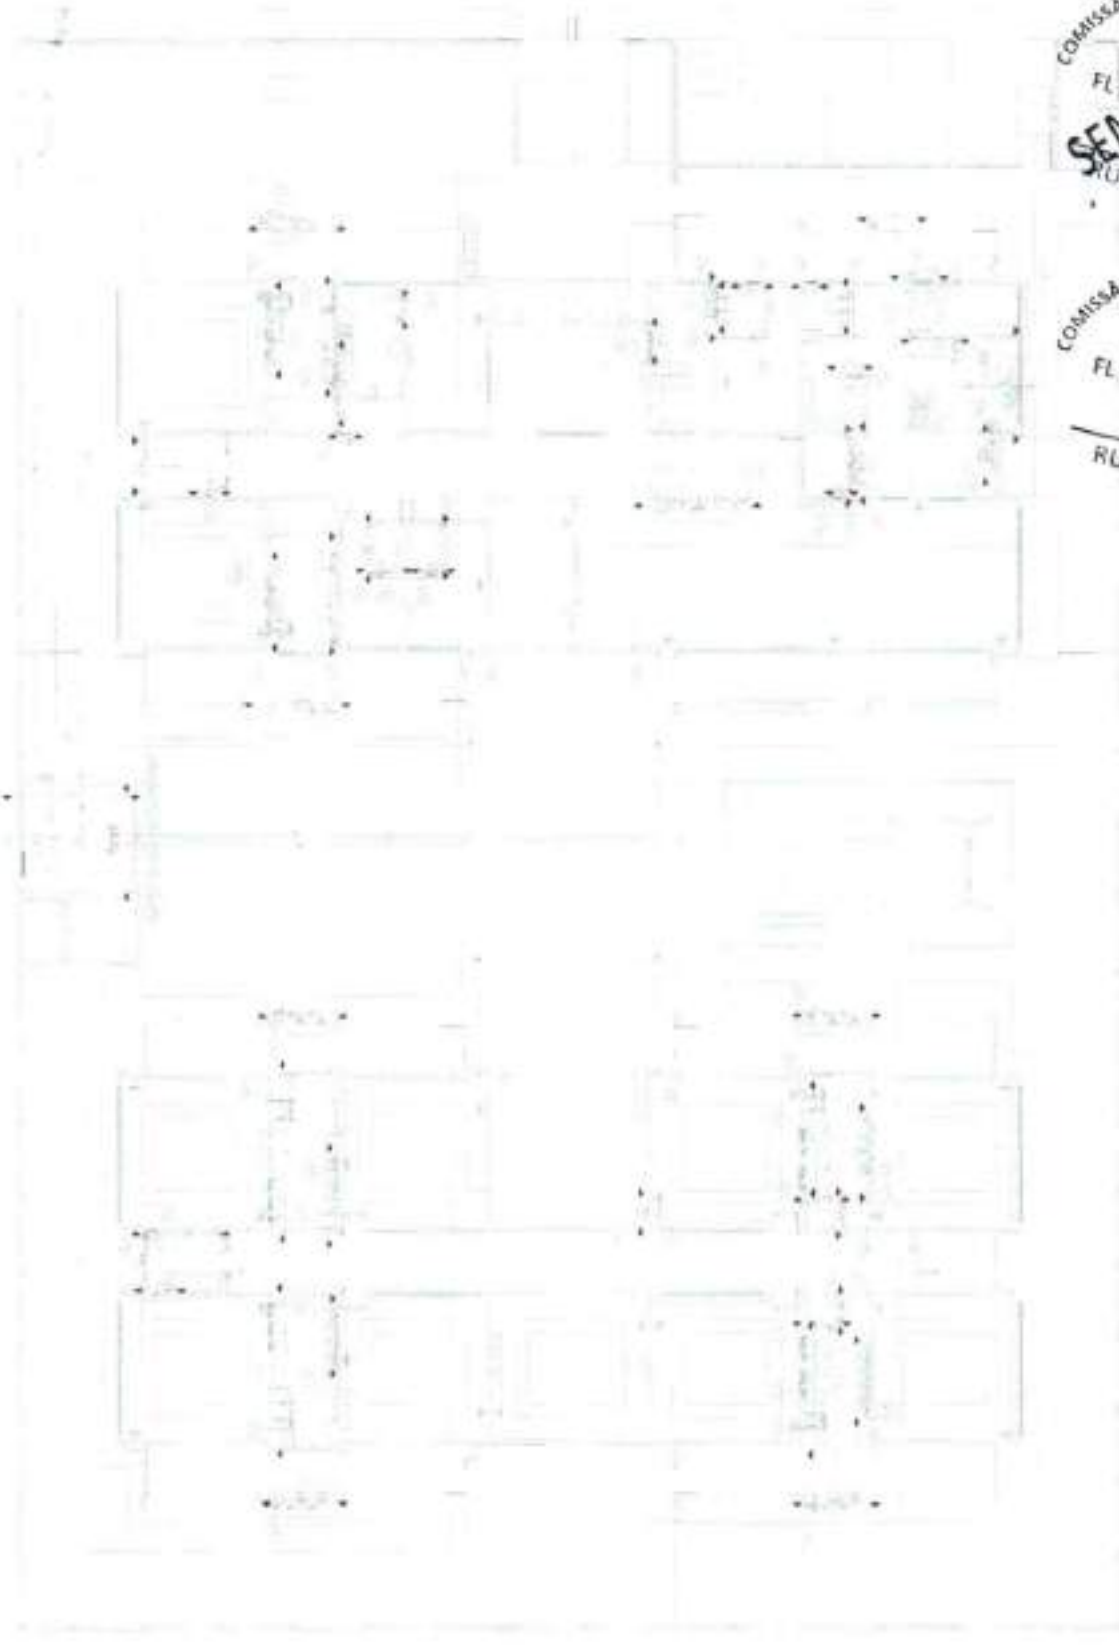

Sandra W
 SANDRA PAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CREA CE 370384

INSTITUIÇÃO: FACE PROJETO: PROJETO DE REFORMA DO PAVILÃO DE ENSINO		DATA: 15/07/2025 FOLHA: 01 DE 01	
TÍTULO: PROJETO DE REFORMA DO PAVILÃO DE ENSINO		AUTORIZAÇÃO: PROF. DR. JOÃO CARLOS	
LOCAL: AV. JOSÉ DE SOUZA, 100 - JARDIM		CÍVIL: 15/07/2025	
ESCALA: 1:50		HAF: 15/07/2025	
DATA: 15/07/2025		DATA: 15/07/2025	

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº **904**
SEM EFEITO
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº **904**
SEM EFEITO
 RUBRICA


 SAMIRLE PAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CREA CE 379384

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 1.1. NOME DO PROJETO: 1.2. NÚMERO DO PROJETO: 1.3. DATA DE INÍCIO: 1.4. DATA DE TÉRMINO: 1.5. LOCALIZAÇÃO: 1.6. OUTRAS INFORMAÇÕES:		2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETISTA 2.1. NOME DO PROJETISTA: 2.2. NÚMERO DE REGISTRO: 2.3. DATA DE REGISTRO: 2.4. OUTRAS INFORMAÇÕES:	
3. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE 3.1. NOME DO CLIENTE: 3.2. ENDEREÇO DO CLIENTE: 3.3. CIDADE/UF: 3.4. OUTRAS INFORMAÇÕES:		4. IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO 4.1. NOME DO ORÇAMENTO: 4.2. NÚMERO DO ORÇAMENTO: 4.3. DATA DO ORÇAMENTO: 4.4. OUTRAS INFORMAÇÕES:	
5. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 5.1. NOME DO PROJETO: 5.2. NÚMERO DO PROJETO: 5.3. DATA DE INÍCIO: 5.4. DATA DE TÉRMINO: 5.5. LOCALIZAÇÃO: 5.6. OUTRAS INFORMAÇÕES:		6. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETISTA 6.1. NOME DO PROJETISTA: 6.2. NÚMERO DE REGISTRO: 6.3. DATA DE REGISTRO: 6.4. OUTRAS INFORMAÇÕES:	


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL N° 905
 SEM EFEITO
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL N° 905
 RUBRICA

Família PAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CHEF CE 379384



04 2023 m.a.



04 2023 m.a.



04 2023 m.a.



04 2023 m.a.



04 2023 m.a.



04 2023 m.a.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 SEM EFEITO
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 SEM EFEITO
 RUBRICA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 3. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 4. IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIADOR 5. IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR 6. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR 7. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL FISCAL 9. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO 10. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DE OUTROS		11. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 12. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 13. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 14. IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIADOR 15. IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR 16. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR 17. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 18. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL FISCAL 19. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO 20. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DE OUTROS	
21. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 22. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 23. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 24. IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIADOR 25. IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR 26. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR 27. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 28. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL FISCAL 29. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO 30. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DE OUTROS		31. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 32. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 33. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 34. IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIADOR 35. IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR 36. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR 37. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 38. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL FISCAL 39. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO 40. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DE OUTROS	
41. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 42. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 43. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 44. IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIADOR 45. IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR 46. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR 47. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 48. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL FISCAL 49. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO 50. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DE OUTROS		51. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 52. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 53. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 54. IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIADOR 55. IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR 56. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR 57. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 58. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL FISCAL 59. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO 60. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DE OUTROS	
61. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 62. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 63. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 64. IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIADOR 65. IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR 66. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR 67. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 68. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL FISCAL 69. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO 70. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DE OUTROS		71. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 72. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 73. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 74. IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIADOR 75. IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR 76. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR 77. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 78. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL FISCAL 79. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO 80. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DE OUTROS	
81. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 82. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 83. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 84. IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIADOR 85. IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR 86. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR 87. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 88. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL FISCAL 89. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO 90. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DE OUTROS		91. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 92. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 93. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 94. IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIADOR 95. IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR 96. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR 97. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 98. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL FISCAL 99. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO 100. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DE OUTROS	

Saml.
SAMILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

NAME _____

businesses and
individuals

Journal of Management Education 34(1)

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

FL Nº _____

SEM EFEITO

RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 007
RUBRICA

Samir
 SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CREA CE 379384

Nº _____ DATA _____ LOCAL _____	
PROJETO: _____ FASE: _____ FOLHA: _____ DE _____	
AUTORIZAÇÃO: _____ DATA: _____	
OBSERVAÇÃO: _____ DATA: _____	
ASSINATURA: _____ DATA: _____	
RUBRICA: _____ DATA: _____	

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 EM
SEM EFEITO
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FLNº 908
 RUBRICA





034 05.14.08 001 00

034 05.14.08 001 00



034 05.14.08 001 00

034 05.14.08 001 00


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 001
SEM EFEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 001
SEM EFEITO
RUBRICA

Samille
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETISTA
3. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE	4. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL
5. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	6. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
7. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	8. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
9. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	10. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
11. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	12. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
13. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	14. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
15. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	16. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
17. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	18. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
19. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	20. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
21. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	22. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
23. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	24. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
25. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	26. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
27. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	28. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
29. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	30. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
31. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	32. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
33. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	34. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
35. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	36. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
37. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	38. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
39. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	40. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
41. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	42. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
43. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	44. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
45. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	46. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
47. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	48. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
49. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	50. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
51. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	52. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
53. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	54. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
55. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	56. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
57. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	58. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
59. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	60. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
61. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	62. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
63. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	64. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
65. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	66. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
67. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	68. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
69. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	70. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
71. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	72. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
73. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	74. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
75. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	76. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
77. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	78. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
79. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	80. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
81. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	82. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
83. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	84. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
85. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	86. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
87. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	88. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
89. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	90. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
91. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	92. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
93. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	94. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
95. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	96. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
97. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	98. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
99. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	100. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO


 SAMUEL PAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157/2025
 CREA CE 379384

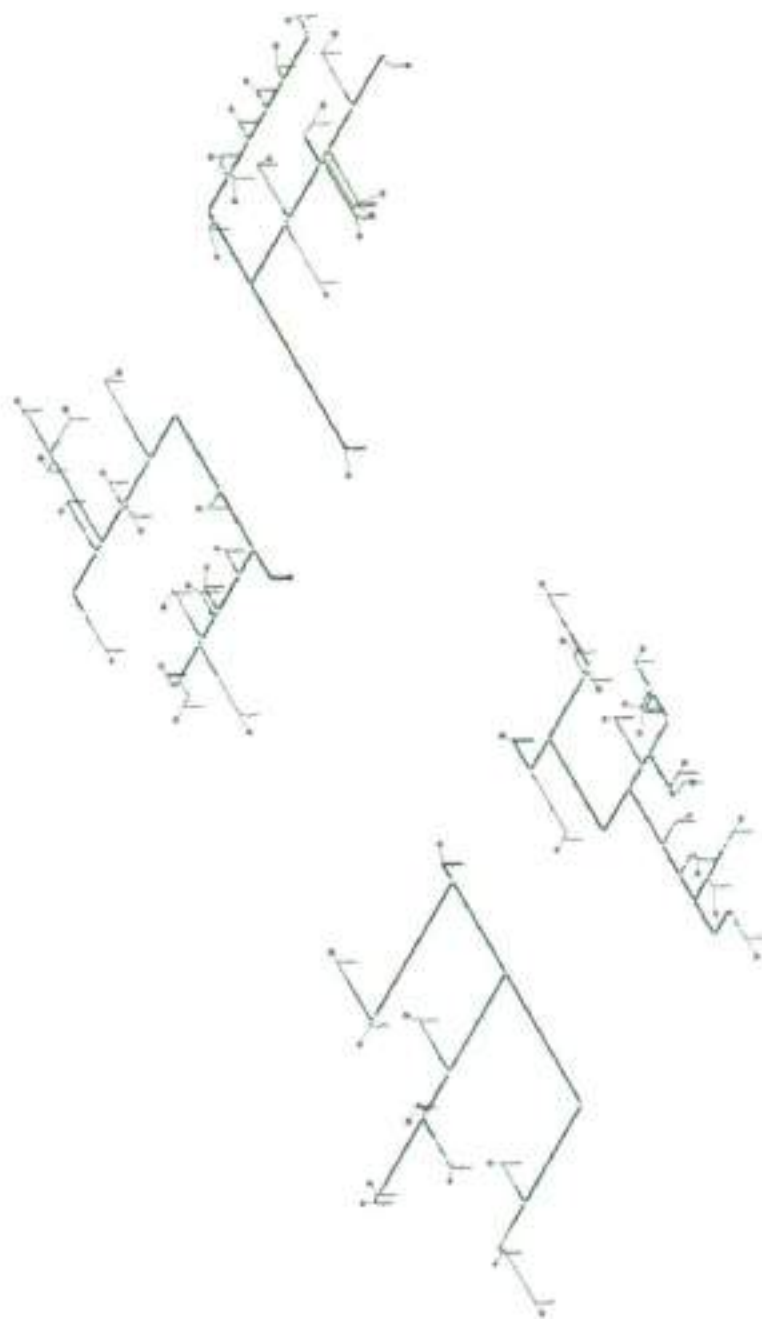


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 EL Nº 912
SEM EFEITO
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº 912
 RUBRICA

Data: 27/04/2025
 Assinatura:

1. Nome do Autor: _____ 2. Nome do Revisor: _____ 3. Data de Emissão: _____ 4. Data de Revisão: _____ 5. Data de Aprovação: _____ 6. Data de Cancelamento: _____ 7. Data de Vigência: _____ 8. Data de Revogação: _____ 9. Data de Retirada: _____ 10. Data de Arquivamento: _____		11. Nome do Autor: _____ 12. Nome do Revisor: _____ 13. Data de Emissão: _____ 14. Data de Revisão: _____ 15. Data de Aprovação: _____ 16. Data de Cancelamento: _____ 17. Data de Vigência: _____ 18. Data de Revogação: _____ 19. Data de Retirada: _____ 20. Data de Arquivamento: _____
21. Nome do Autor: _____ 22. Nome do Revisor: _____ 23. Data de Emissão: _____ 24. Data de Revisão: _____ 25. Data de Aprovação: _____ 26. Data de Cancelamento: _____ 27. Data de Vigência: _____ 28. Data de Revogação: _____ 29. Data de Retirada: _____ 30. Data de Arquivamento: _____		31. Nome do Autor: _____ 32. Nome do Revisor: _____ 33. Data de Emissão: _____ 34. Data de Revisão: _____ 35. Data de Aprovação: _____ 36. Data de Cancelamento: _____ 37. Data de Vigência: _____ 38. Data de Revogação: _____ 39. Data de Retirada: _____ 40. Data de Arquivamento: _____

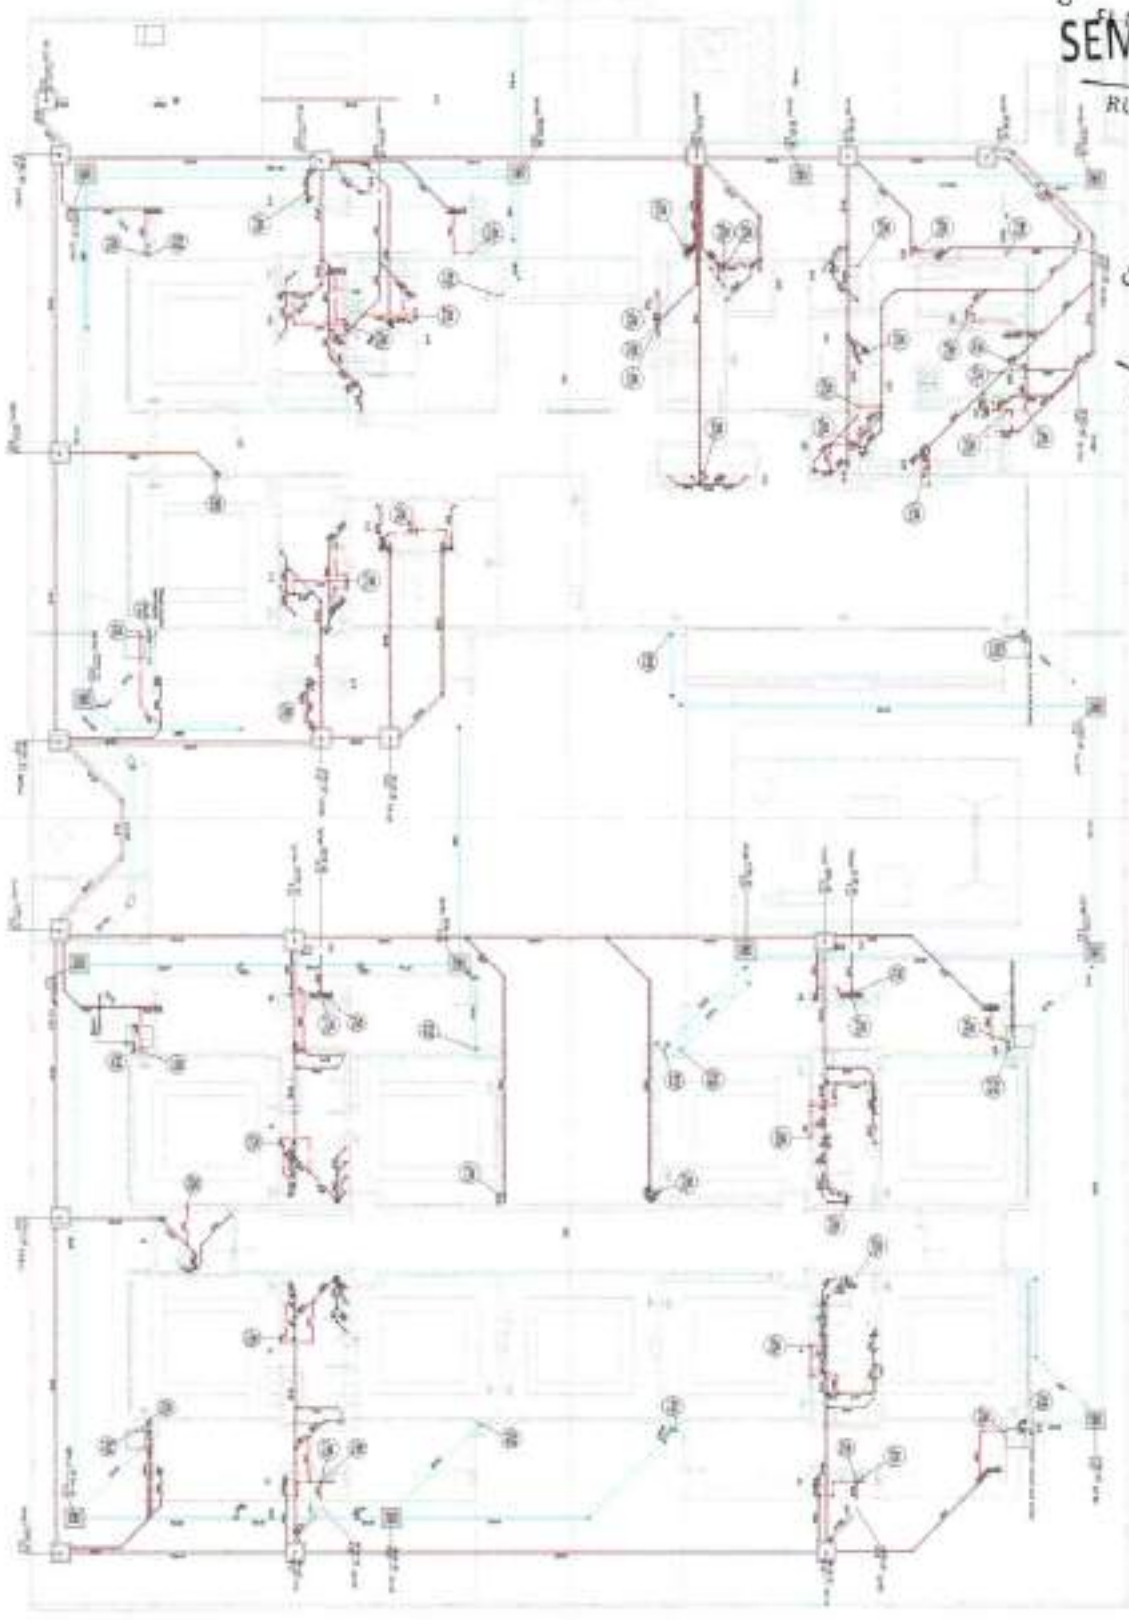

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----


 SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CREA CE 379384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

FASE
 PROJETOS PAISSAO - FASE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 SEM EFEITO
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº 572
 RUBRICA

1. Information 2. Analysis 3. Conclusion 4. Recommendation		5. Summary 6. Conclusion 7. Recommendation
---	--	---


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

SAMUELLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

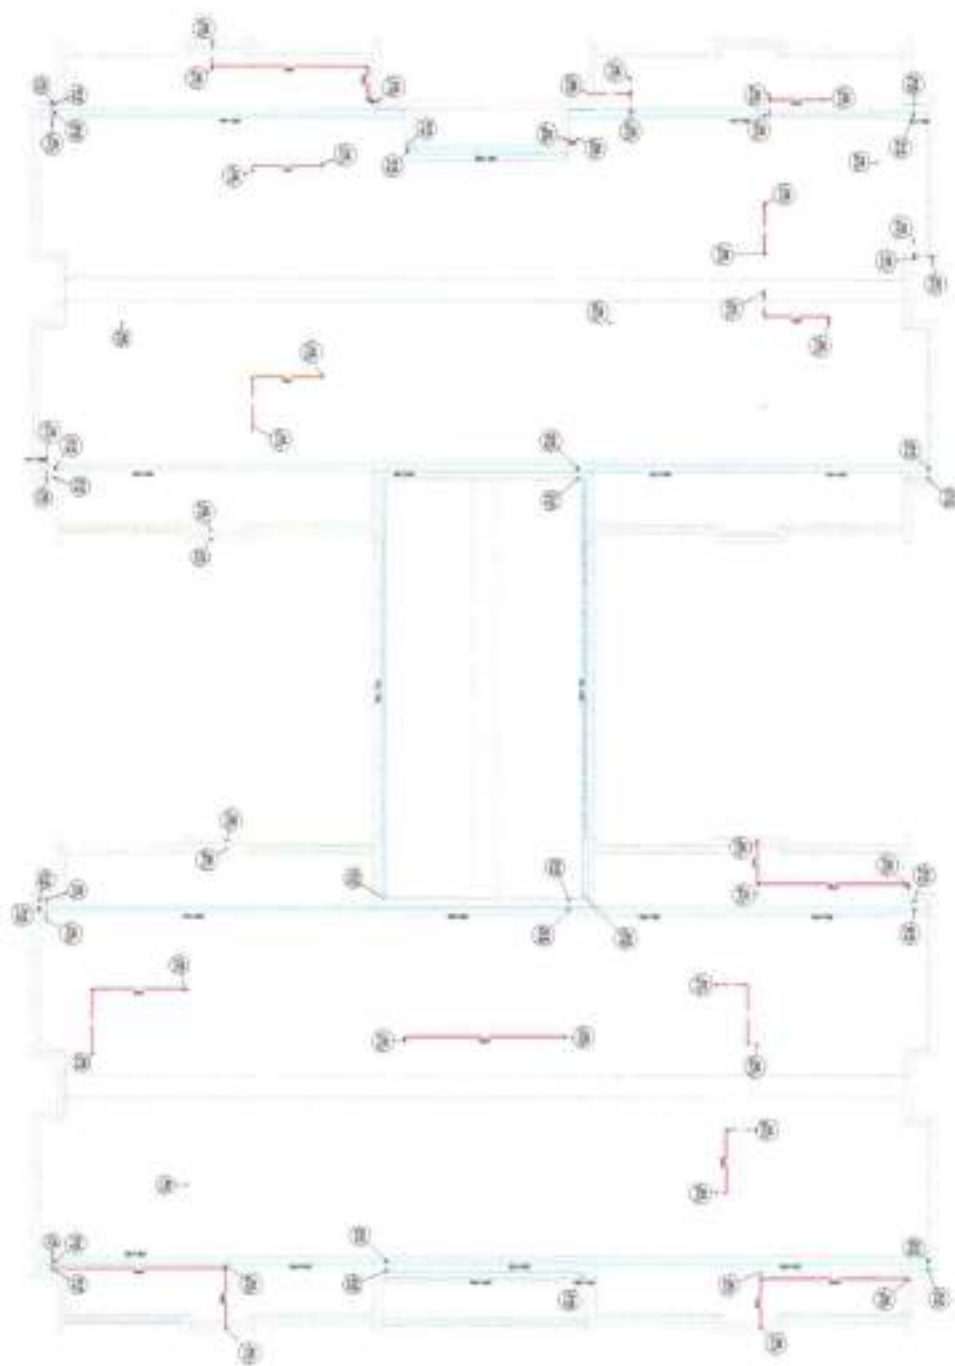[illegible]

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 918
RUBRICA

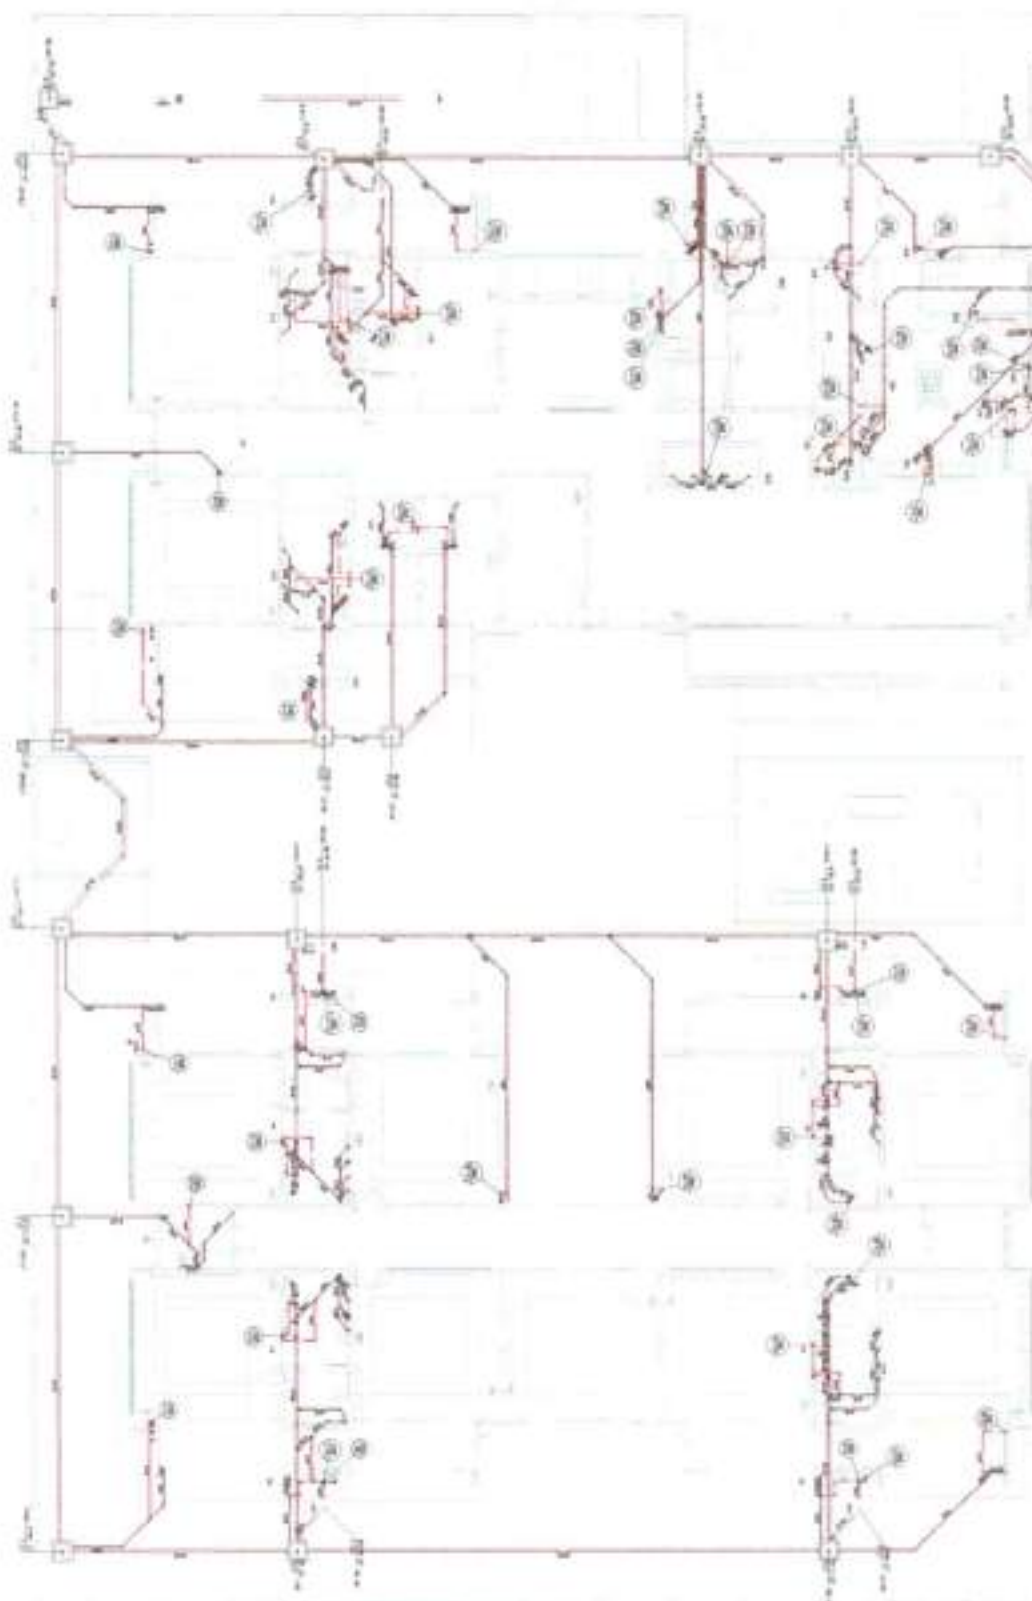

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. Nº 919
RUBRICA

1. *Journal of the American Medical Association*, 1998; 280: 1001-1005.

[illegible][illegible]

SAMILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA CE 379304

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº 954
 RUBRICA

FOLHA Nº 1 DE 1	
TÍTULO: PLANO DE MANUTENÇÃO	
PROJETO: REFORMA DO PAVILÃO DE ESPORTES	
LOCAL: PRAÇA DE ALFENES	
DATA: 15/03/2025	
AUTOR: SAMUEL PAIVA OLIVEIRA	
APROVADO: _____	
OBSERVAÇÕES:	



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Material de construção	100	10,00	1.000,00
2	Mano de obra	200	5,00	1.000,00
3	Transporte	50	2,00	1.000,00
4	Outros materiais	10	1,00	10,00
5	Subtotal			4.010,00



SAMUEL PAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CREA CE 370384

PROPOSTA DE EMENDA

Projeto de Lei nº 100/2025

Assunto: []

Assinatura: []

Data: []

PROPOSTA DE EMENDA

Projeto de Lei nº 100/2025

Assunto: []

Assinatura: []

Data: []

PROPOSTA DE EMENDA

Projeto de Lei nº 100/2025

Assunto: []

Assinatura: []

Data: []

PROPOSTA DE EMENDA

Projeto de Lei nº 100/2025

Assunto: []

Assinatura: []

Data: []

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

FL Nº 100

SEM EFEITO


RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

FL Nº 100

SEM EFEITO

RUBRICA

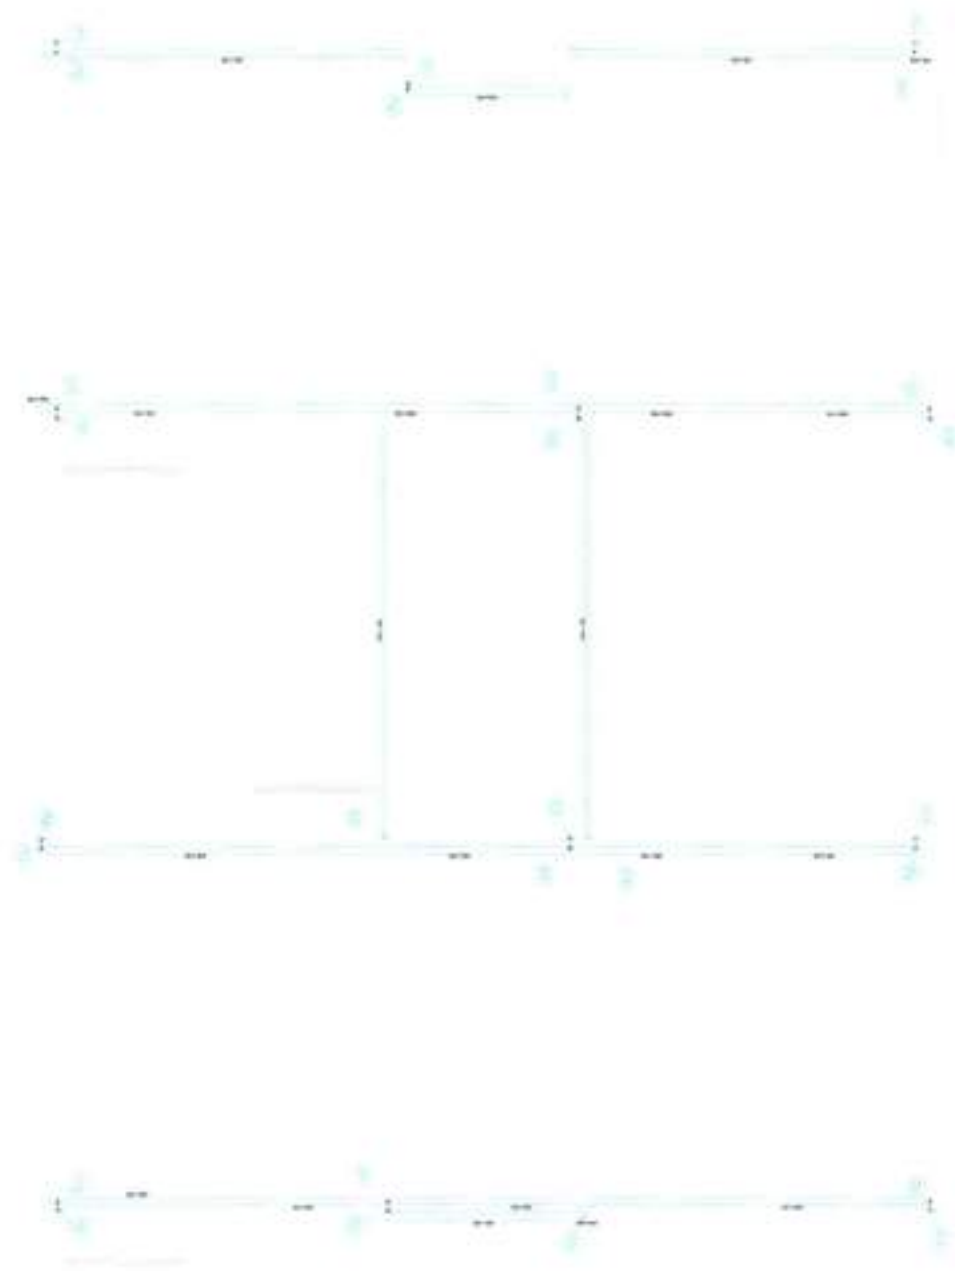

PROPOSTA DE EMENDA

SAMUEL PAIVA OLIVEIRA

PORTARIA 157 2025

CREA CE 379384


CREA 379384
 1. NOME DO PROJETO
 2. NOME DO PROJETISTA
 3. NOME DO CLIENTE
 4. DATA DE EMISSÃO
 5. VALOR DO SERVIÇO

6. VALOR DO IMPOSTO DE SELA
 7. VALOR DO IMPOSTO DE REGISTRO
 8. VALOR DO IMPOSTO DE TRANSFERÊNCIA


9. VALOR DO IMPOSTO DE SELA
 10. VALOR DO IMPOSTO DE REGISTRO
 11. VALOR DO IMPOSTO DE TRANSFERÊNCIA
 12. VALOR DO IMPOSTO DE SELA
 13. VALOR DO IMPOSTO DE REGISTRO
 14. VALOR DO IMPOSTO DE TRANSFERÊNCIA
 15. VALOR DO IMPOSTO DE SELA
 16. VALOR DO IMPOSTO DE REGISTRO
 17. VALOR DO IMPOSTO DE TRANSFERÊNCIA
 18. VALOR DO IMPOSTO DE SELA
 19. VALOR DO IMPOSTO DE REGISTRO
 20. VALOR DO IMPOSTO DE TRANSFERÊNCIA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 SEMEPEITO
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº 994
 RUBRICA

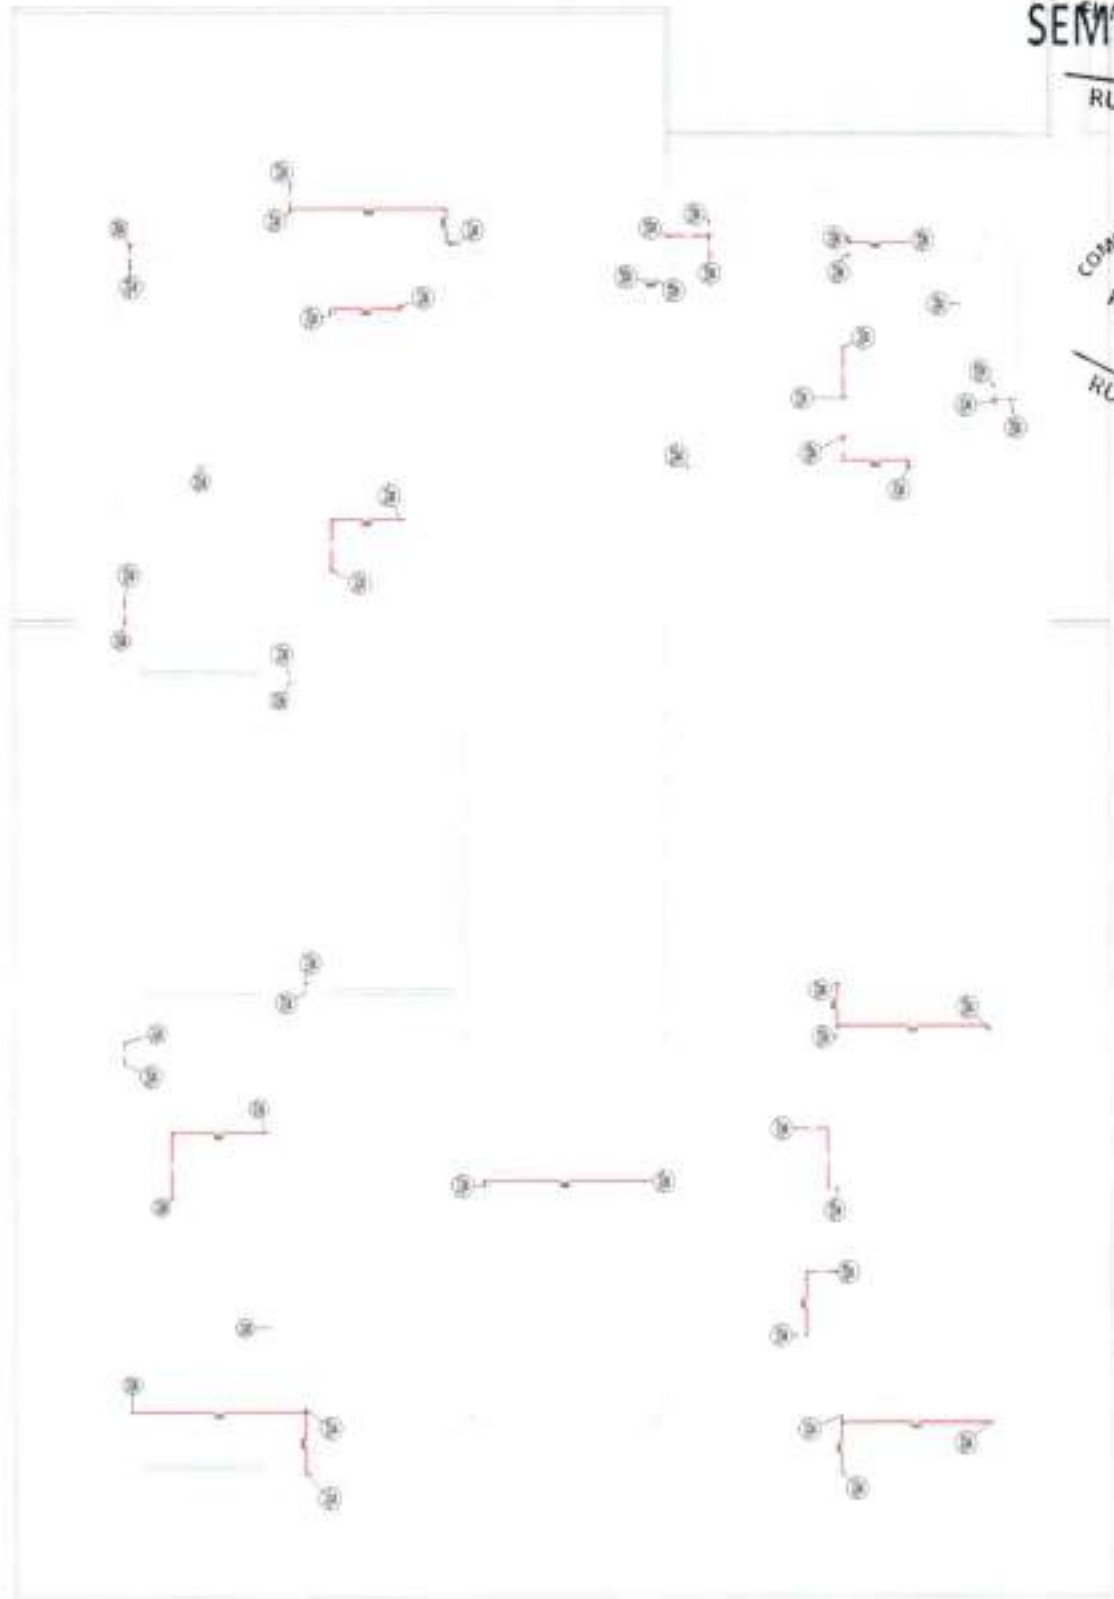

SÁBILE PAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CREA CE 379384

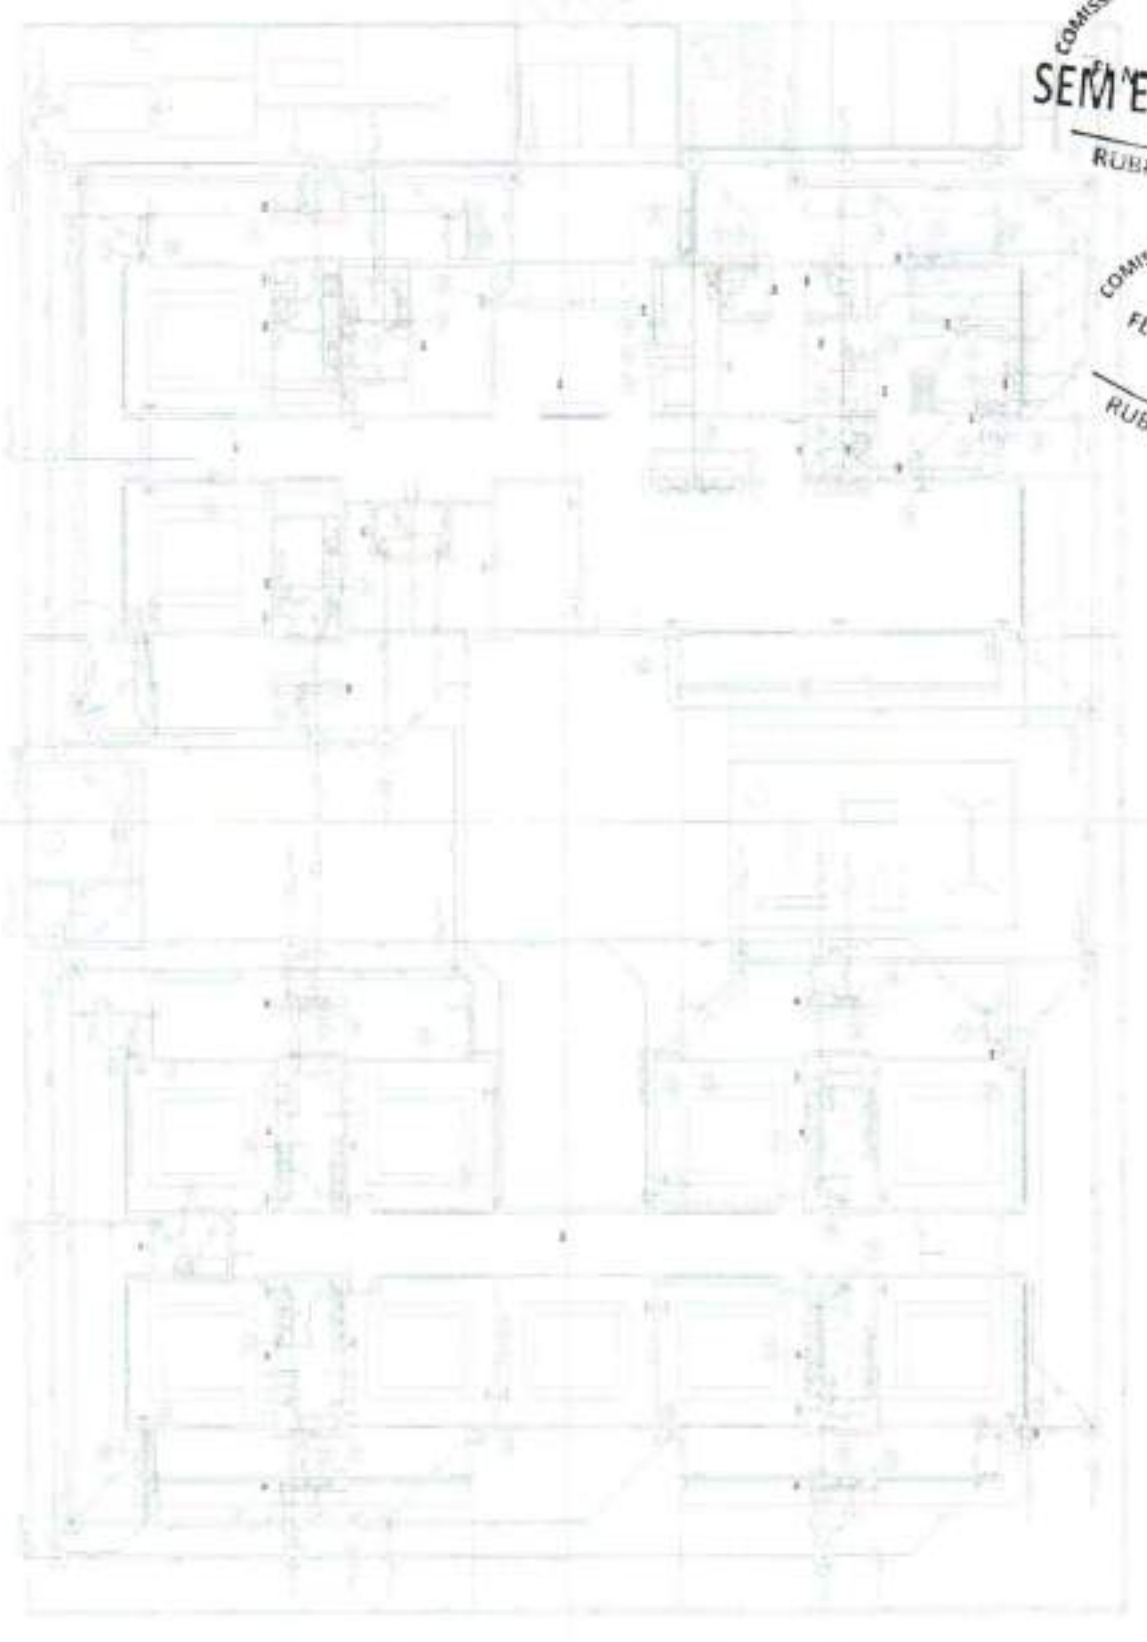

Samir
 SAMIR FAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CREA CE 379384

1. NOME DO PROJETO: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO DE ALUGUELOS	
2. ENDEREÇO: RUA DA PÁTRIA, Nº 1.000, JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP	
3. DATA: 15/07/2025	
4. NOME DO PROJETISTA: SAMIR FAIVA OLIVEIRA	
5. NÚMERO DE REGISTRO: 379384	
6. TIPO DE PROJETO: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	
7. NOME DO CLIENTE: SECRETARIA DE HABITABILIDADE	
8. ENDEREÇO DO CLIENTE: RUA DA PÁTRIA, Nº 1.000, JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP	
9. DATA DE ENTREGA: 15/07/2025	
10. NOME DO RESPONSÁVEL: SAMIR FAIVA OLIVEIRA	
11. NÚMERO DE ORÇAMENTO: 00000000	
12. NOME DO PROJETO: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO DE ALUGUELOS	
13. ENDEREÇO: RUA DA PÁTRIA, Nº 1.000, JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP	
14. DATA: 15/07/2025	
15. NOME DO PROJETISTA: SAMIR FAIVA OLIVEIRA	
16. NÚMERO DE REGISTRO: 379384	
17. TIPO DE PROJETO: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	
18. NOME DO CLIENTE: SECRETARIA DE HABITABILIDADE	
19. ENDEREÇO DO CLIENTE: RUA DA PÁTRIA, Nº 1.000, JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP	
20. DATA DE ENTREGA: 15/07/2025	
21. NOME DO RESPONSÁVEL: SAMIR FAIVA OLIVEIRA	
22. NÚMERO DE ORÇAMENTO: 00000000	

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº **978**
 RUBRICA

Santel
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379334




1. NOME DO INTERESSADO		2. ENDEREÇO	
3. NOME DO REPRESENTANTE		4. ENDEREÇO	
5. NOME DO REPRESENTANTE		6. ENDEREÇO	
7. NOME DO REPRESENTANTE		8. ENDEREÇO	
9. NOME DO REPRESENTANTE		10. ENDEREÇO	
11. NOME DO REPRESENTANTE		12. ENDEREÇO	
13. NOME DO REPRESENTANTE		14. ENDEREÇO	
15. NOME DO REPRESENTANTE		16. ENDEREÇO	
17. NOME DO REPRESENTANTE		18. ENDEREÇO	
19. NOME DO REPRESENTANTE		20. ENDEREÇO	
21. NOME DO REPRESENTANTE		22. ENDEREÇO	
23. NOME DO REPRESENTANTE		24. ENDEREÇO	
25. NOME DO REPRESENTANTE		26. ENDEREÇO	
27. NOME DO REPRESENTANTE		28. ENDEREÇO	
29. NOME DO REPRESENTANTE		30. ENDEREÇO	
31. NOME DO REPRESENTANTE		32. ENDEREÇO	
33. NOME DO REPRESENTANTE		34. ENDEREÇO	
35. NOME DO REPRESENTANTE		36. ENDEREÇO	
37. NOME DO REPRESENTANTE		38. ENDEREÇO	
39. NOME DO REPRESENTANTE		40. ENDEREÇO	
41. NOME DO REPRESENTANTE		42. ENDEREÇO	
43. NOME DO REPRESENTANTE		44. ENDEREÇO	
45. NOME DO REPRESENTANTE		46. ENDEREÇO	
47. NOME DO REPRESENTANTE		48. ENDEREÇO	
49. NOME DO REPRESENTANTE		50. ENDEREÇO	
51. NOME DO REPRESENTANTE		52. ENDEREÇO	
53. NOME DO REPRESENTANTE		54. ENDEREÇO	
55. NOME DO REPRESENTANTE		56. ENDEREÇO	
57. NOME DO REPRESENTANTE		58. ENDEREÇO	
59. NOME DO REPRESENTANTE		60. ENDEREÇO	
61. NOME DO REPRESENTANTE		62. ENDEREÇO	
63. NOME DO REPRESENTANTE		64. ENDEREÇO	
65. NOME DO REPRESENTANTE		66. ENDEREÇO	
67. NOME DO REPRESENTANTE		68. ENDEREÇO	
69. NOME DO REPRESENTANTE		70. ENDEREÇO	
71. NOME DO REPRESENTANTE		72. ENDEREÇO	
73. NOME DO REPRESENTANTE		74. ENDEREÇO	
75. NOME DO REPRESENTANTE		76. ENDEREÇO	
77. NOME DO REPRESENTANTE		78. ENDEREÇO	
79. NOME DO REPRESENTANTE		80. ENDEREÇO	
81. NOME DO REPRESENTANTE		82. ENDEREÇO	
83. NOME DO REPRESENTANTE		84. ENDEREÇO	
85. NOME DO REPRESENTANTE		86. ENDEREÇO	
87. NOME DO REPRESENTANTE		88. ENDEREÇO	
89. NOME DO REPRESENTANTE		90. ENDEREÇO	
91. NOME DO REPRESENTANTE		92. ENDEREÇO	
93. NOME DO REPRESENTANTE		94. ENDEREÇO	
95. NOME DO REPRESENTANTE		96. ENDEREÇO	
97. NOME DO REPRESENTANTE		98. ENDEREÇO	
99. NOME DO REPRESENTANTE		100. ENDEREÇO	

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
[assinatura]
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº *936*
[assinatura]
RUBRICA

SAMILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

☐ 1 NAME _____ ☐ 2 ADDRESS _____ ☐ 3 CITY _____ ☐ 4 STATE _____ ☐ 5 ZIP _____ ☐ 6 PHONE _____ ☐ 7 FAX _____ ☐ 8 E-MAIL _____ ☐ 9 DATE _____ ☐ 10 SIGNATURE _____ ☐ 11 DATE _____ ☐ 12 SIGNATURE _____ ☐ 13 DATE _____ ☐ 14 SIGNATURE _____ ☐ 15 DATE _____ ☐ 16 SIGNATURE _____ ☐ 17 DATE _____ ☐ 18 SIGNATURE _____ ☐ 19 DATE _____ ☐ 20 SIGNATURE _____ ☐ 21 DATE _____ ☐ 22 SIGNATURE _____ ☐ 23 DATE _____ ☐ 24 SIGNATURE _____ ☐ 25 DATE _____ ☐ 26 SIGNATURE _____ ☐ 27 DATE _____ ☐ 28 SIGNATURE _____ ☐ 29 DATE _____ ☐ 30 SIGNATURE _____ ☐ 31 DATE _____ ☐ 32 SIGNATURE _____ ☐ 33 DATE _____ ☐ 34 SIGNATURE _____ ☐ 35 DATE _____ ☐ 36 SIGNATURE _____ ☐ 37 DATE _____ ☐ 38 SIGNATURE _____ ☐ 39 DATE _____ ☐ 40 SIGNATURE _____ ☐ 41 DATE _____ ☐ 42 SIGNATURE _____ ☐ 43 DATE _____ ☐ 44 SIGNATURE _____ ☐ 45 DATE _____ ☐ 46 SIGNATURE _____ ☐ 47 DATE _____ ☐ 48 SIGNATURE _____ ☐ 49 DATE _____ ☐ 50 SIGNATURE _____ ☐ 51 DATE _____ ☐ 52 SIGNATURE _____ ☐ 53 DATE _____ ☐ 54 SIGNATURE _____ ☐ 55 DATE _____ ☐ 56 SIGNATURE _____ ☐ 57 DATE _____ ☐ 58 SIGNATURE _____ ☐ 59 DATE _____ ☐ 60 SIGNATURE _____ ☐ 61 DATE _____ ☐ 62 SIGNATURE _____ ☐ 63 DATE _____ ☐ 64 SIGNATURE _____ ☐ 65 DATE _____ ☐ 66 SIGNATURE _____ ☐ 67 DATE _____ ☐ 68 SIGNATURE _____ ☐ 69 DATE _____ ☐ 70 SIGNATURE _____ ☐ 71 DATE _____ ☐ 72 SIGNATURE _____ ☐ 73 DATE _____ ☐ 74 SIGNATURE _____ ☐ 75 DATE _____ ☐ 76 SIGNATURE _____ ☐ 77 DATE _____ ☐ 78 SIGNATURE _____ ☐ 79 DATE _____ ☐ 80 SIGNATURE _____ ☐ 81 DATE _____ ☐ 82 SIGNATURE _____ ☐ 83 DATE _____ ☐ 84 SIGNATURE _____ ☐ 85 DATE _____ ☐ 86 SIGNATURE _____ ☐ 87 DATE _____ ☐ 88 SIGNATURE _____ ☐ 89 DATE _____ ☐ 90 SIGNATURE _____ ☐ 91 DATE _____ ☐ 92 SIGNATURE _____ ☐ 93 DATE _____ ☐ 94 SIGNATURE _____ ☐ 95 DATE _____ ☐ 96 SIGNATURE _____ ☐ 97 DATE _____ ☐ 98 SIGNATURE _____ ☐ 99 DATE _____ ☐ 100 SIGNATURE _____ ☐ 101 DATE _____ ☐ 102 SIGNATURE _____ ☐ 103 DATE _____ ☐ 104 SIGNATURE _____ ☐ 105 DATE _____ ☐ 106 SIGNATURE _____ ☐ 107 DATE _____ ☐ 108 SIGNATURE _____ ☐ 109 DATE _____ ☐ 110 SIGNATURE _____ ☐ 111 DATE _____ ☐ 112 SIGNATURE _____ ☐ 113 DATE _____ ☐ 114 SIGNATURE _____ ☐ 115 DATE _____ ☐ 116 SIGNATURE _____ ☐ 117 DATE _____ ☐ 118 SIGNATURE _____ ☐ 119 DATE _____ ☐ 120 SIGNATURE _____ ☐ 121 DATE _____ ☐ 122 SIGNATURE _____ ☐ 123 DATE _____ ☐ 124 SIGNATURE _____ ☐ 125 DATE _____ ☐ 126 SIGNATURE _____ ☐ 127 DATE _____ ☐ 128 SIGNATURE _____ ☐ 129 DATE _____ ☐ 130 SIGNATURE _____ ☐ 131 DATE _____ ☐ 132 SIGNATURE _____ ☐ 133 DATE _____ ☐ 134 SIGNATURE _____ ☐ 135 DATE _____ ☐ 136 SIGNATURE _____ ☐ 137 DATE _____ ☐ 138 SIGNATURE _____ ☐ 139 DATE _____ ☐ 140 SIGNATURE _____ ☐ 141 DATE _____ ☐ 142 SIGNATURE _____ ☐ 143 DATE _____ ☐ 144 SIGNATURE _____ ☐ 145 DATE _____ ☐ 146 SIGNATURE _____ ☐ 147 DATE _____ ☐ 148 SIGNATURE _____ ☐ 149 DATE _____ ☐ 150 SIGNATURE _____ ☐ 151 DATE _____ ☐ 152 SIGNATURE _____ ☐ 153 DATE _____ ☐ 154 SIGNATURE _____ ☐ 155 DATE _____ ☐ 156 SIGNATURE _____ ☐ 157 DATE _____ ☐ 158 SIGNATURE _____ ☐
--

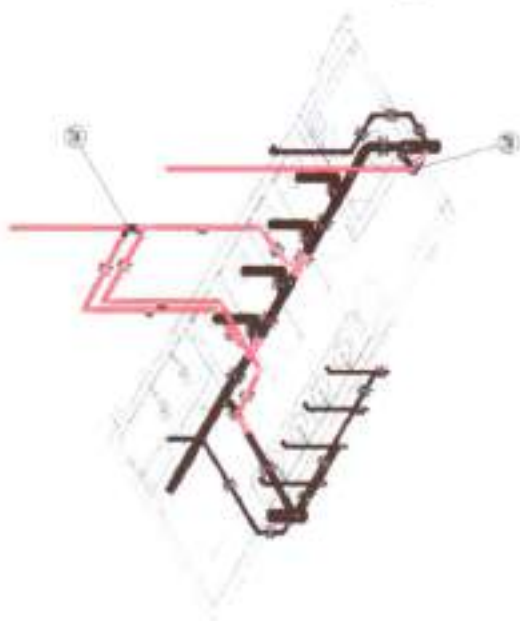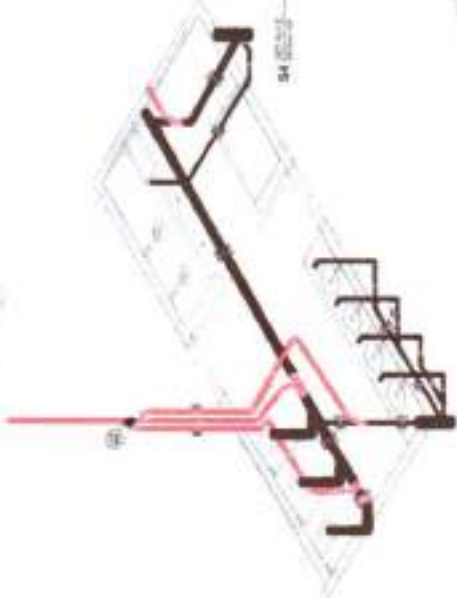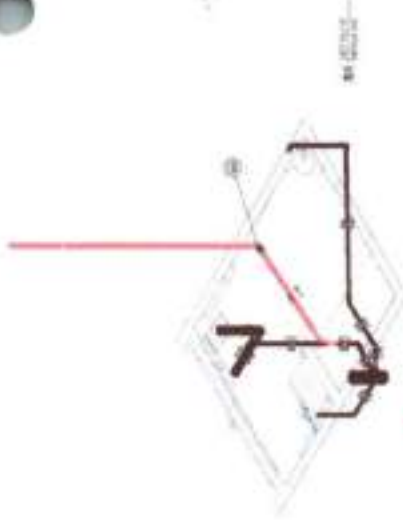

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 937
+
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA




PROPOSTA DE PROJETO	PROPOSTA DE PROJETO
Nome	Nome
Matrícula	Matrícula
Disciplina	Disciplina
Professor	Professor
Assunto	Assunto
Observações	Observações

Samiel
SAMUEL PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CPFA CE 379384

FACE INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PROJETO PADRÃO - INES	
NOME DO ALUNO MATRÍCULA DISCIPLINA PROFESSOR	DATA DE ENTREGA DATA DE RECEBIMENTO DATA DE DEVOLUÇÃO
OBSERVAÇÕES DATA DE ENTREGA DATA DE RECEBIMENTO DATA DE DEVOLUÇÃO	
ASSINATURA DO ALUNO ASSINATURA DO PROFESSOR ASSINATURA DO COORDENADOR	

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº 978
 RUBRICA

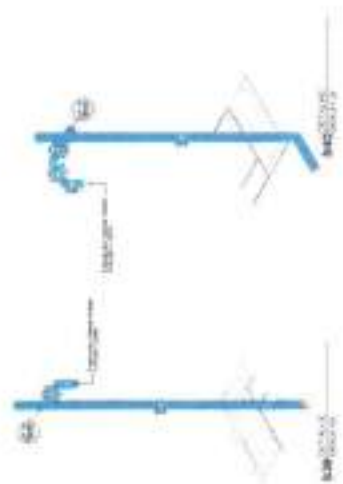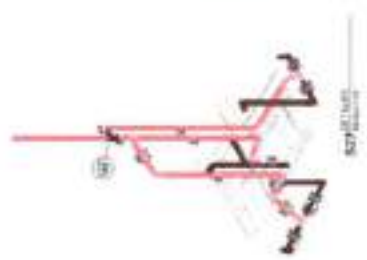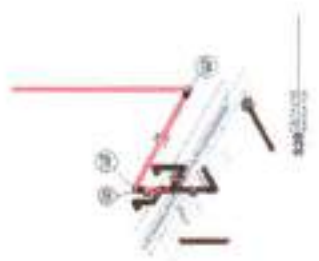

Sanket.

AMILLE PAPA
PORTARIA
CREA CE

FAC

http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.05.005

100

100

100

10	11
12	13
14	15
16	17
18	19
20	21
22	23
24	25
26	27
28	29
30	31
32	33
34	35
36	37
38	39
40	41
42	43
44	45
46	47
48	49
50	51
52	53
54	55
56	57
58	59
60	61
62	63
64	65
66	67
68	69
70	71
72	73
74	75
76	77
78	79
80	81
82	83
84	85
86	87
88	89
90	91
92	93
94	95
96	97
98	99
100	101
102	103
104	105
106	107
108	109
110	111
112	113
114	115
116	117
118	119
120	121
122	123
124	125
126	127
128	129
130	131
132	133
134	135
136	137
138	139
140	141
142	143
144	145
146	147
148	149
150	151
152	153
154	155
156	157
158	159
160	161
162	163
164	165
166	167
168	169
170	171
172	173
174	175
176	177
178	179
180	181
182	183
184	185
186	187
188	189
190	191
192	193
194	195
196	197
198	199
200	201
202	203
204	205
206	207
208	209
210	211
212	213
214	215
216	217
218	219
220	221
222	223
224	225
226	227
228	229
230	231
232	233
234	235
236	237
238	239
240	241
242	243
244	245
246	247
248	249
250	251
252	253
254	255
256	257
258	259
260	261
262	263
264	265
266	267
268	269
270	271
272	273
274	275
276	277
278	279
280	281
282	283
284	285
286	287
288	289
290	291
292	293
294	295
296	297
298	299
300	301
302	303
304	305
306	307
308	309
310	311
312	313
314	315
316	317
318	319
320	321
322	323
324	325
326	327
328	329
330	331
332	333
334	335
336	337
338	339
340	341
342	343

1

Introduction

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

10





11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 932
RUBRICA

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

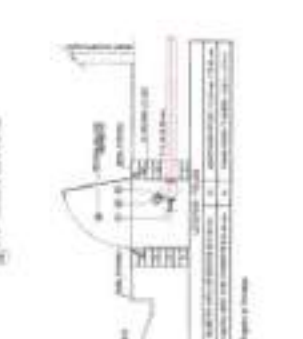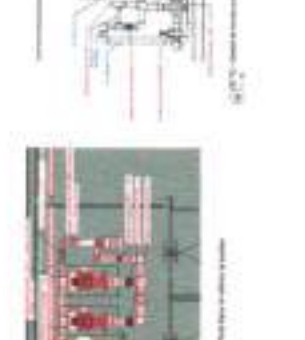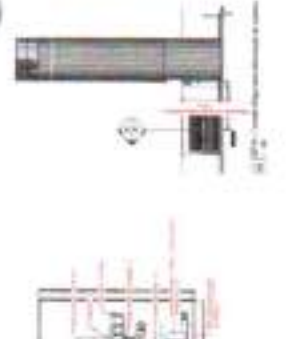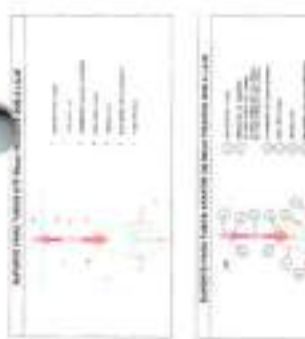

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 940
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 940
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 940
RUBRICA

Área		Descrição		Valor	
1	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço
2	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço
3	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço
4	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço
5	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço
6	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço
7	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço
8	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço
9	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço
10	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço	Área de Serviço

SANTILE RAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 1793114

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FND

PROJETO PADRÃO - FNDE

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 997
RUBRICA


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLENCIA

MIN
06/07




 SIRMILLE PAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CREA CE 379384

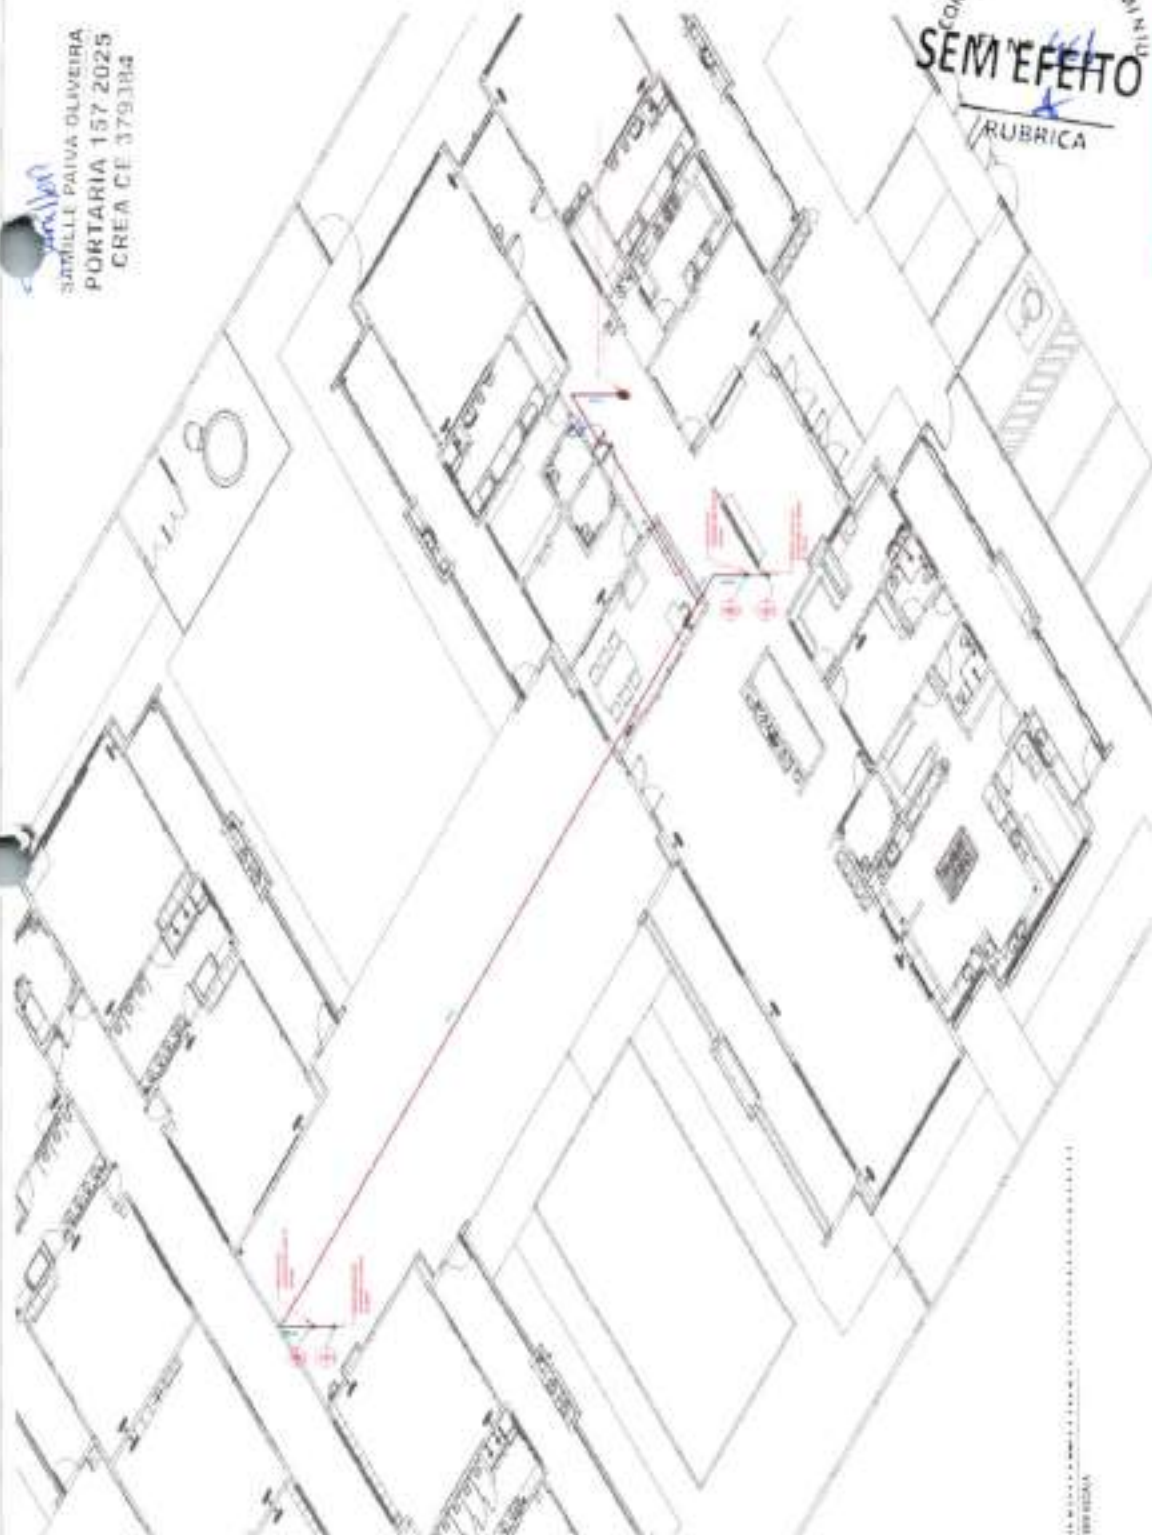

FINE
 MINISTÉRIO DA
 EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº 942
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 SEM EFEITO
 RUBRICA

Item	Descrição	Valor	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	Material de consumo	100,00	unidade	1	100,00
2	Material de consumo	200,00	unidade	1	200,00
3	Material de consumo	300,00	unidade	1	300,00
4	Material de consumo	400,00	unidade	1	400,00
5	Material de consumo	500,00	unidade	1	500,00
6	Material de consumo	600,00	unidade	1	600,00
7	Material de consumo	700,00	unidade	1	700,00
8	Material de consumo	800,00	unidade	1	800,00
9	Material de consumo	900,00	unidade	1	900,00
10	Material de consumo	1000,00	unidade	1	1000,00

Item	Descrição	Valor	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	Material de consumo	100,00	unidade	1	100,00
2	Material de consumo	200,00	unidade	1	200,00
3	Material de consumo	300,00	unidade	1	300,00
4	Material de consumo	400,00	unidade	1	400,00
5	Material de consumo	500,00	unidade	1	500,00
6	Material de consumo	600,00	unidade	1	600,00
7	Material de consumo	700,00	unidade	1	700,00
8	Material de consumo	800,00	unidade	1	800,00
9	Material de consumo	900,00	unidade	1	900,00
10	Material de consumo	1000,00	unidade	1	1000,00

Item	Descrição	Valor	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	Material de consumo	100,00	unidade	1	100,00
2	Material de consumo	200,00	unidade	1	200,00
3	Material de consumo	300,00	unidade	1	300,00
4	Material de consumo	400,00	unidade	1	400,00
5	Material de consumo	500,00	unidade	1	500,00
6	Material de consumo	600,00	unidade	1	600,00
7	Material de consumo	700,00	unidade	1	700,00
8	Material de consumo	800,00	unidade	1	800,00
9	Material de consumo	900,00	unidade	1	900,00
10	Material de consumo	1000,00	unidade	1	1000,00



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº 942
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 SEM EFEITO
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 SEM EFEITO
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 SEM EFEITO
 RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 SEM EFEITO
 RUBRICA

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO TERRENO

ESCALA 1/250

Sandra
SANDRILE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157/2025
CREA 000.370.384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº *943*
+
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº *143*
+
SEM EFEITO
RUBRICA

N= 8.540.358,777
E= 355.406,33


N= 8.540.358,777
E= 355.406,33

N= 8.540.358,777
E= 355.406,33

N= 8.540.358,777
E= 355.406,33


AREA TERRENO: 5.817,04 m²

RUA ALFREDO FERNANDES ALVES NETO

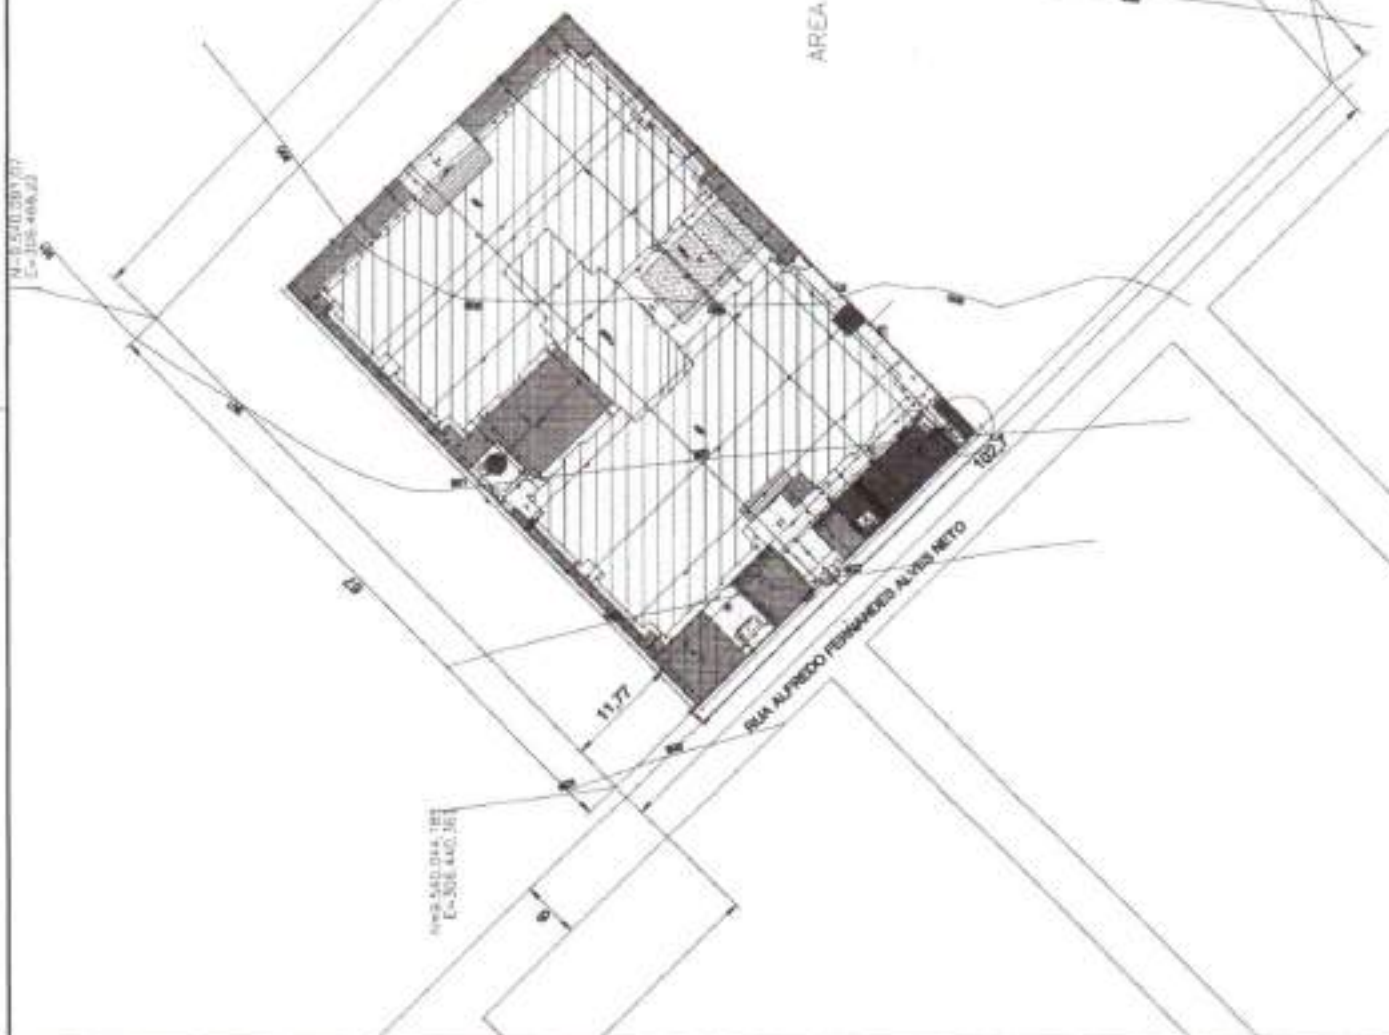

RUA OSCAR FERNANDES

RUA SENADOR CATUNDA

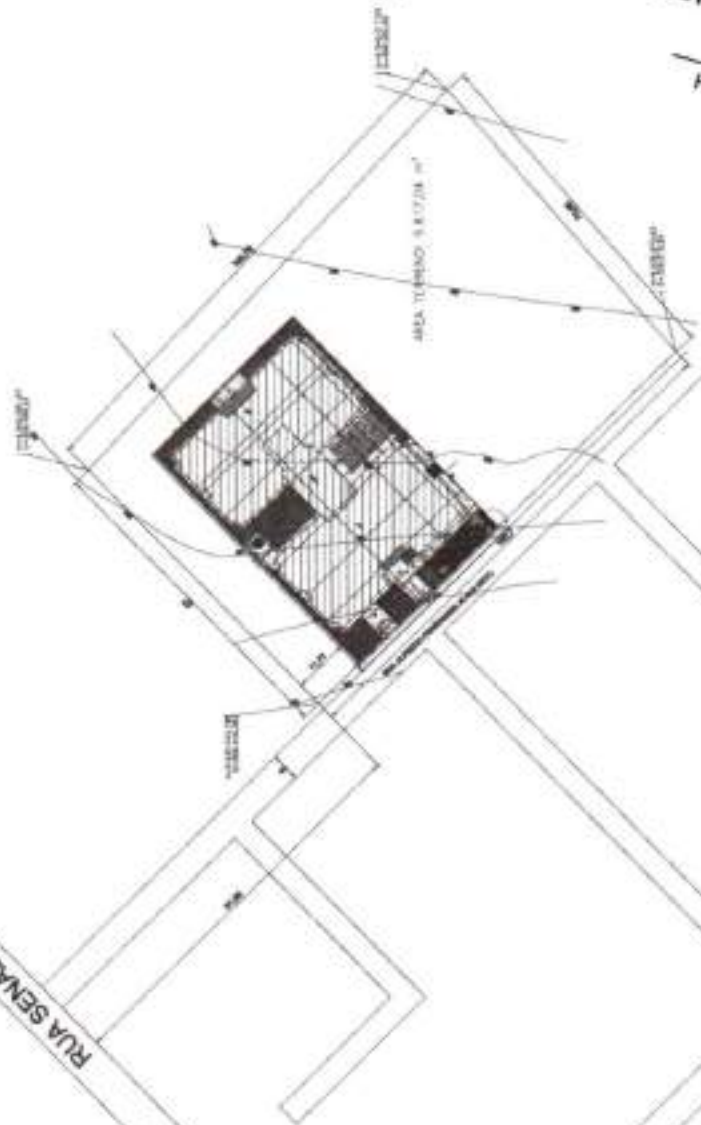

Samila
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA 06 710004

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 944
✓

RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
✓
RUBRICA

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1/500

		Nº de Processo: 157/2025 Data: 15/07/2025 Local: São Paulo, SP	
Nome: SAMILLE PAIVA OLIVEIRA CPF: 067.100.040-04 OAB: 067.100.040-04		Nome: SAMILLE PAIVA OLIVEIRA CPF: 067.100.040-04 OAB: 067.100.040-04	
Assinatura: <i>Samila</i> Rubrica: <i>Samila</i>		Assinatura: <i>Samila</i> Rubrica: <i>Samila</i>	
Data: 15/07/2025 Local: São Paulo, SP		Data: 15/07/2025 Local: São Paulo, SP	

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

ESCALA 1/250

SAMUELLE DA SILVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA PE 470184

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 945
RUBRICA

N=9.842.017,85
E=308.565,54

AREA TERRENO: 5.817,04 m²

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

N=9.833.370,83
E=308.572,24

N=9.840.001,03
E=308.448,22

N=9.840.001,03
E=308.448,22


11,77

RUA ALFREDO FERREIRAS ALVES NETO


102

70,80

106,76

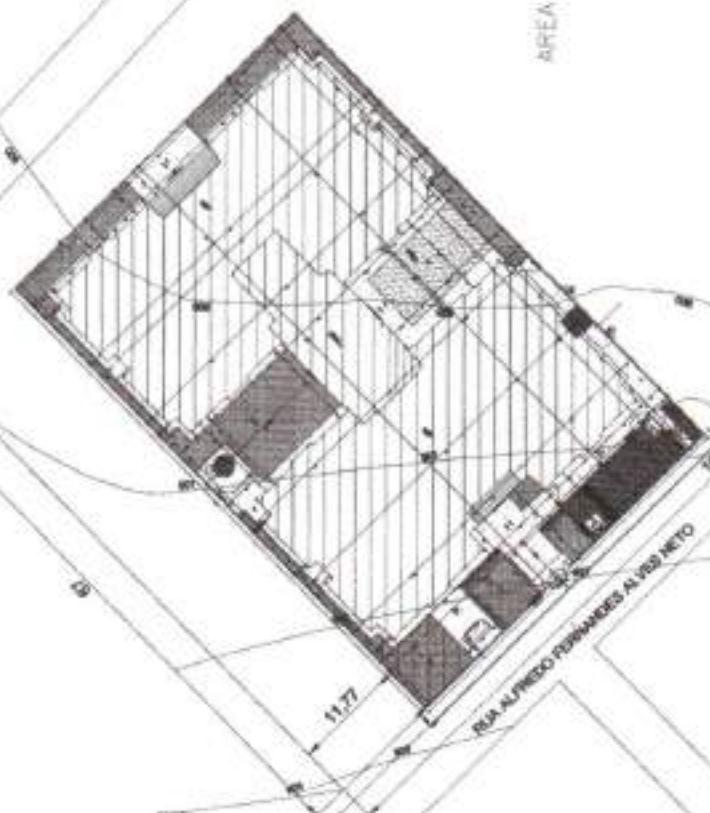

LOCOB

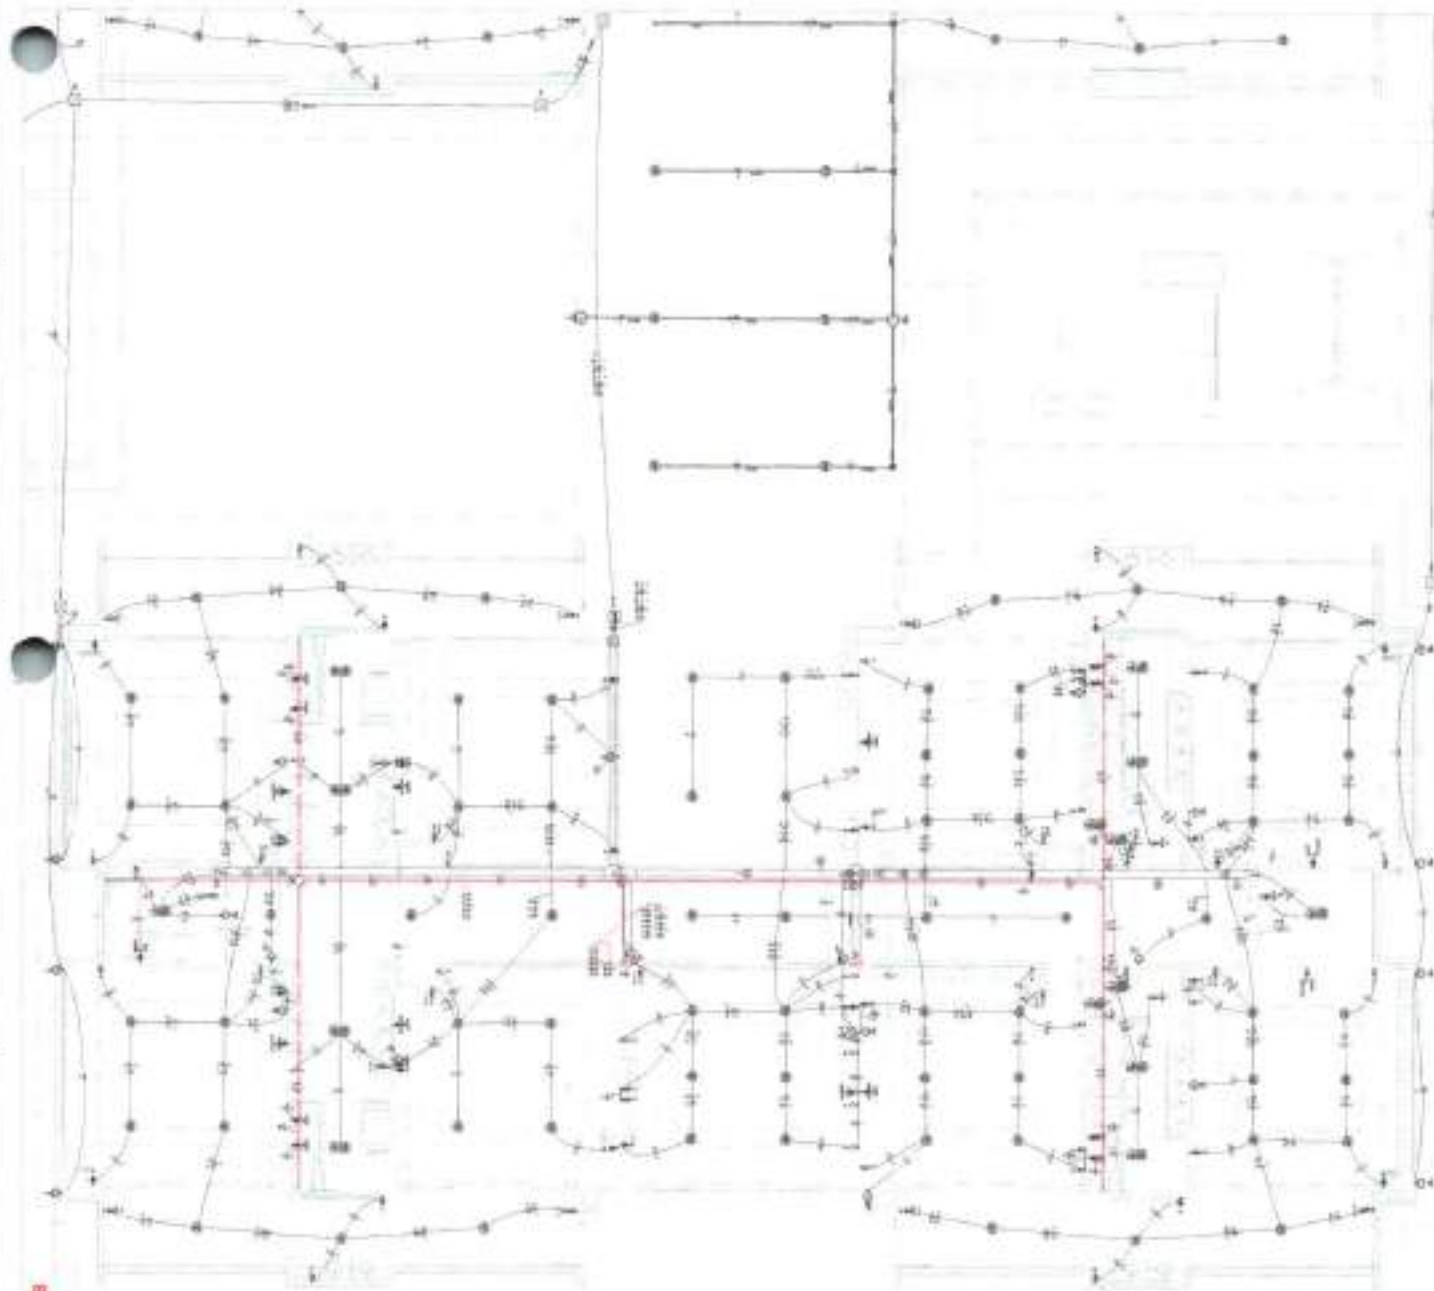

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 947
RUBRICA

Este projeto foi elaborado em conformidade com as normas técnicas vigentes e com as especificações do cliente. O projeto é de propriedade da empresa e não deve ser reproduzido ou utilizado sem a autorização expressa da mesma.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA


FADE

PROJETO PADRÃO - FASE

SAMUEL PANA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

PROJETO PADRÃO - FASE

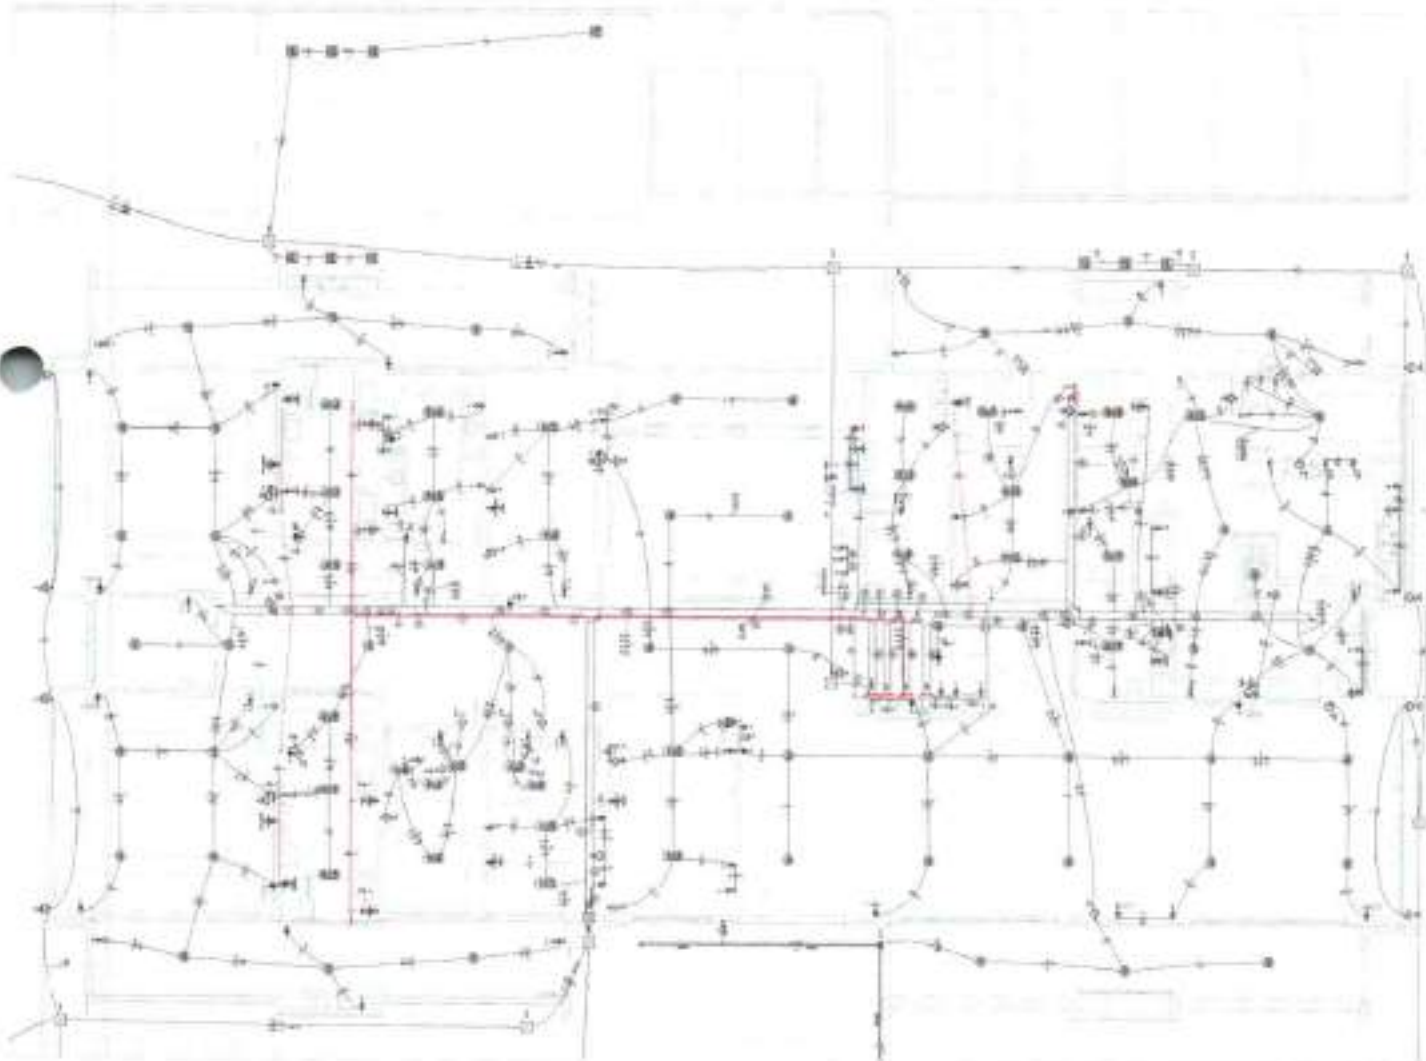

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																				


[illegible][illegible][illegible][illegible]

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 948
RUBRICA

SAMUEL
SÁMUEL PRIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384



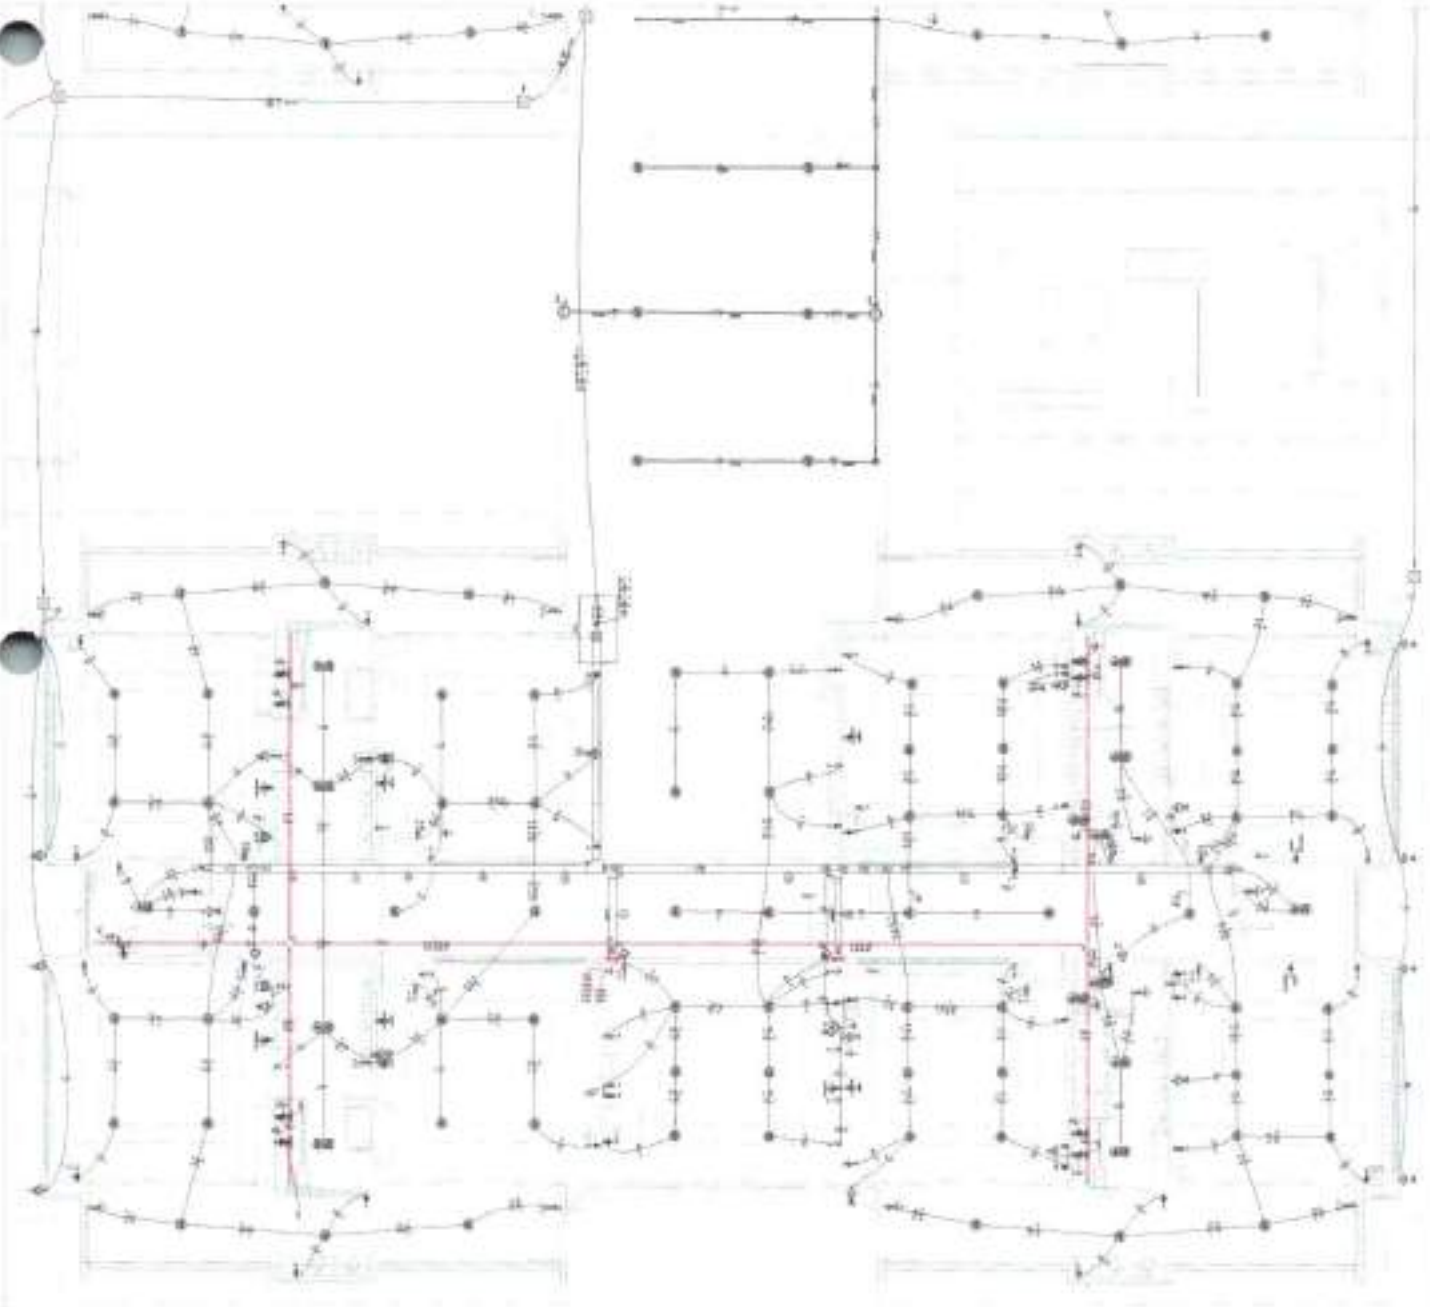

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 FL Nº 952
 +
 RUBRICA


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
 SEM EFEITO
 +
 RUBRICA

FADE

PROJETO INURB - INDE

SADILLE MAIVA OLIVEIRA
 PORTARIA 157 2025
 CREA CE 379354



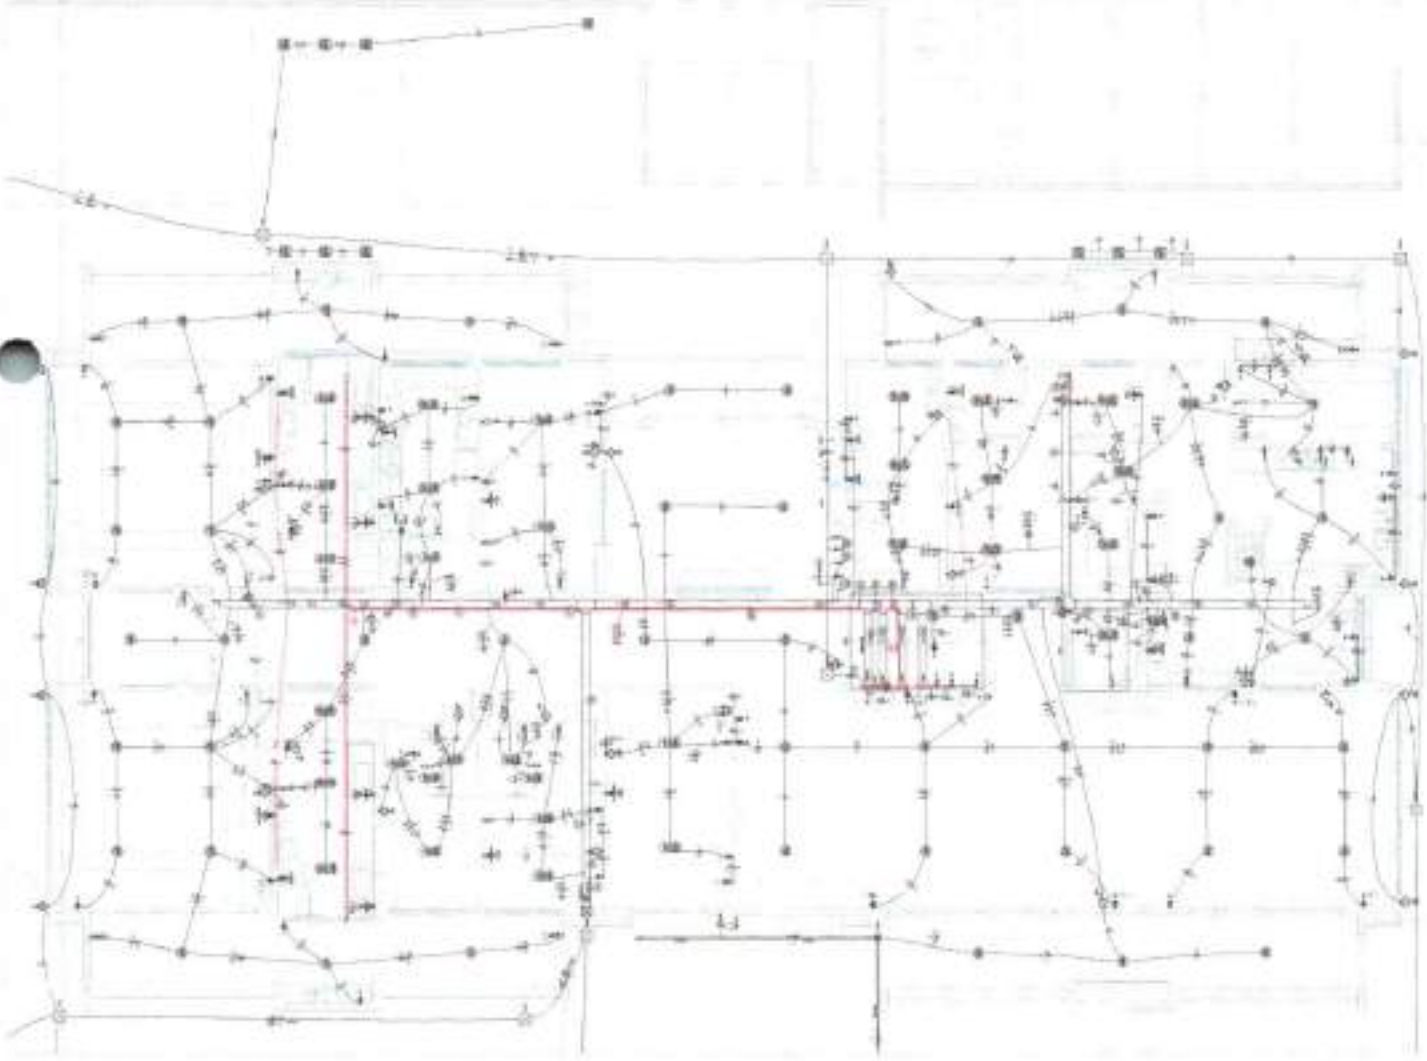


Parcela	Área (m²)	Valor (R\$)	Observações
1	1000	100000	
2	1000	100000	
3	1000	100000	
4	1000	100000	
5	1000	100000	
6	1000	100000	
7	1000	100000	
8	1000	100000	
9	1000	100000	
10	1000	100000	
11	1000	100000	
12	1000	100000	
13	1000	100000	
14	1000	100000	
15	1000	100000	
16	1000	100000	
17	1000	100000	
18	1000	100000	
19	1000	100000	
20	1000	100000	
21	1000	100000	
22	1000	100000	
23	1000	100000	
24	1000	100000	
25	1000	100000	
26	1000	100000	
27	1000	100000	
28	1000	100000	
29	1000	100000	
30	1000	100000	
31	1000	100000	
32	1000	100000	
33	1000	100000	
34	1000	100000	
35	1000	100000	
36	1000	100000	
37	1000	100000	
38	1000	100000	
39	1000	100000	
40	1000	100000	
41	1000	100000	
42	1000	100000	
43	1000	100000	
44	1000	100000	
45	1000	100000	
46	1000	100000	
47	1000	100000	
48	1000	100000	
49	1000	100000	
50	1000	100000	
51	1000	100000	
52	1000	100000	
53	1000	100000	
54	1000	100000	
55	1000	100000	
56	1000	100000	
57	1000	100000	
58	1000	100000	
59	1000	100000	
60	1000	100000	
61	1000	100000	
62	1000	100000	
63	1000	100000	
64	1000	100000	
65	1000	100000	
66	1000	100000	
67	1000	100000	
68	1000	100000	
69	1000	100000	
70	1000	100000	
71	1000	100000	
72	1000	100000	
73	1000	100000	
74	1000	100000	
75	1000	100000	
76	1000	100000	
77	1000	100000	
78	1000	100000	
79	1000	100000	
80	1000	100000	
81	1000	100000	
82	1000	100000	
83	1000	100000	
84	1000	100000	
85	1000	100000	
86	1000	100000	
87	1000	100000	
88	1000	100000	
89	1000	100000	
90	1000	100000	
91	1000	100000	
92	1000	100000	
93	1000	100000	
94	1000	100000	
95	1000	100000	
96	1000	100000	
97	1000	100000	
98	1000	100000	
99	1000	100000	
100	1000	100000	

Parcela	Área (m²)	Valor (R\$)	Observações
101	1000	100000	
102	1000	100000	
103	1000	100000	
104	1000	100000	
105	1000	100000	
106	1000	100000	
107	1000	100000	
108	1000	100000	
109	1000	100000	
110	1000	100000	
111	1000	100000	
112	1000	100000	
113	1000	100000	
114	1000	100000	
115	1000	100000	
116	1000	100000	
117	1000	100000	
118	1000	100000	
119	1000	100000	
120	1000	100000	
121	1000	100000	
122	1000	100000	
123	1000	100000	
124	1000	100000	
125	1000	100000	
126	1000	100000	
127	1000	100000	
128	1000	100000	
129	1000	100000	
130	1000	100000	
131	1000	100000	
132	1000	100000	
133	1000	100000	
134	1000	100000	
135	1000	100000	
136	1000	100000	
137	1000	100000	
138	1000	100000	
139	1000	100000	
140	1000	100000	
141	1000	100000	
142	1000	100000	
143	1000	100000	
144	1000	100000	
145	1000	100000	
146	1000	100000	
147	1000	100000	
148	1000	100000	
149	1000	100000	
150	1000	100000	

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 95
RUBRICA




SAMUEL PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 379384



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. Nº 955
RUBRICA

1. ☐ NO 2. ☐ YES 3. ☐ NO 4. ☐ YES 5. ☐ NO 6. ☐ YES 7. ☐ NO 8. ☐ YES 9. ☐ NO 10. ☐ YES 11. ☐ NO 12. ☐ YES 13. ☐ NO 14. ☐ YES 15. ☐ NO 16. ☐ YES 17. ☐ NO 18. ☐ YES 19. ☐ NO 20. ☐ YES 21. ☐ NO 22. ☐ YES 23. ☐ NO 24. ☐ YES 25. ☐ NO 26. ☐ YES 27. ☐ NO 28. ☐ YES 29. ☐ NO 30. ☐ YES 31. ☐ NO 32. ☐ YES 33. ☐ NO 34. ☐ YES 35. ☐ NO 36. ☐ YES 37. ☐ NO 38. ☐ YES 39. ☐ NO 40. ☐ YES 41. ☐ NO 42. ☐ YES 43. ☐ NO 44. ☐ YES 45. ☐ NO 46. ☐ YES 47. ☐ NO 48. ☐ YES 49. ☐ NO 50. ☐ YES 51. ☐ NO 52. ☐ YES 53. ☐ NO 54. ☐ YES 55. ☐ NO 56. ☐ YES 57. ☐ NO 58. ☐ YES 59. ☐ NO 60. ☐ YES 61. ☐ NO 62. ☐ YES 63. ☐ NO 64. ☐ YES 65. ☐ NO 66. ☐ YES 67. ☐ NO 68. ☐ YES 69. ☐ NO 70. ☐ YES 71. ☐ NO 72. ☐ YES 73. ☐ NO 74. ☐ YES 75. ☐ NO 76. ☐ YES 77. ☐ NO 78. ☐ YES 79. ☐ NO 80. ☐ YES 81. ☐ NO 82. ☐ YES 83. ☐ NO 84. ☐ YES 85. ☐ NO 86. ☐ YES 87. ☐ NO 88. ☐ YES 89. ☐ NO 90. ☐ YES 91. ☐ NO 92. ☐ YES 93. ☐ NO 94. ☐ YES 95. ☐ NO 96. ☐ YES 97. ☐ NO 98. ☐ YES 99. ☐ NO 100. ☐ YES		1. ☐ NO 2. ☐ YES 3. ☐ NO 4. ☐ YES 5. ☐ NO 6. ☐ YES 7. ☐ NO 8. ☐ YES 9. ☐ NO 10. ☐ YES 11. ☐ NO 12. ☐ YES 13. ☐ NO 14. ☐ YES 15. ☐ NO 16. ☐ YES 17. ☐ NO 18. ☐ YES 19. ☐ NO 20. ☐ YES 21. ☐ NO 22. ☐ YES 23. ☐ NO 24. ☐ YES 25. ☐ NO 26. ☐ YES 27. ☐ NO 28. ☐ YES 29. ☐ NO 30. ☐ YES 31. ☐ NO 32. ☐ YES 33. ☐ NO 34. ☐ YES 35. ☐ NO 36. ☐ YES 37. ☐ NO 38. ☐ YES 39. ☐ NO 40. ☐ YES 41. ☐ NO 42. ☐ YES 43. ☐ NO 44. ☐ YES 45. ☐ NO 46. ☐ YES 47. ☐ NO 48. ☐ YES 49. ☐ NO 50. ☐ YES 51. ☐ NO 52. ☐ YES 53. ☐ NO 54. ☐ YES 55. ☐ NO 56. ☐ YES 57. ☐ NO 58. ☐ YES 59. ☐ NO 60. ☐ YES 61. ☐ NO 62. ☐ YES 63. ☐ NO 64. ☐ YES 65. ☐ NO 66. ☐ YES 67. ☐ NO 68. ☐ YES 69. ☐ NO 70. ☐ YES 71. ☐ NO 72. ☐ YES 73. ☐ NO 74. ☐ YES 75. ☐ NO 76. ☐ YES 77. ☐ NO 78. ☐ YES 79. ☐ NO 80. ☐ YES 81. ☐ NO 82. ☐ YES 83. ☐ NO 84. ☐ YES 85. ☐ NO 86. ☐ YES 87. ☐ NO 88. ☐ YES 89. ☐ NO 90. ☐ YES 91. ☐ NO 92. ☐ YES 93. ☐ NO 94. ☐ YES 95. ☐ NO
--	--	--

COMISSAO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
FEDERAL
RUBRICA

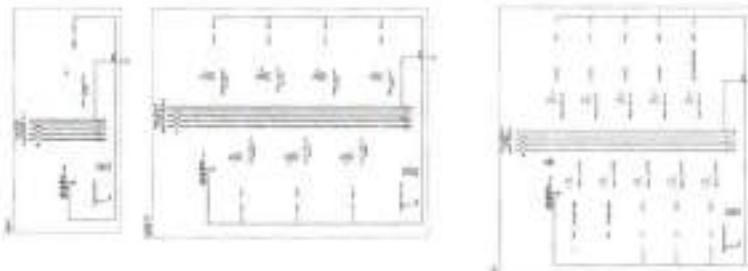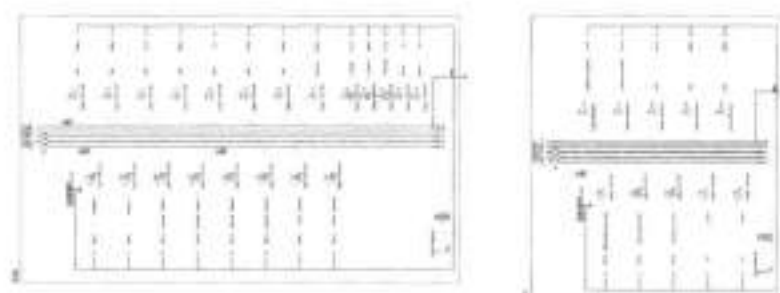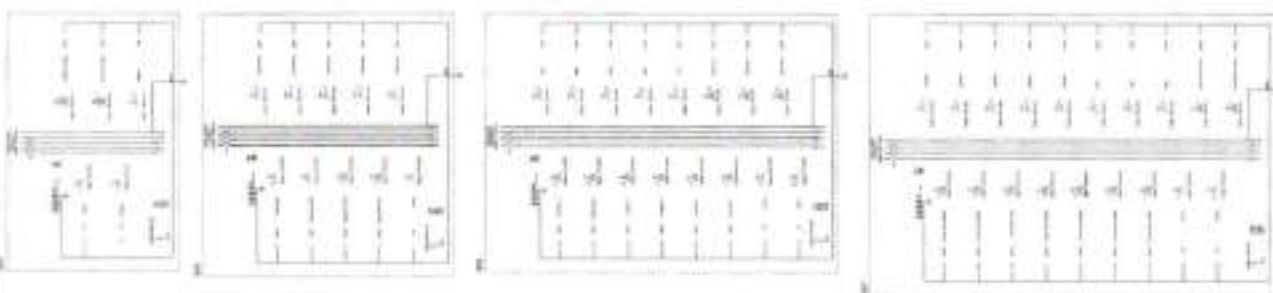[illegible]

Case 1: 1990-1991	
Year	Case 1: 1990-1991
1990	1990
1991	1991
1992	1992
1993	1993
1994	1994
1995	1995
1996	1996
1997	1997
1998	1998
1999	1999
2000	2000
2001	2001
2002	2002
2003	2003
2004	2004
2005	2005
2006	2006
2007	2007
2008	2008
2009	2009
2010	2010
2011	2011
2012	2012
2013	2013
2014	2014
2015	2015
2016	2016
2017	2017
2018	2018
2019	2019
2020	2020
2021	2021
2022	2022
2023	2023
2024	2024
2025	2025
2026	2026
2027	2027
2028	2028
2029	2029
2030	2030
2031	2031
2032	2032
2033	2033
2034	2034
2035	2035
2036	2036
2037	2037
2038	2038
2039	2039
2040	2040
2041	2041
2042	2042
2043	2043
2044	2044
2045	2045
2046	2046
2047	2047
2048	2048
2049	2049
2050	2050
2051	2051
2052	2052
2053	2053
2054	2054
2055	2055
2056	2056
2057	2057
2058	2058
2059	2059
2060	2060
2061	2061
2062	2062
2063	2063
2064	2064
2065	2065
2066	2066
2067	2067
2068	2068
2069	2069
2070	2070
2071	2071
2072	2072
2073	2073
2074	2074
2075	2075
2076	2076
2077	2077
2078	2078
2079	2079
2080	2080
2081	2081
2082	2082
2083	2083
2084	2084
2085	2085
2086	2086
2087	2087
2088	2088
2089	2089
2090	2090
2091	2091
2092	2092
2093	2093
2094	2094
2095	2095
2096	2096
2097	2097
2098	2098
2099	2099
2100	2100
2101	2101
2102	2102
2103	2103
2104	2104
2105	2105
2106	2106
2107	2107
2108	2108
2109	2109
2110	2110
2111	2111
2112	2112
2113	2113
2114	2114
2115	2115
2116	2116
2117	2117
2118	2118
2119	2119
2120	2120
2121	2121
2122	2122
2123	2123
2124	2124
2125	2125
2126	2126
2127	2127
2128	2128
2129	2129
2130	2130
2131	2131
2132	2132
2133	2133
2134	2134
2135	2135
2136	2136
2137	2137
2138	2138</

[illegible]

1

and a control group. The control group was given a placebo. The treatment group was given a combination of a placebo and a small amount of the active ingredient. The results showed that the treatment group had a significantly higher rate of improvement than the control group. This suggests that the combination of the placebo and the active ingredient is effective in treating the condition. The study was conducted over a period of 12 weeks. The results were statistically significant at the 5% level. The study was funded by the National Institutes of Health. The study was published in the Journal of Clinical Investigation. The study was conducted by Dr. John Doe and his colleagues. The study was a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The study was conducted in a clinical setting. The study was funded by the National Institutes of Health. The study was published in the Journal of Clinical Investigation. The study was conducted by Dr. John Doe and his colleagues. The study was a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The study was conducted in a clinical setting.

^a The number of subjects who were included in each group was determined by the number of subjects who completed the study. The number of subjects who were excluded from the study is shown in parentheses.

^a The authors thank Dr. Alan Bell for his helpful comments on this manuscript.

Notes

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 103–110

[illegible][illegible]

ASSAIO DE P
EM E

Item	Quantity	Unit Price	Total Price
1. Labor	100	1.00	100.00
2. Material	50	2.00	100.00
3. Overhead	10	10.00	100.00
4. Profit	10	10.00	100.00
Total			400.00

LE PAIVA OLIVEIRA






ETARIA 157 2025
07-05-2024

[illegible][illegible]

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

SOMILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 956
RUBRICA

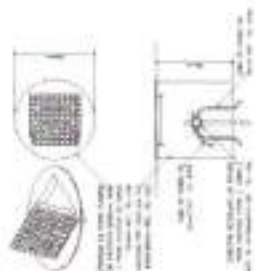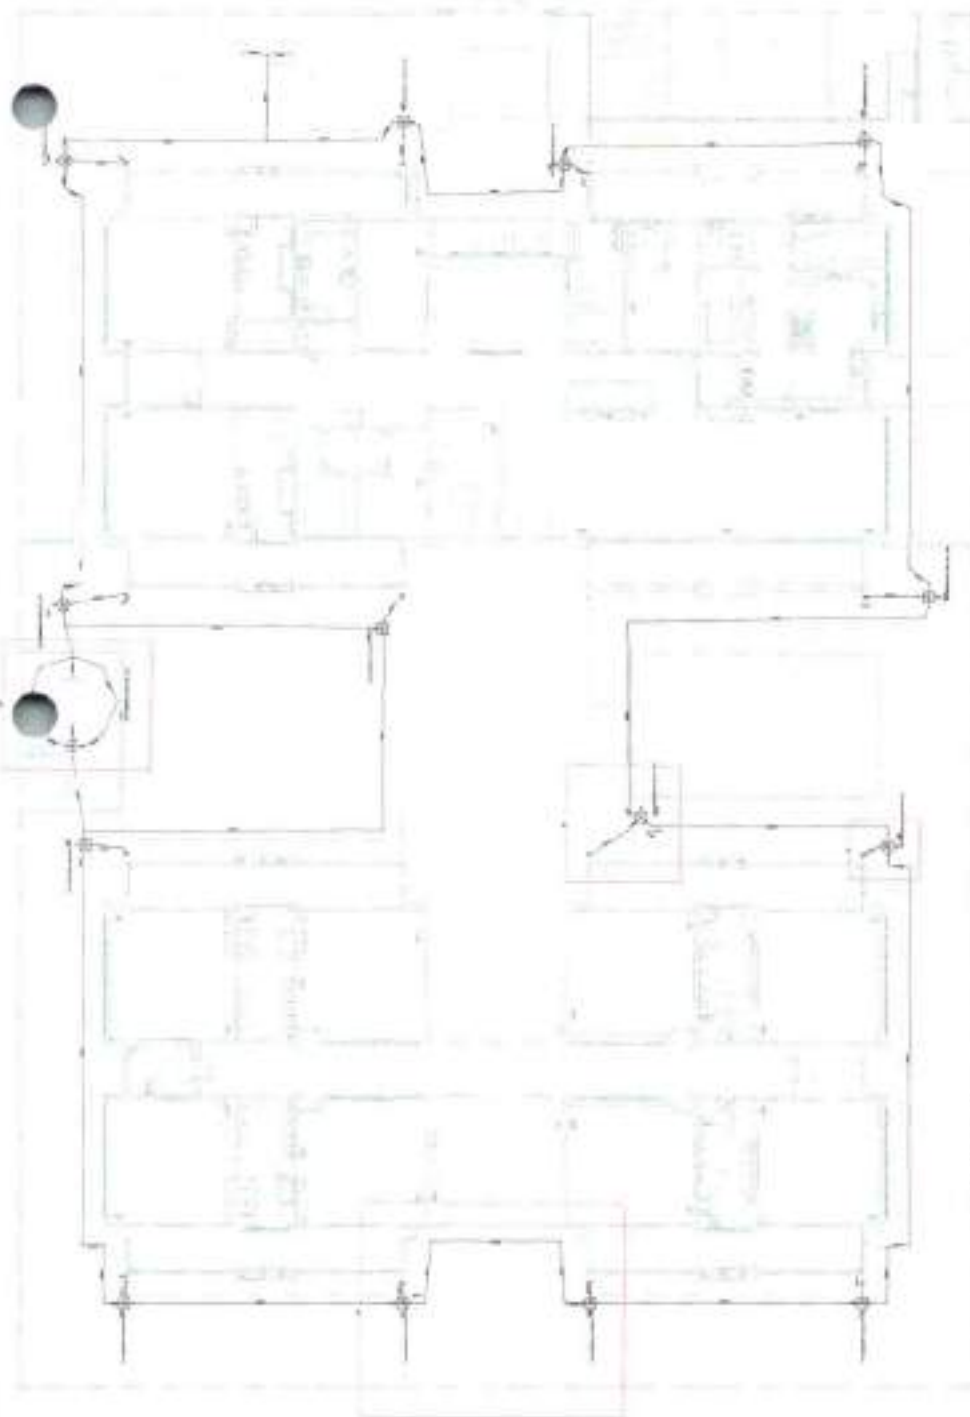

► **Practicality:** *Practicality* is the degree to which a solution is feasible and can be implemented in the real world. It involves considering factors such as cost, time, resources, and the ability to integrate the solution with existing systems and processes.

2017-2018
 2019-2020
 2021-2022
 2023-2024
 2025-2026
 2027-2028
 2029-2030
 2031-2032
 2033-2034
 2035-2036
 2037-2038
 2039-2040
 2041-2042
 2043-2044
 2045-2046
 2047-2048
 2049-2050
 2051-2052
 2053-2054
 2055-2056
 2057-2058
 2059-2060
 2061-2062
 2063-2064
 2065-2066
 2067-2068
 2069-2070
 2071-2072
 2073-2074
 2075-2076
 2077-2078
 2079-2080
 2081-2082
 2083-2084
 2085-2086
 2087-2088
 2089-2090
 2091-2092
 2093-2094
 2095-2096
 2097-2098
 2099-2100
 2101-2102
 2103-2104
 2105-2106
 2107-2108
 2109-2110
 2111-2112
 2113-2114
 2115-2116
 2117-2118
 2119-2120
 2121-2122
 2123-2124
 2125-2126
 2127-2128
 2129-2130
 2131-2132
 2133-2134
 2135-2136
 2137-2138
 2139-2140
 2141-2142
 2143-2144
 2145-2146
 2147-2148
 2149-2150
 2151-2152
 2153-2154
 2155-2156
 2157-2158
 2159-2160
 2161-2162
 2163-2164
 2165-2166
 2167-2168
 2169-2170
 2171-2172
 2173-2174
 2175-2176
 2177-2178
 2179-2180
 2181-2182
 2183-2184
 2185-2186
 2187-2188
 2189-2190
 2191-2192
 2193-2194
 2195-2196
 2197-2198
 2199-2200
 2201-2202
 2203-2204
 2205-2206
 2207-2208
 2209-2210
 2211-2212
 2213-2214
 2215-2216
 2217-2218
 2219-2220
 2221-2222
 2223-2224
 2225-2226
 2227-2228
 2229-2230
 2231-2232
 2233-2234
 2235-2236
 2237-2238
 2239-2240
 2241-2242
 2243-2244
 2245-2246
 2247-2248
 2249-2250
 2251-2252
 2253-2254
 2255-2256
 2257-2258
 2259-2260
 2261-2262
 2263-2264
 2265-2266
 2267-2268
 2269-2270
 2271-2272
 2273-2274
 2275-2276
 2277-2278
 2279-2280
 2281-2282
 2283-2284
 2285-2286
 2287-2288
 2289-2290
 2291-2292
 2293-2294
 2295-2296
 2297-2298
 2299-2300
 2301-2302
 2303-2304
 2305-2306
 2307-2308
 2309-2310
 2311-2312
 2313-2314
 2315-2316
 2317-2318
 2319-2320
 2321-2322
 2323-2324
 2325-2326
 2327-2328
 2329-2330
 2331-2332
 2333-2334
 2335-2336
 2337-2338
 2339-2340
 2341-2342
 2343-2344
 2345-2346
 2347-2348
 2349-2350
 2351-2352
 2353-2354
 2355-2356
 2357-2358
 2359-2360
 2361-2362
 2363-2364
 2365-2366
 2367-2368
 2369-2370
 2371-2372
 2373-2374
 2375-2376
 2377-2378
 2379-2380
 2381-2382
 2383-2384
 2385-2386
 2387-2388
 2389-2390
 2391-2392
 2393-2394
 2395-2396
 2397-2398
 2399-2400
 2401-2402
 2403-2404
 2405-2406
 2407-2408
 2409-2410
 2411-2412
 2413-2414
 2415-2416
 2417-2418
 2419-2420
 2421-2422
 2423-2424
 2425-2426
 2427-2428
 2429-2430
 2431-2432
 2433-2434
 2435-2436
 2437-2438
 2439-2440
 2441-2442
 2443-2444
 2445-2446
 2447-2448
 2449-2450
 2451-2452
 2453-2454
 2455-2456
 2457-2458
 2459-2460
 2461-2462
 2463-2464
 2465-2466
 2467-2468
 2469-2470
 2471-2472
 2473-2474
 2475-2476
 2477-2478
 2479-2480
 2481-2482
 2483-2484
 2485-2486
 2487-2488
 2489-2490
 2491-2492
 2493-2494
 2495-2496
 2497-2498
 2499-2500
 2501-2502
 2503-2504
 2505-2506
 2507-2508
 2509-2510
 2511-2512
 2513-2514
 2515-2516
 2517-2518
 2519-2520
 2521-2522
 2523-2524
 2525-2526
 2527-2528
 2529-2530
 2531-2532
 2533-2534
 2535-2536
 2537-2538
 2539-2540
 2541-2542
 2543-2544
 2545-2546
 2547-2548
 2549-2550
 2551-2552
 2553-2554
 2555-2556
 2557-2558
 2559-2560
 2561-2562
 2563-2564
 2565-2566
 2567-2568
 2569-2570
 2571-2572
 2573-2574
 2575-2576
 2577-2578
 2579-2580
 2581-2582
 2583-2584
 2585-2586
 2587-2588
 2589-2590
 2591-2592
 2593-2594
 2595-2596
 2597-2598
 2599-2600
 2601-2

© 2014 Wiley Periodicals, Inc. *Journal of Cellular Biochemistry* 119: 103–114, 2014. DOI 10.1002/jcb.23791

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–117


© 1997 by Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 241: 471–477

Plano de Trabalho - 2024

PROJETO	PROJETO DE PLANEJAMENTO
OBJETIVO	ELABORAR O PLANO DE TRABALHO PARA O ANO 2024
JUSTIFICATIVA	NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO PARA O ANO 2024
RESULTADO ESPERADO	ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO 2024

Plano de Trabalho - 2024

PROJETO	PROJETO DE PLANEJAMENTO
OBJETIVO	ELABORAR O PLANO DE TRABALHO PARA O ANO 2024
JUSTIFICATIVA	NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO PARA O ANO 2024
RESULTADO ESPERADO	ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO 2024

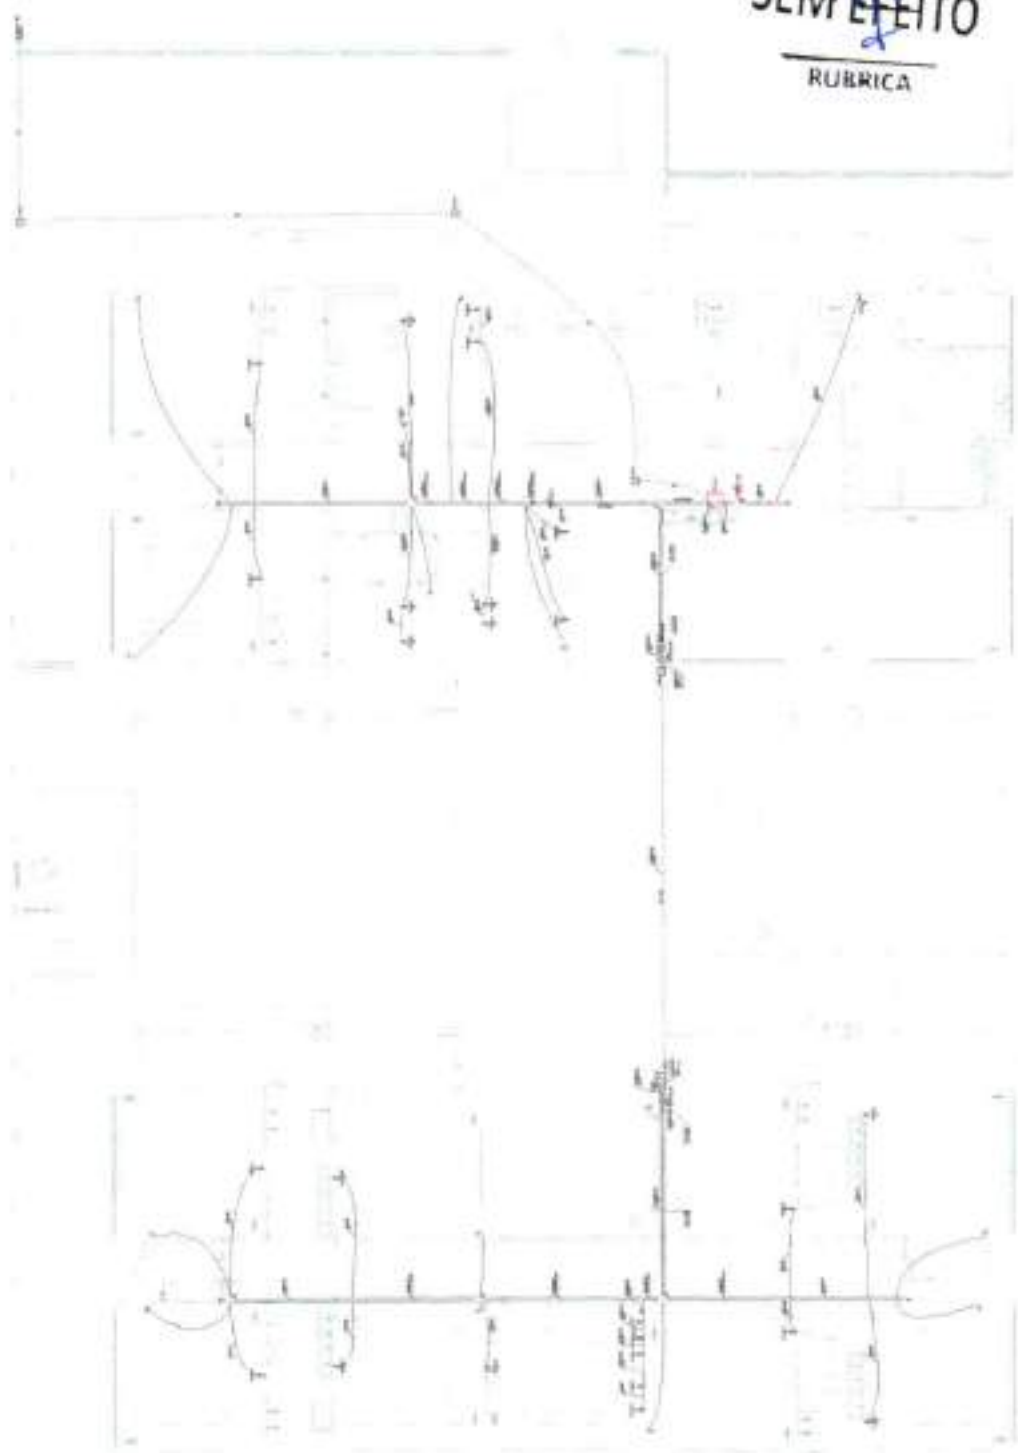

PROJETO DE PLANEJAMENTO
OBJETIVO: ELABORAR O PLANO DE TRABALHO PARA O ANO 2024
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO PARA O ANO 2024
RESULTADO ESPERADO: ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO 2024

PROJETO DE PLANEJAMENTO
OBJETIVO: ELABORAR O PLANO DE TRABALHO PARA O ANO 2024
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO PARA O ANO 2024
RESULTADO ESPERADO: ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO 2024

PROJETO DE PLANEJAMENTO
OBJETIVO: ELABORAR O PLANO DE TRABALHO PARA O ANO 2024
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO PARA O ANO 2024
RESULTADO ESPERADO: ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO 2024

PROJETO DE PLANEJAMENTO

OBJETIVO: ELABORAR O PLANO DE TRABALHO PARA O ANO 2024

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO PARA O ANO 2024

RESULTADO ESPERADO: ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO 2024

PROJETO DE PLANEJAMENTO


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

SAMUEL
PORTARIA 157 2024
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 959
RUBRICA

PROJETO DE PLANEJAMENTO

PROJETO DE PLANEJAMENTO
OBJETIVO: ELABORAR O PLANO DE TRABALHO PARA O ANO 2024
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO PARA O ANO 2024
RESULTADO ESPERADO: ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO 2024

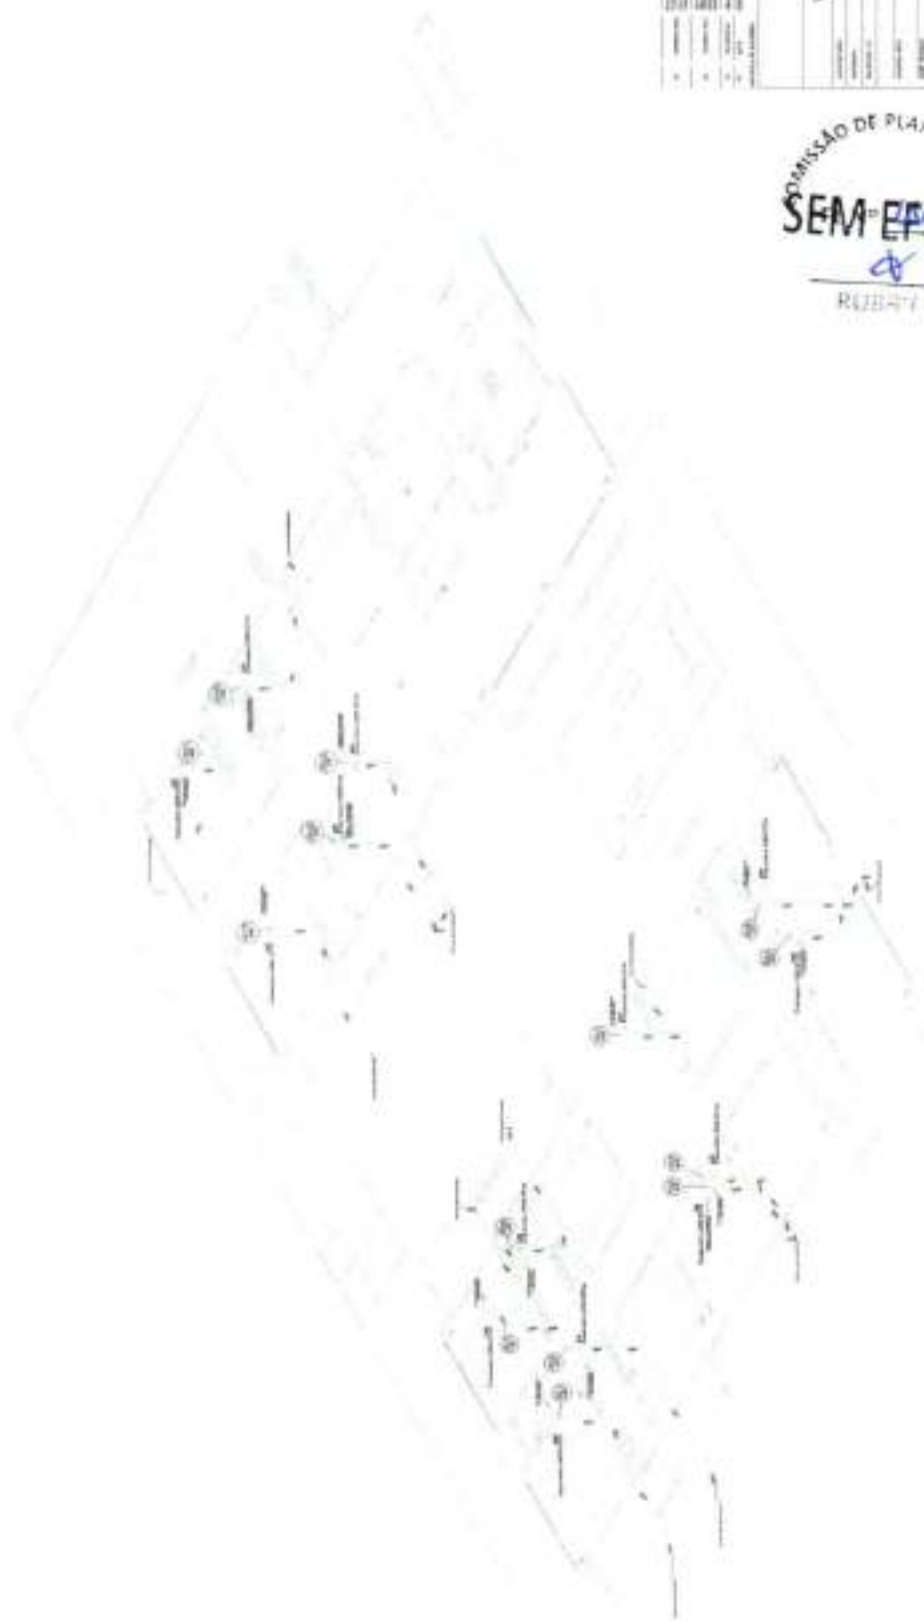

Abstract

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RESOLUÇÃO 7

Santitas
SANTITAS PAIN
PORTARIA
CREA CE
CO.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. Nº 968
RUBRICA

[illegible]

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

...

...

FADE

PROJETO INICIAL - INDE

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


...





...

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

SARILE VASIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREC. CE 379384

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 904
RUBRICA

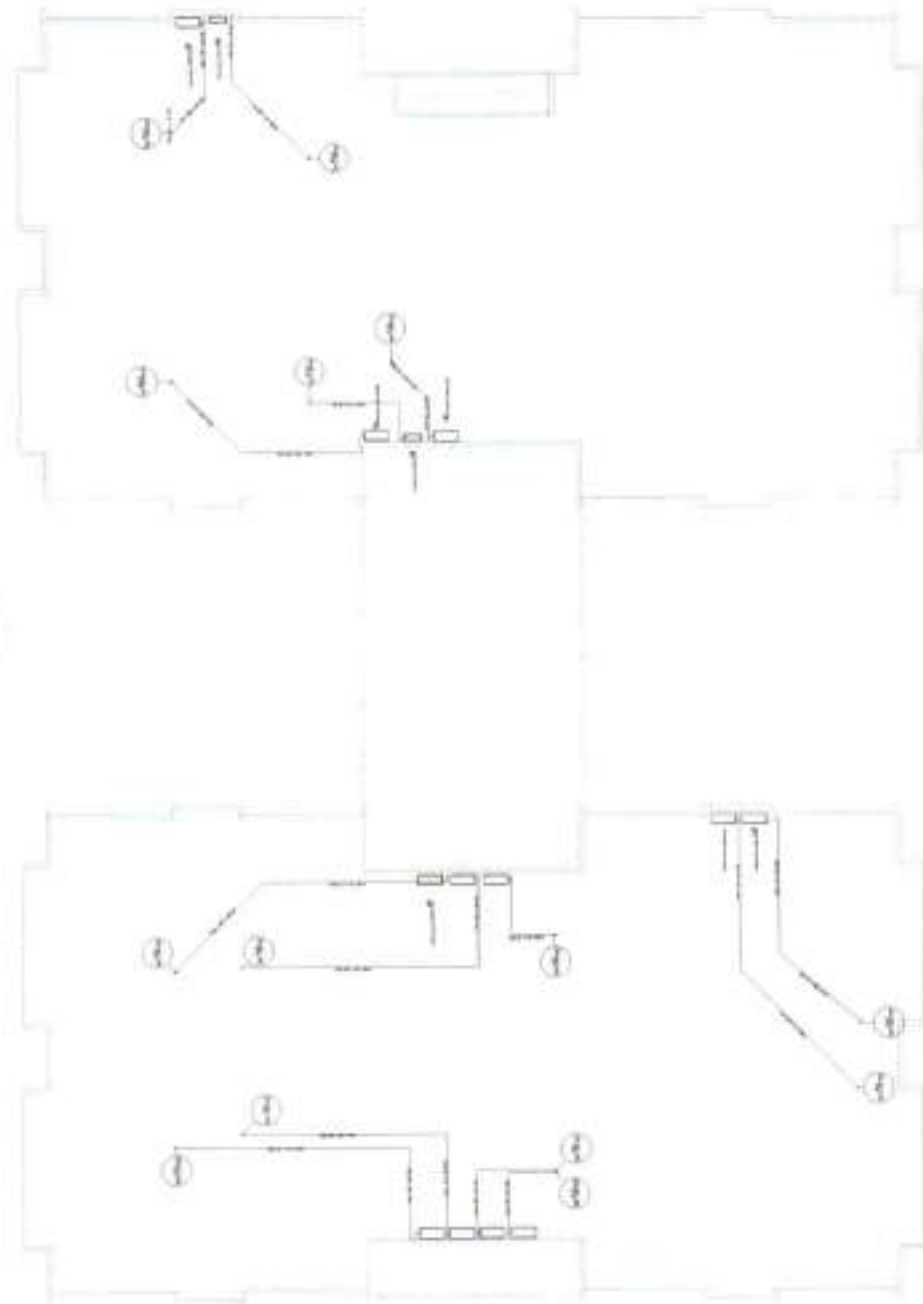

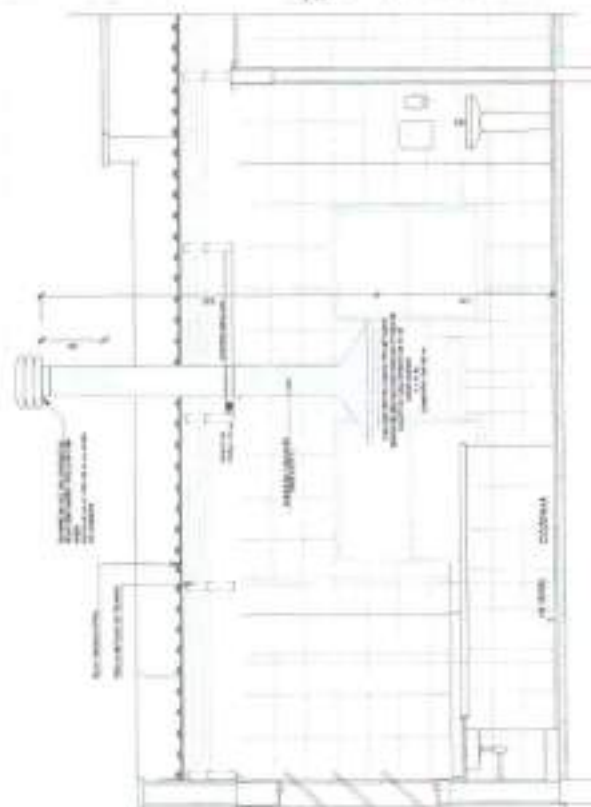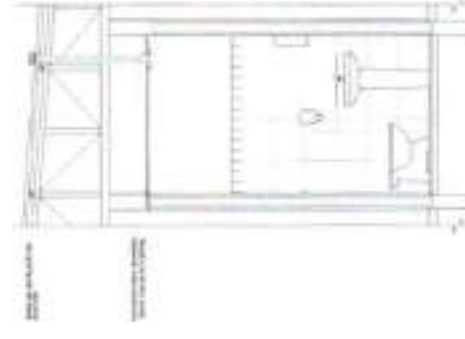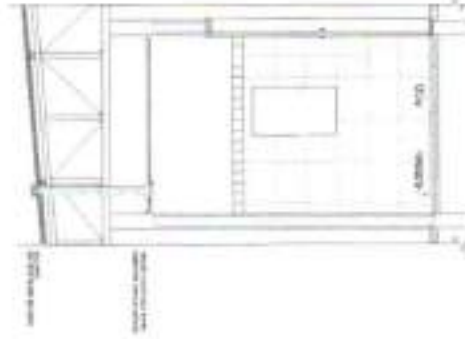[illegible]

FADE
MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PROJETO PAMPA - FINE

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
SEM EFEITO
RUBRICA

RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 965

CRECHE PRÉ-ESCOLA
QUINTO DE EXATidão MECÂNICA

CRÉDITO ESCOLA Nº 1
PROJETO DE QUALIFICAÇÃO MECÂNICA

© 2000 Blackwell Science Ltd



© 2000 Blackwell Science Ltd

KEY

DETALHE - TUBULAO VERTICAL E EQUIPAMENTO

SATILLE PAIVA OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREC 00 170184

1000

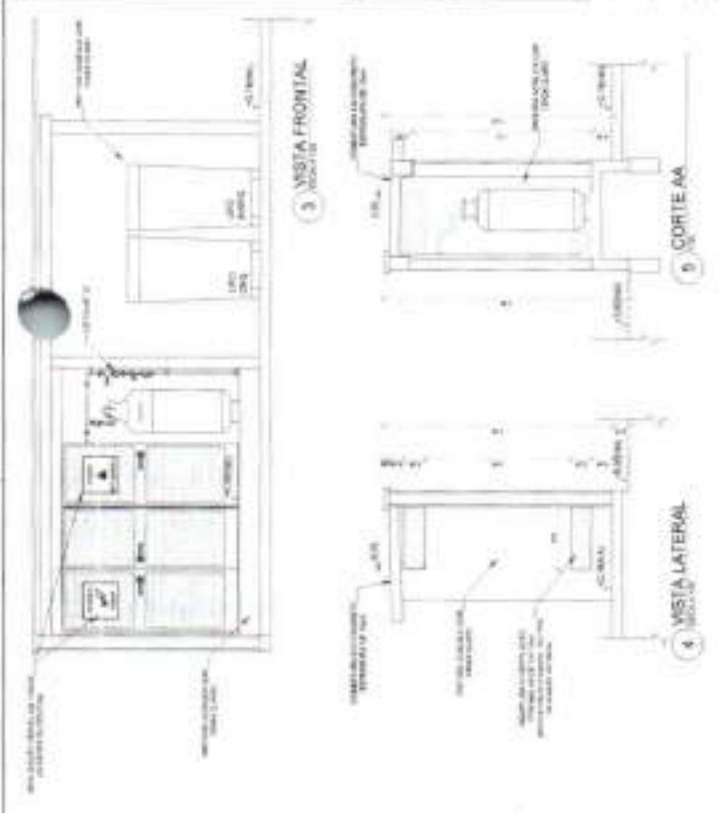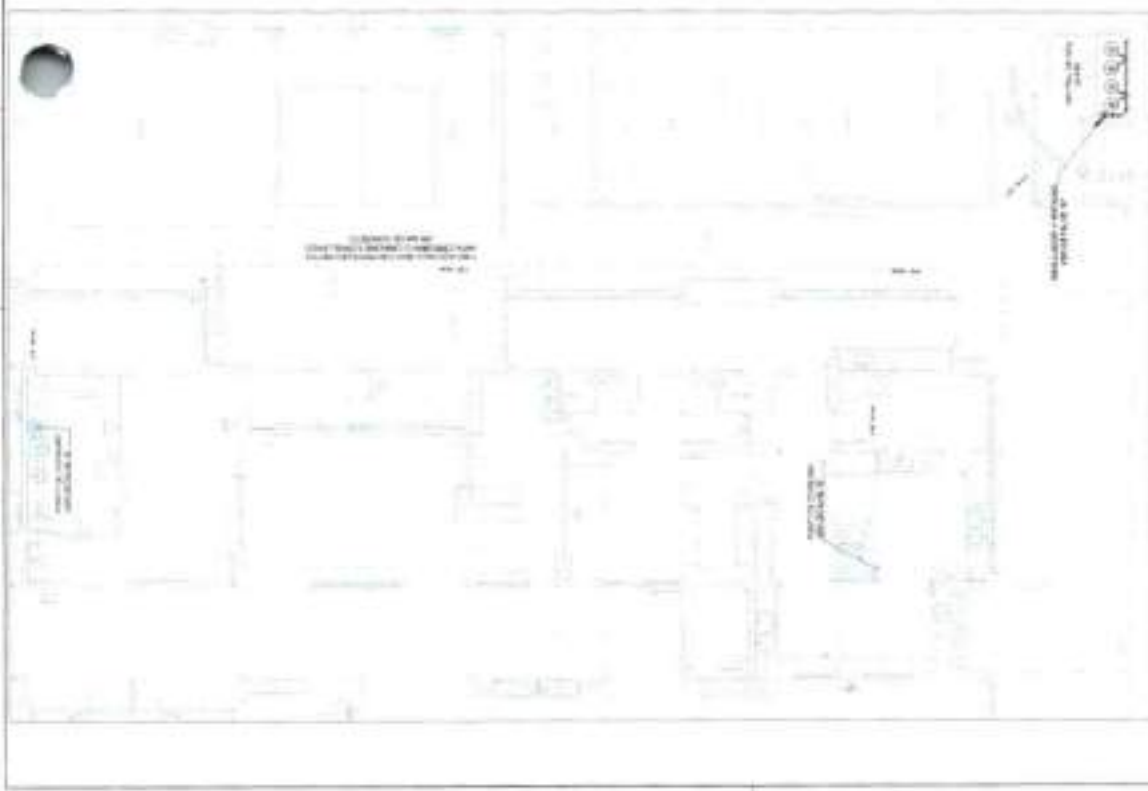


LEGENDA

— LINHA DE PROJETO

— LINHA DE EXECUÇÃO

BRUNO OLIVEIRA
PORTARIA 157 2025
CREA CE 370384

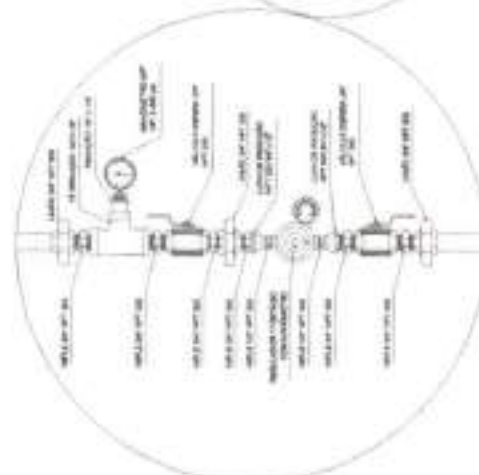

REGULADOR DE 1º ESTÁGIO

REGULADOR DE 1º ESTÁGIO

INFORMAÇÕES GERAIS

1. O presente projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas vigentes e as especificações do cliente.

2. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente e não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões.

3. O projeto é válido apenas para o local e finalidade especificadas no contrato.

4. Qualquer alteração no projeto deve ser aprovada por escrito pelo cliente.

5. O projeto não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido das informações.

6. O projeto é propriedade intelectual do autor e não pode ser reproduzido sem a devida autorização.

7. O projeto é válido apenas para o local e finalidade especificadas no contrato.

8. O projeto não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido das informações.

9. O projeto é propriedade intelectual do autor e não pode ser reproduzido sem a devida autorização.

10. O projeto é válido apenas para o local e finalidade especificadas no contrato.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

FL No 000

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

SEM EFEITO

RUBRICA

PROJETO PADRÃO - FNDE

FNDE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROJETO DE GAS COMBUSTÍVEL

MGC

01/01

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO I, CONFORME CONVÊNIO Nº 962027/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES

ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS

A partir das planilhas orçamentárias, cabe também elaborar a Curva ABC, assim definida no manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas do TCU:

2.19 Curva ou Classificação ABC de Serviços: tabela obtida a partir da planilha orçamentária da obra, na qual os itens do orçamento são agrupados e, posteriormente, ordenados por sua importância relativa de preço total, em ordem decrescente, determinando-se o peso percentual do valor de cada um em relação ao valor total do orçamento, calculando-se em seguida os valores percentuais acumulados desses pesos. (...)

A importância da curva ABC reside na análise das planilhas orçamentárias. É relativamente frequente a existência de orçamentos com grande quantidade de itens de serviço distintos. Em tais circunstâncias, a curva ABC de serviços permite a avaliação global do orçamento com o exame de apenas uma parte dos serviços. (...)

2.20 Curva ABC de insumos: apresenta todos os insumos da obra (material, mão de obra e equipamentos) classificados em ordem decrescente de relevância. Para sua confecção, necessita-se da composição de custos unitários de todos os serviços da obra para o agrupamento dos insumos similares de cada serviço.

A curva ABC de insumos é uma ferramenta que cria várias facilidades para a orçamentação de uma obra, proporcionando que o orçamentista refine o orçamento mediante pesquisa de mercado dos insumos mais significativos. Também auxilia no planejamento e programação de obras, pois fornece o efetivo de mão de obra e a quantidade dos diversos tipos de equipamentos necessários para a execução da obra.

No caso, uma das funções principais da Curva ABC é definir as parcelas mais relevantes da contratação sob o prisma econômico, a fim de permitir a indicação dos serviços cuja execução prévia deverá ser comprovada nos atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante (requisito de qualificação técnica).

Do ponto de vista prático, a relevância desse documento pode ser assim resumida: Indicar os itens em relação aos quais se deve exigir atestados; indicar o percentual que será solicitado nos atestados (até 50% - Conforme Art. 67, § 2º da Lei de Licitações nº 14.133/21). Desta maneira resta claro a justificativa para a escolha das parcelas de maior relevância.


Samuel
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

DA LEGISLAÇÃO E DAS JURISPRUDÊNCIAS

O que traz a lei sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo para o projeto em comento, conforme dispõe a legislação de regência e entendimento sumular do Tribunal de Contas da União - TCU, in verbis.

Lei 14.133 e suas alterações posteriores.

"Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

§ 1º A exigência de atestados será restrita às **parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação**, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. **(grifo nosso)**

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, **será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo**, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados." **(grifo nosso)**

Súmula nº 263/2011 do Tribunal de Contas da União - TCU.

"Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado."

CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL (PROFISSIONAL)

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UND
3.1	101096	TUBULAÇÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, EXCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA	M³
4.29	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANBSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES. AF_01/2020_PSA	KG
7.1	FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUMÉ, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUIR ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRÉ-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM.	M²

9.14	FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625X625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE – INSTALADO.	M ²
10.9	FNDE 300	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA.	M ²

OBS: Através de Certidão de Acervo Técnico do Profissional.

CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL (EMPRESA)

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UND	QTD	%
3.1	101096	TUBULAÇÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, EXCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA	M ³	17,18	50%
4.29	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES. AF_01/2020_PSA	KG	9503,00	50%
7.1	FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUIR ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRÉ-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM.	M ²	720,50	50%
9.14	FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625X625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE – INSTALADO.	M ²	368,19	50%
10.9	FNDE 300	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA.	M ²	110,06	50%

OBS: ATRAVÉS DE ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, PERMITINDO-SE A SOMA DAS QUANTIDADES DOS ITENS DE PARCELA DE RELEVÂNCIA DOS ATESTADOS PARA ATENDIMENTO DA QUANTIDADE NECESSÁRIA.

Sendo o que se é adequado ao projeto e a Lei.

Guaraciaba do Norte/CE, 10 de junho de 2025


SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
Portaria 157/2025
CREA/CE 379384
