

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

AV. DOM LINO, Nº 831 - CENTRO

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS**

TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, Nº 001 - CENTRO



**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA NA ZONA
RURAL NO MUNICÍPIO DE RUSSAS CE. PT – 1089387-11.
CONV. 947539**

Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00'
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3

sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br
engenharia.russas@hotmail.com

Sumário	
APRESENTAÇÃO.....	3
EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL	3
LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.....	4
CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA	5
Considerações Gerais:	5
Localização do empreendimento:.....	6
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	9
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	10
PROJETO GEOMÉTRICO	11
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	11
PROJETO DE DRENAGEM.....	12
PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS	13
Orçamento Básico:	13
Fonte de Preços e Tabelas utilizadas:	13
Curva ABC:.....	14
Cronograma Físico Financeiro:.....	14
Memória de Cálculo dos Quantitativos:	14
Composição do BDI	14
Encargos Sociais	14
Composições de Preços	15
PREMISSAS PARA LICITAÇÃO	15
Regime de execução	15
Prazos.....	16
Classificação:	16
Acervo Técnico sugerido	16
ORÇAMENTO COMPARATIVO	Erro! Indicador não definido.
CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.....	17
Normas.....	17
Materiais	17
Mão de Obra.....	18
Assistência Técnica e Administrativa	18
Despesas Indiretas e Encargos Sociais	18
Condições de Trabalho e Segurança da Obra	18
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA	19

Assinado digitalmente por
 KATYANNE MARQUES
 MENDONCA:05293123360
 Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00"
 KATYANNE MARQUES MENDONÇA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA/CE 061801664-3

APRESENTAÇÃO

Esse trabalho se propõe a descrever adequadamente a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE RUSSAS CE**, fornecendo informações importantes para execução da obra.

A obra deverá ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, à Lei 14.133/21 e ao edital e seus anexos, compostos pelos projetos, especificações, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

O relatório tem como finalidades:

- Apresentar soluções econômicas e viáveis para o problema ao nível de projeto executivo;
- Fornecer estimativas das quantidades dos serviços e custos das obras definidas para o Projeto da referida área;
- Fornecer peças gráficas (plantas baixas, cortes, seções e detalhes), memorial de cálculo e especificações técnicas.

O Relatório contém os seguintes capítulos:

- **Memorial Descritivo:**

- Apresenta a estrutura do relatório, o resumo do projeto e a equipe que participou da elaboração do projeto, localiza e situação descreve os estudos e projetos desenvolvidos, especificações técnicas

- **Orçamentação:**

- Descreve as definições e apresenta o Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial de Cálculo dos Quantitativos, Curva ABC, Fonte de Preços, Composições de Preço Unitário, Cotações de Preço, Composição do BDI, Composição dos Encargos Sociais.

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

- **Engenheira Civil Responsável:**

Katyanne Marques Mendonça

- **Co-Participação:**

Francisco Emerson Martins de Almeida – Engenheiro Civil

- **Engenheira Fiscal:**



Katyanne Marques Mendonça

KATYANNE MARQUES
MENDONÇA:05293123360
Assinado digitalmente por KATYANNE MARQUES
MENDONÇA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00'
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3



LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

O município está localizado conforme os mapas abaixo:

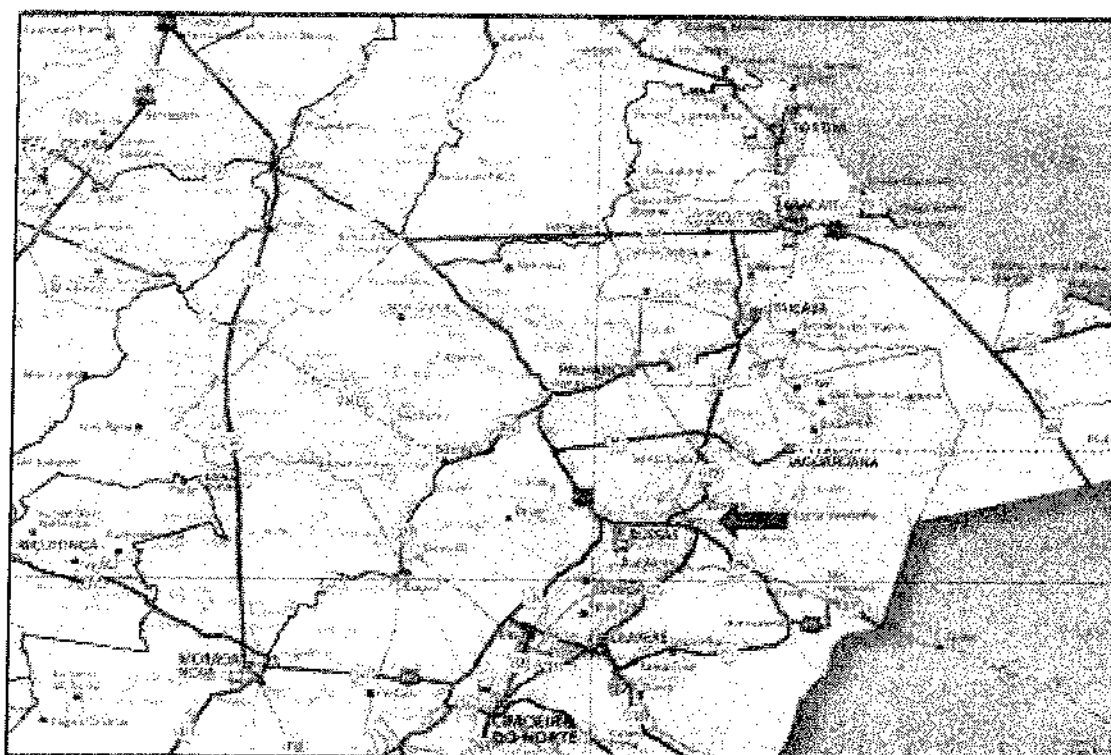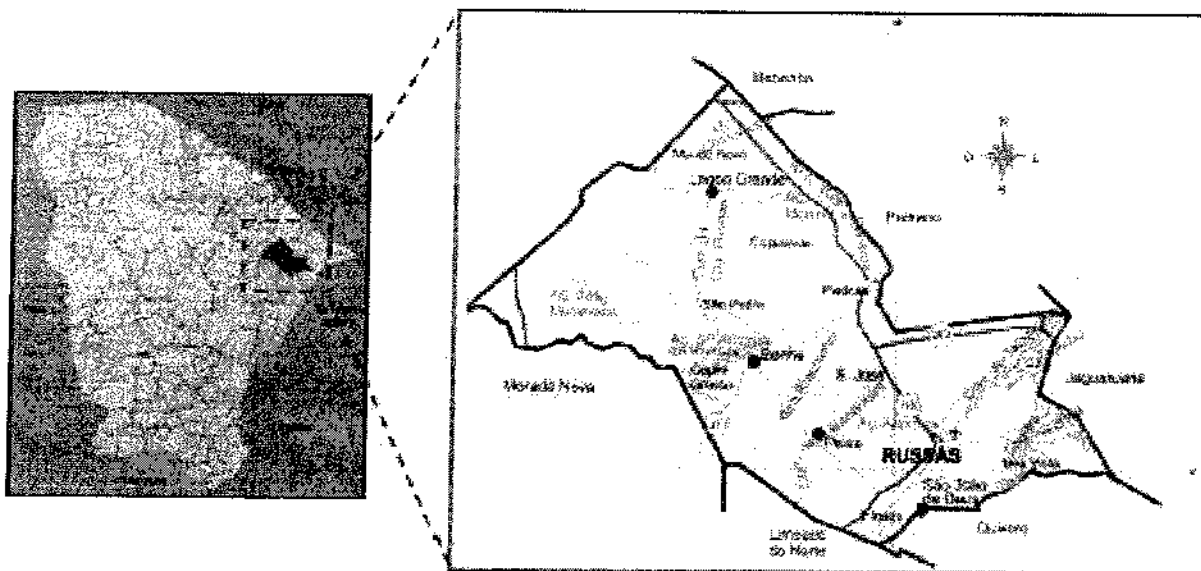

Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONÇA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00'
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/C 061801664-3

sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br
engenharia.russas@hotmail.com

CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA

Considerações Gerais:

Trata-se de um projeto que tem por objetivo a pavimentação em pedra poliédrica na zona rural de Russas/Ce, PT- 1089387-11.

As vias deverão ser pavimentadas de acordo com as larguras e extensões projetadas, podendo estas dimensões serem observadas nas Peças Gráficas da via, com a Planta com Estaqueamento, as dimensões da seção da via, bem como perfil longitudinal.

As dimensões também poderão ser observadas no quadro de memória de quantitativos da rua. O construtor, para executar a obra, deverá levar em consideração estas duas peças. Para melhor organizar as peças gráficas e planejamento, existe uma prancha de localização que identifica onde acontecerão as intervenções.

As vias contempladas no projeto não possuem pavimentação e os projetos a serem executados nas mesmas serão: Pavimentação em pedra poliédrica e drenagem.

IMPORTÂNCIA DA OBRA:

- Melhorar a mobilidade urbana e rural, proporcionando vias de acesso mais seguras, duráveis e confortáveis para os moradores.
- Reduzir os impactos negativos causados pela poeira e pelos alagamentos, melhorando a qualidade de vida e a saúde da população.
- Fomentar o desenvolvimento socioeconômico local, facilitando o escoamento de produtos agrícolas e o transporte de pessoas, o que pode estimular o comércio e outras atividades econômicas.
- Gerar emprego e renda durante a execução do projeto, com a utilização de mão de obra local e empresas contratadas para o serviço de pavimentação.
- Escoamento de produtos ceramistas (telha e tijolo, visto que nas referidas comunidades há uma grande incidência de indústrias ceramistas).
- Fortalecer o acesso aos serviços públicos, como transporte escolar, saúde e segurança.

KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00'
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

AV. DOM LINO, N° 831 - CENTRO

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS**

TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, N° 001 - CENTRO



Localização dos empreendimentos:

SÍTIO BOM SUCESSO

Coordenadas Geográficas:

INÍCIO: 4°55'15.11"S, 37°56'54.98"O


FINAL: 4°54'43.16"S, 37°56'29.30"O

Endereço: Sítio Bom Sucesso

Bairro: Zona Rural

CEP: 62900-000

Cidade: Russas/CE

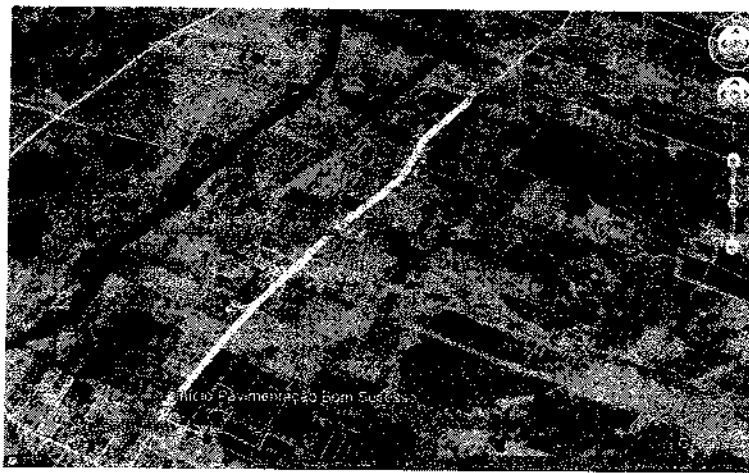

Fonte: Google Earth – data da imagem 11/03/2025

IPEPACONHA

Coordenadas Geográficas:

INÍCIO: 4°55'48.59"S, 37°56'44.21"O


FINAL: 4°55'29.16"S, 37°56'31.36"O

Endereço: Sítio Ipepaconha

Bairro: Zona Rural

CEP: 62900-000

Cidade: Russas/CE

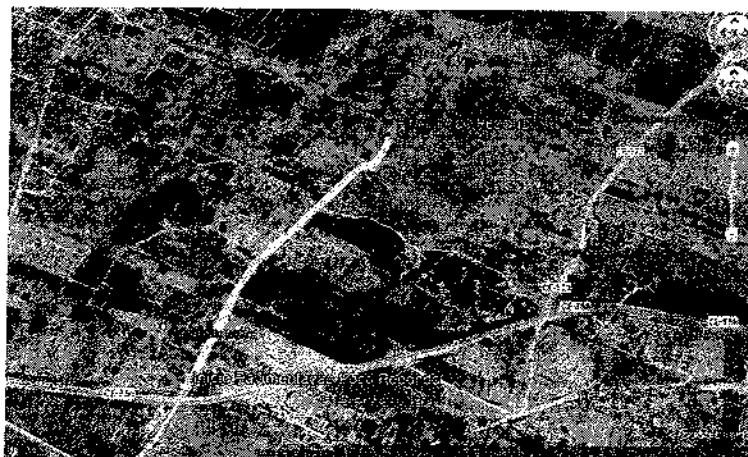

Fonte: Google Earth – data da imagem 11/03/2025

KATYANNE MARQUES
MENDONÇA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00"

KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

AV. DOM LINO, N° 531 - CENTRO

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS**

TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, N° 001 - CENTRO



SÍTIO INGÁ

Coordenadas Geográficas:


INÍCIO: 4°57'21.76"S, 37°56'48.54"O

FINAL: 4°56'3.57"S, 37°57'2.27"O

Bairro: Zona Rural

CEP: 62900-000

Cidade: Russas/CE

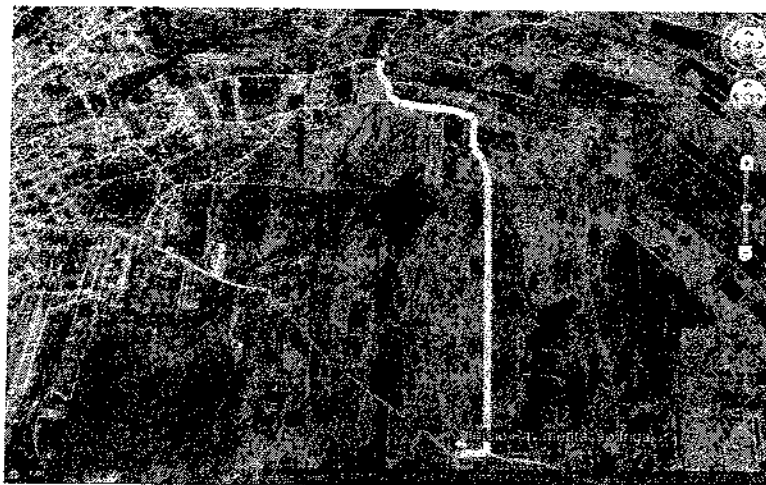

Fonte: Google Earth – data da imagem 11/03/2025

RAMAL DE FLORES

Coordenadas Geográficas:

INÍCIO: 5°3'18.13"S, 38°4'9.34"O

FINAL: 5°3'39.20"S, 38°4'24.72"O

Bairro: Zona Rural

CEP: 62900-000

Cidade: Russas/CE



Fonte: Google Earth – data da imagem 11/03/2025

KATYANNE MARQUES
MENDONÇA:05293123360
Assinado digitalmente por KATYANNE MARQUES
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00'
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

AV. DOM LINO, N° 831 - CENTRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS




TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, N° 001 - CENTRO





QUADRO DE ÁREAS						
Item	Alinhamento	Comprimento (m)	Largeza (m)	Área regularização (m²)	Área pavimentação (m²)	Méto de (m)
1.0	SÍTIO DOM SUCESSE					
1.1	Trecho 01	1.920,00	7,00	13.440,00	11.980,00	3.840,00
2.0	DEPAÇONHA					
2.1	Trecho 01	550,00	5,00	3.350,00	2.934,40	1.120,00
2.2	Trecho 02	218,00	5,00	1.090,00	924,32	436,00
2.3	Depaçonha extensão (superfície) faixa de aceleração e desaceleração	846,97		846,97	735,17	416,02
3.0	SÍTIO INGA					
3.1	Trecho 01	1.740,00	7,50	13.050,00	11.727,60	3.430,00
3.2	Trecho 02	150,00	6,50	975,00	861,00	300,00
3.3	Trecho 03	1.000,00	6,00	6.000,00	5.240,00	2.000,00
3.4	Trecho 04	106,05	6,50	692,83	602,93	210,10
5.0	RAMAL DE FLORES					
5.1	SDO 01	172,48	6,00	1.034,88	903,80	344,96
5.2	SDO 02	98,37	7,00	688,59	520,07	198,74
5.3	SDO 03	181,41	6,00	1.088,46	950,59	362,62
5.4	Trav. Francisco Antonio - Trecho 01	630,00	7,00	4.410,00	3.858,30	1.240,00
5.5	Trav. Francisco Antonio - Trecho 02	230,00	6,50	1.495,00	1.320,20	460,00
5.6	Trav. Francisco Antonio - Trecho 03	112,00	6,00	672,00	586,88	224,00
5.7	Trav. Francisco Antonio - Trecho 04	758,95		758,95	610,55	528,00
TOTAL GERAL		49.542,88		49.542,88	43.457,16	15.180,64

KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Assinado digitalmente por KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00"
KATYANNE MARQUES MENDONCA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

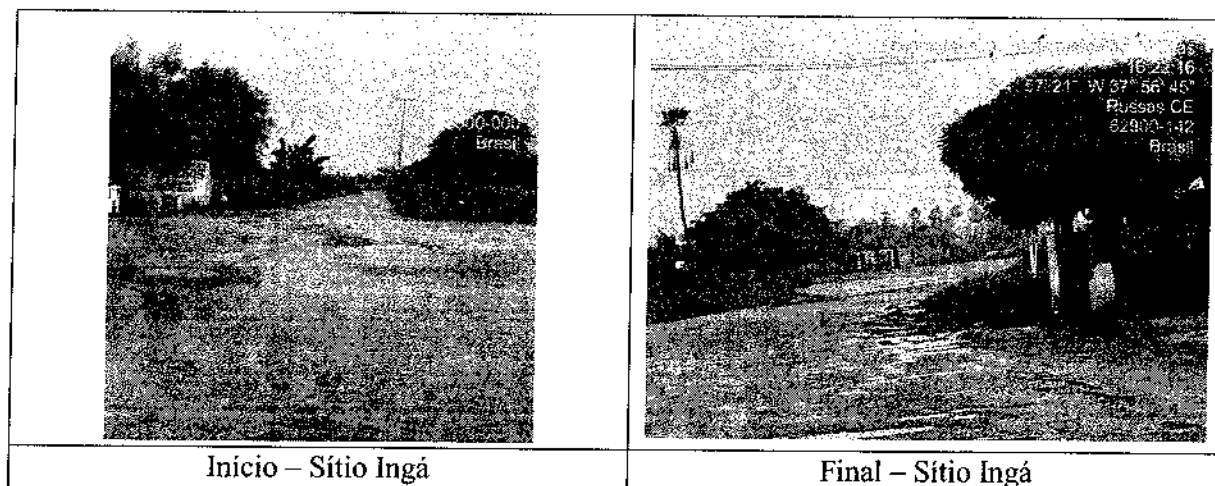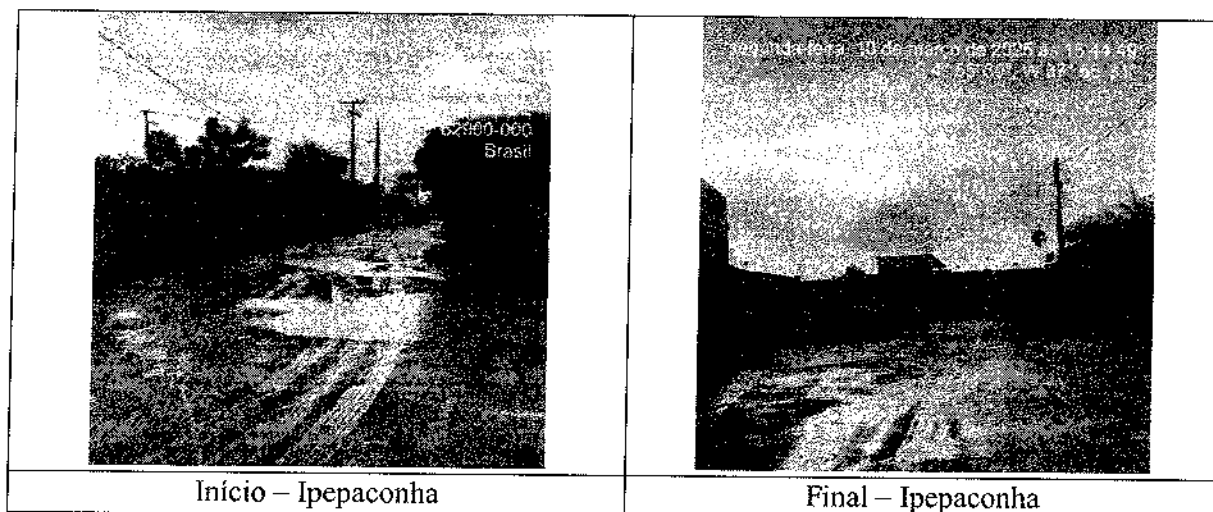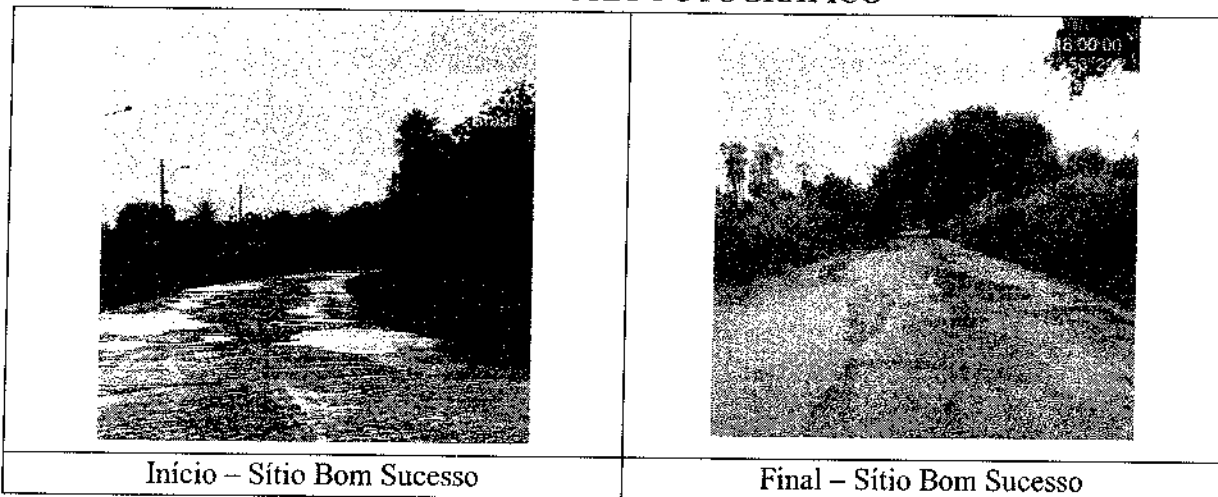

KATYANNE MARQUES Assinado digitalmente por
MENDONÇA:05293123360 KATYANNE MARQUES
 Date: 2025.10.23 16:39:30-03'00'
 KATYANNE MARQUES MENDONÇA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA/CE 061801664-3

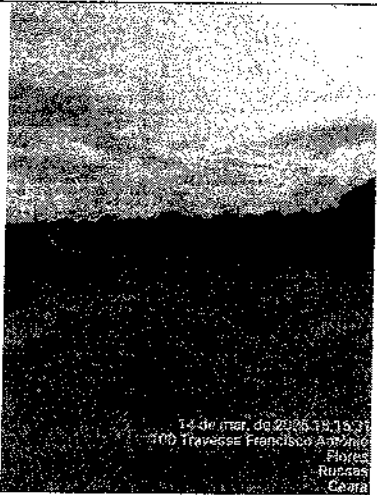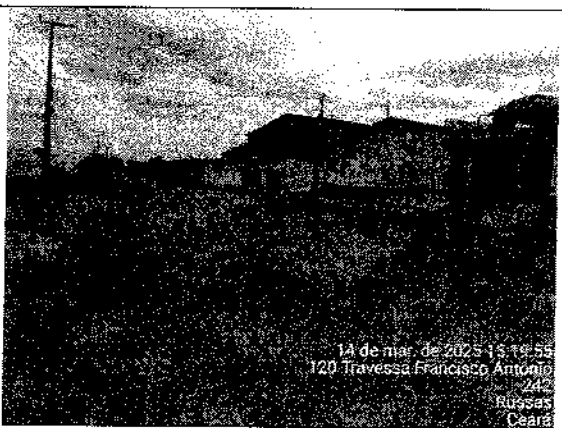 14 de mar. de 2025 15:15:39 120 Travessa Francisco Antônio Flores Russas Ceará	 14 de mar. de 2025 15:19:55 120 Travessa Francisco Antônio 242 Russas Ceará
Início – Ramal de Flores	Final – Ramal de Flores

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Os estudos topográficos foram realizados pela equipe de topografia do município, onde os serviços foram executados de acordo com as Instruções de Serviço para Estudo Topográfico para Implantação e Pavimentação de Rodovias contidas no Manual de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DNIT.

Os estudos topográficos, executados pela Prefeitura Municipal, foram desenvolvidos basicamente a partir da execução das seguintes atividades:

- Locação dos Eixos da rua objeto de intervenção;
- Seções Transversais;
- Amarrações do Eixo;
- Levantamentos Especiais, Cadastro, Drenagem, Pavimento Existente, etc.;

PROJETO GEOMÉTRICO

Este projeto estabelecerá a caracterização geométrica da via – Eixo Principal, através da determinação dos parâmetros geométricos de seus alinhamentos, horizontal e vertical e seção transversal-tipo.

Os elementos utilizados no desenvolvimento do Projeto Geométrico foram obtidos através do levantamento topográfico. Estes dados serviram de base para a elaboração do projeto em planta e perfil, assim como, para a definição das características técnicas e operacionais, tendo-se adotado a seguinte metodologia:

KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00"
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3



- Os alinhamentos horizontais foram definidos de acordo com a topografia local.
- Os alinhamentos verticais foram posicionados próximos às cotas do terreno natural buscando minimizar, na medida do possível, a movimentação de terras e respeitando as rampas e concordância de curvas verticais mínimas, recomendadas pelas normas vigentes. Foram também observadas as alternativas a drenagem e as concordâncias entre as vias projetadas.
- O greide projetado foi lançado adotando uma rampa máxima de 10,00% e mínima de 0,5%.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Considerações Gerais

O Projeto de Pavimentação foi elaborado de acordo com as recomendações contidas nos termos de Referência e nas Normas de Procedimento para Projetos de Pavimentação da SOP.

Concepção do Projeto de Pavimentação

- Estrutura do Pavimento adotado
 - Camada de Base: Conjunto Paralelepípedo granítico ou basáltico + Colchão de Areia (h=20cm)
 - Subleito: Regularização do Subleito (Corte e/ou Aterro até 20cm)
- **Estudo de concepção da Pavimentação em Paralelepípedo**
- O pavimento constituído por Pedra assume vantagens mais evidentes onde os volumes de tráfego são pequenos, as condições geométricas ou de drenagem são muito exigentes, os subleitos muito fracos ("argilitos turfas"), ou, ainda, em condições muito severas de uso como em terminais de transporte, postos de gasolina, etc., onde os derramamentos de combustíveis e os esforços de arranque, deterioram rapidamente as misturas asfálticas.
- A execução deste tipo de pavimento não requer mão de obra especializada ou equipamentos sofisticados, podendo ser empregada mão de obra semi-qualificada (calceteiros) e sem qualificação (ajudantes) através de pequena estrutura, num ritmo compatível com o aporte de recursos, otimizando o aproveitamento da mão-de-obra segundo as peculiaridades e sazonalidades da economia da região.
- Excluídas as falhas ou insuficiências das camadas inferiores do pavimento, a superfície de rolamento constituída por Pedras de rocha, adequadamente selecionada e cortada, apresenta

KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Assinado digitalmente por KATYANNE MARQUES
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00"
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3



uma duração ilimitada. Esta resistência se estende a ação dos solventes desprendidos pelos veículos (diesel, gasolina, etc.)

- As características de flexibilidade e maleabilidade deste tipo de pavimento assimilam e distribuem bem, condições inferiores do leito estradal, sejam oriundas da má preparação e execução das camadas inferiores do pavimento ou problemas decorrentes da existência de água no subleito e/ou solos inadequados na fundação.
- A manutenção é realizada de forma rápida e eficiente através de equipes pequenas, dispensando o uso de máquinas, com integral reaproveitamento dos materiais, que são reassentados no local após a recuperação da infraestrutura.
- A determinação da espessura dos pavimentos construídos em pedra sempre foi uma questão essencialmente prática. A experiência em cada região, com suas características de solos e clima é que permite, depois de mais de uma centena de anos em emprego sistemático desses pavimentos, que se estabeleça relações empíricas entre o tráfego, o tipo de solo do subleito e a espessura total do pavimento.
- **Materiais para Pavimentação**
- O calçamento será executado com paralelo proveniente de pedreiras da região. Todo o material indicado na pavimentação será adquirido e transportado comercialmente.
- O colchão será executado exclusivamente com areia na espessura mínima de 20,0 cm.

PROJETO DE DRENAGEM

O Projeto de Drenagem foi elaborado com o objetivo dotar as vias de um sistema de drenagem eficiente, capaz de suportar as precipitações pluviométricas que caem na região. Para a drenagem superficial a implantação de meios fios e sarjetas de concreto se mostram eficientes para dar vazão às águas provenientes dos terrenos lindeiros da via.

PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Orçamento Básico:

Neste capítulo apresentaremos a definição de todas as planilhas relativas à orçamentação da obra, bem como todas as premissas básicas para sua elaboração.

KATYANNE MARQUES
MENDONÇA:05293123360
Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONÇA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00'
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3

Ao final deste relatório apresentaremos sequencialmente as seguintes planilhas:

- Planilha Orçamentária
- Planilha Orçamentária – Custo Direto
- Resumo do Orçamento
- Relatório Analítico – Composição de Custos
- Curva ABC dos Serviços
- Cronograma Físico Financeiro;
- Detalhamento da Composição do BDI;
- Detalhamento da Composição dos Encargos Sociais;
- Memória de Cálculo de Quantitativos;

O orçamento é a avaliação do custo de uma determinada obra ou serviço de engenharia a ser executado, onde são discriminados todos os serviços e materiais pertinentes e necessários à execução da obra. É a relação discriminada de serviços com os respectivos preços, unidades, quantidades, preços unitários, valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das quantidades pelos preços unitários.

Os preços orçados consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legislação em vigor, incidentes sobre o custo da mão de obra.

Fonte de Preços e Tabelas utilizadas:

Para elaboração deste orçamento adotou-se os preços básicos e oficiais das seguintes tabelas de Preço:

- Tabela **SEINFRA 28** vigente sem desoneração (Disponível e publicada no site da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará - <https://www.seinfra.ce.gov.br/tabela-de-custos>);
- Tabela **SINAPI/CE 01/2025** sem desoneração (Disponível e publicada no site da Caixa Econômica Federal - <http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi>);
- Tabela **SICRO NOVO 01/2025** sem desoneração (Disponível e publicado no site do DNIT- https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/nordeste/nordeste)

KATYANNE MARQUES. Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360 MENDONCA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00'
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3



Curva ABC:

A curva ABC é a categorização dos serviços de maiores valores ao de menores valores, classificando-os de A a C, onde na coluna A são os serviços de maiores valores, na coluna B os serviços de valor médio e na coluna C os serviços de menor valor.

Cronograma Físico Financeiro:

O cronograma físico e financeiro, propomos o avanço físico e o avanço financeiro da obra. No cronograma físico determinamos o avanço esperado da obra e no cronograma financeiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento.

O tempo de duração proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com as mesmas características realizadas pela Prefeitura Municipal.

O Cronograma físico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Memória de Cálculo dos Quantitativos:

O levantamento de quantitativos é o processo de determinar a quantidade de cada um dos serviços de um projeto, tendo como objetivo dar informações sobre a preparação do orçamento. A memória de cálculo de quantitativos demonstra de forma clara e transparente o método de cálculo para se calcular a quantidade de cada item orçado.

A Memória de Cálculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Composição do BDI

O BDI é a taxa de Bonificação e Despesas Indiretas das Obras. É um elemento primordial no processo de formação do preço final pois representa parcela relevante no valor final da obra.

A Súmula nº 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do BDI deve compor o orçamento-base e as propostas das licitantes. No Estado do Ceará a apresentação do detalhamento do BDI no orçamento-base ganhou respaldo com a Resolução do TCE-CE nº 2.206/2012.

Para a obra em questão a Prefeitura Municipal adota na Composição do BDI o método e todos os limites propostos no Acórdão 2622/13 – TCU Plenário. O detalhamento do BDI segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Encargos Sociais

A Súmula nº 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamento de encargos sociais deve compor o orçamento-base e as propostas das licitantes. Para tanto, o Município utilizou-se da Composição de Encargos Sociais emitida pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA) na ocasião da publicação da Tabela de

KATYANNE MARQUES
MENDONÇA:05293123360
Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONÇA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00'
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3

Preços Básicos utilizada para ser fonte de preços deste orçamento. O detalhamento dos Encargos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Composições de Preços

As composições de custo unitário de serviços estão apresentadas com a discriminação separada de material e mão de obra, mostrando no final a somatória. A Súmula nº 258/2010, do TCU, passou a exigir que as composições de custos unitários devem compor o orçamento-base e as propostas das licitantes. Neste relatório constam as seguintes composições:

- Composições de Preços Unitárias (CPU) de Serviços constantes nas Tabelas Oficiais adotadas na Elaboração deste orçamento;

PREMISSAS PARA LICITAÇÃO

Modalidade

Em conformidade com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para a Administração Pública, se faz jus a utilização da modalidade concorrência para a execução da obra conforme os seguintes argumentos:

- **Ampla Participação e Competitividade:** A modalidade concorrência é a mais adequada para garantir a ampla participação de licitantes, promovendo maior competitividade e transparência no processo licitatório, conforme preconizado nos artigos 28 e 29 da Lei nº 14.133/2021.
- **Critério de Julgamento pelo Menor Preço:** A concorrência permite a adoção do critério de menor preço, assegurando a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em alinhamento com os princípios de economicidade e eficiência previstos na lei.
- **Complexidade e Valor da Obra:** Considerando a relevância e o valor estimado da obra de pavimentação, a modalidade concorrência se revela apropriada para assegurar a contratação de empresa com comprovada capacidade técnica e financeira, minimizando riscos de execução.

Adicionalmente, em observância ao artigo 24, §3º da referida lei, o orçamento estimado da obra não terá caráter sigiloso, estando disponível para consulta pública. Esta medida visa garantir a transparência e permitir a fiscalização social, fortalecendo a confiança na gestão dos recursos públicos.

Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00'
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3

Regime de execução

O regime de execução utilizado será **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, cuja a contratação da execução da obra ou do serviço se faz por preço certo de unidades determinadas. A escolha do regime se deu pela complexidade do empreendimento.

Prazos

- Ordem de serviço:
Sugere-se que a ordem de serviço seja realizada em um intervalo de 45 dias.
- Entrega temporária:
Será necessário um prazo de 15 dias para o recebimento temporário pelo fiscal da obra.
- Entrega definitiva:
Será necessário um prazo de 30 dias para o recebimento definitivo pelo gestor do contrato.

Classificação:

O empreendimento se trata de uma **OBRA**, pois envolve intervenções no meio ambiente, por meio de um conjunto harmônico de ações, realizadas por profissionais de arquitetura e engenharia, que têm como objetivo inovar o espaço físico da natureza ou modificar a característica original de bens imóveis.

Acervo Técnico sugerido

- **EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020**

Quantidade mínima sugerida: $43.857,17 * 50\% = 21.928,58 \text{ m}^2$

Justificativa: O item sugerido contém a maior relevância financeira da obra, sendo assim, necessitando de capacidade técnica para executar.

- **ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024**

Quantidade mínima sugerida: $15.160,64 * 50\% = 7.580,32 \text{ m}$

Justificativa: O item sugerido contém a segunda maior relevância financeira da obra, sendo assim, necessitando de capacidade técnica para executar.

KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00"
KATYANNE MARQUES MENDONCA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3

- **EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024**

Quantidade mínima sugerida: $15.160,64 * 50\% = 7.580,32$ m

Justificativa: O item sugerido contém a terceira maior relevância financeira da obra, sendo assim, necessitando de capacidade técnica para executar.

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal. Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados à Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

Normas

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e a Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Assinado digitalmente por KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00"
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3



Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

Mão de Obra

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assistência Técnica e Administrativa

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra.

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas à Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma.

Condições de Trabalho e Segurança da Obra

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança" dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança, luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil.

KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:38:30-03'00'
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3



Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:

- Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;
- Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; e
- Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra.

A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilância efetuado por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo "porte" concedido pelas autoridades policiais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

1. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1. COM-33957636 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A taxa de administração tem por finalidade cobrir os custos com os serviços do engenheiro responsável técnico e do mestre de obras, profissionais indispensáveis para o acompanhamento, fiscalização, orientação técnica e controle da execução dos serviços conforme os padrões de qualidade e segurança exigidos. A taxa será calculada como um percentual (%) sobre o valor executado em cada medição, de acordo com os serviços efetivamente realizados e atestados pelo responsável técnico da obra.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Deverá ser executada placa padrão de obra em aço galvanizado, na rua especificada em orçamento anexo. A placa da obra deverá ter tamanho igual ou superior à 4,00m x 3,00m (base x altura).

Executar-se-á placa de obra em chapa de aço galvanizado com as seguintes informações:

- Nome do empreendimento;

KATYANNE MARQUES
MENDONÇA:05293123360
Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONÇA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00'
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3



- Número do processo licitatório;
- Valor do empreendimento;
- Nome dos responsáveis técnicos pela fiscalização e execução com respectivos registros no CREA/CE e numeradas ARTs;
- Nome da empresa vencedora do certame;
- Timbres do município de Russas/CE
- Endereço da obra;
- Slogan do CREA/CE

2.2. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

A demolição do concreto em meio-fio será realizada de forma manual ou mecanizada, conforme a necessidade, com prévia sinalização e isolamento da área, seguindo as normas de segurança vigentes. O serviço inclui a remoção cuidadosa do meio-fio existente para não danificar as estruturas adjacentes, com posterior recolhimento e destinação adequada dos resíduos gerados.

2.3. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

A carga manual de entulho em caminhão basculante será realizada por equipe devidamente equipada, utilizando ferramentas apropriadas como pás, enxadas e carrinhos de mão, garantindo a coleta e o transporte eficiente dos resíduos gerados durante os serviços de demolição. O entulho será acondicionado de forma segura na caçamba do caminhão, respeitando o limite de carga permitido e evitando derramamento durante o transporte. Todo o processo seguirá as normas de segurança do trabalho e as exigências ambientais vigentes, com destinação final em local devidamente licenciado.

2.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM

O transporte de material, exceto rocha, será realizado por meio de caminhão basculante, em trajeto de até 5 km, entre o local de origem (canteiro de obras ou frente de serviço) e o destino previamente definido, como área de bota-fora ou aterro autorizado. O carregamento será feito de forma segura, respeitando os limites de capacidade do veículo, e o transporte seguirá as normas de trânsito e ambientais aplicáveis, garantindo que não haja derramamento de material ao longo do percurso.

KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00'
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3

3. PAVIMENTAÇÃO DA RUA

3.1 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

A locação de obra refere-se ao processo de estabelecer as coordenadas precisas no terreno para posicionar corretamente os elementos da construção.

3.2. 4915598 RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

A reconformação envolve o ajuste ou remodelagem da plataforma para garantir sua estabilidade, funcionalidade ou segurança. Como a pedra tosca é um material que pode ser irregular e ter superfícies ásperas, o processo de reconformação pode envolver ajustes de níveis e superfícies: Pode ser necessário nivelar ou melhorar a uniformidade da plataforma de pedra para garantir que ela seja funcional e segura para uso.

3.3. 101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020

Todas as pedras calcárias a serem utilizadas na obra, serão de pedreira indicada pela fiscalização, deverão ser poliédricas.

O assentamento das rochas deverá ser feito com justaposição, de modo a não existirem juntas que comprometam a estabilidade de pavimento, após o que se fará à compactação, por meios mecânicos, desde que se atendam as condições técnicas exigidas pela Fiscalização, que, para tal, poderá submeter o pavimento a testes de carga estática, dinâmica e rejunte cimento e areia traço de acordo com as normas da ABNT.

Sobre o leito regularizado da via, espalhar-se uma camada uniforme de areia, com espessura de 20cm, isenta de toda e qualquer matéria orgânica, sobre a qual se executará o calçamento de pedra poliédrica.

3.4. 105558 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

A execução e compactação da camada final de aterro será realizada com solo de característica predominantemente argilosa, previamente espalhado em camadas com espessura máxima de 15 cm (após compactação), atendendo ao grau de compactação mínimo de 100% da energia do ensaio Proctor

Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00'
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3

Normal. O serviço será executado com uso de equipamentos adequados (como rolos compactadores lisos ou pé de carneiro, conforme o tipo de solo) e sob controle tecnológico adequado, garantindo a uniformidade e a densidade exigida no projeto. Estão excluídos deste item os serviços de escavação, carga, transporte e fornecimento do solo. A compactação será acompanhada por controle tecnológico para verificação do atendimento aos parâmetros especificados, conforme a aferição prevista para setembro de 2024 (AF_09/2024).

4. DRENAGEM

4.1. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

A margem da pavimentação em paralelepípedo, deverá ser executado, em uma camada não inferior à 10cm, concreto não estrutural, com preparo manual e vibrado. Está camada será denominada de sarjeta. Após a aplicação, a mesma deverá passar por um processo de cura, este deverá ser supervisionado para minimizar o fissuramento. Para evitar o surgimento das primeiras microfissuras deverá proceder-se com a cobertura da camada com material impermeável, podendo utilizar-se das embalagens do cimento, e posterior lançamento de água sobre a mesma.

4.2. 94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Os meios fios serão em pré-moldados de concreto, para tal, devem ter as seguintes dimensões: 80x08x08x25cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). Não serão aceitos, de nenhum modo, meios fio executados no local. Os mesmos devem ser executados em local apropriado, com todos os equipamentos necessários para o controle de sua qualidade, devendo ser, previamente ao seu assentamento, verificados pela fiscalização.

4.3. 0804183 CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

O serviço consiste na execução do corpo de BDTC com diâmetro de 0,80 metros, padrão PA2, destinado à drenagem e ao funcionamento de bueiro no ramal de Flores. A estrutura será preenchida com materiais comerciais, compostos por camadas de areia lavada, brita graduada e pedra de mão, dispostos de forma a garantir adequada percolação da água e estabilidade da

Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00"
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3

estrutura. A montagem seguirá os critérios técnicos estabelecidos em projeto, respeitando os alinhamentos, cotas e níveis de assentamento. A execução será feita com controle de qualidade dos materiais e da compactação ao redor da estrutura, assegurando a funcionalidade hidráulica e a durabilidade do sistema de drenagem.

4.4. 0804213 BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS

A boca do BDTC com diâmetro de 0,80 m será executada com esconsidade de 0° (entrada perpendicular ao fluxo), utilizando materiais comerciais como areia lavada e brita graduada, conforme especificações técnicas. A estrutura contará com alas retas, moldadas conforme o alinhamento do ramal de drenagem, garantindo o direcionamento adequado do fluxo e a proteção contra erosões laterais. A execução observará rigorosamente os níveis, cotas e dimensões estabelecidas em projeto, assegurando a estabilidade hidráulica e estrutural da entrada do sistema de drenagem.

4.5. 2003104 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA

A entrada para descida d'água tipo EDA 01 A será executada conforme projeto padrão, utilizando areia extraída (natural, limpa e isenta de matéria orgânica) e brita produzida (de granulometria adequada), garantindo a permeabilidade e a estabilidade da estrutura. A EDA será implantada em conformidade com os alinhamentos e cotas de projeto, promovendo a condução eficiente das águas pluviais para o sistema de drenagem, com controle de erosão e segurança estrutural. A geometria da estrutura e o posicionamento dos materiais seguirão rigorosamente os critérios técnicos previstos, assegurando o desempenho hidráulico e a durabilidade da obra.

4.6. 2003388 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA

A descida d'água de aterros tipo rápido, modelo DAR 40-20, será executada conforme projeto padrão, com dimensões de 40 cm de largura por 20 cm de profundidade, destinada ao escoamento eficiente das águas pluviais em taludes ou cortes de aterros. A estrutura será preenchida com areia extraída, limpa e isenta de impurezas, e brita produzida, com granulometria adequada, garantindo boa percolação e estabilidade. A execução seguirá os

Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONÇA:05293123360 MENDONÇA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00"
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREACE 061801664-3

alinhamentos, inclinações e cotas definidas em projeto, com compactação lateral adequada e proteção contra erosões, assegurando a durabilidade e o bom desempenho hidráulico do sistema.

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1. 5213440 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

A descrição que você forneceu parece se referir ao fornecimento e implantação de uma placa de regulamentação de trânsito ou sinalização viária, com as seguintes especificações:

- Aço (D = 0,60 m): A placa será fabricada em aço e terá um diâmetro de 0,60 metros, que é uma medida comum para placas de sinalização viária.
- Película retrorrefletiva tipo I: A placa será revestida com uma película retrorrefletiva, que é um material usado para aumentar a visibilidade da placa durante a noite ou em condições de baixa luminosidade. A película retrorrefletiva tipo I é uma das opções mais simples e econômicas, proporcionando boa visibilidade em ambientes urbanos, especialmente para sinalização de trânsito.
- SI (Sistema de Identificação): Esse termo pode indicar o tipo de sinalização ou regulamentação que a placa representará (como limites de velocidade, proibição de estacionamento, ou qualquer outra sinalização específica), mas normalmente é usado para indicar que a placa está conforme as normas e regulamentações de sinalização.
- Fornecedor e implantação: Refere-se ao fornecimento da placa com as características mencionadas e a instalação da mesma no local determinado.

5.2. 5213571 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

O serviço consiste no fornecimento e implantação de placa de sinalização vertical em aço galvanizado, com película retrorrefletiva do tipo I + III, conforme normas do CONTRAN/DETRAN e especificações do DNIT. A película tipo I será aplicada nas áreas informativas da placa, enquanto a tipo III (alta intensidade) será utilizada nas partes que exigem maior visibilidade noturna ou em condições adversas. A placa será montada sobre tubo galvanizado, com altura, posicionamento e fixação conforme projeto e normas técnicas vigentes. O conjunto deve apresentar resistência à corrosão, durabilidade e perfeita legibilidade, garantindo segurança e orientação ao usuário da via.

5.3. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

Após a conclusão dos serviços de pavimentação, os meios fios deverão receber caiação.

Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONÇA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00"
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3



6. SERVIÇOS FINAIS

6.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Depois de concluir toda a pavimentação será feito uma limpeza geral com varredura e bota fora.

Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONÇA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:39:30-03'00'
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 061801664-3



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539									
DESCRIÇÃO:		ORÇAMENTO GLOBAL DA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539									
LOCAL:		DIVERSAS ZONAS NA ZONA RURAL									
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS									
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$	SEM BDI	COM BDI
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA											
1											
1.1	COM-33957636	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PROPRIA	%	100,00	R\$ 1.947,62	R\$ 1.947,62	R\$ 2.351,36	R\$ 194.762,00	R\$ 194.762,00	R\$ 235.136,00
SERVIÇOS PRELIMINARES											
2											
2.1	103889	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E	SINAPI	M2	12,00	R\$ 468,60	R\$ 468,60	R\$ 563,43	R\$ 15.372,54	R\$ 15.372,54	R\$ 18.559,26
2.2	C1049	ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	SEINFRA	M3	27,04	R\$ 298,30	R\$ 298,30	R\$ 360,14	R\$ 8.066,03	R\$ 8.066,03	R\$ 9.738,19
2.3	C0702	DEMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	27,04	R\$ 30,38	R\$ 30,38	R\$ 36,08	R\$ 821,48	R\$ 821,48	R\$ 991,83
2.4	C2533	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	27,04	R\$ 32,72	R\$ 32,72	R\$ 39,50	R\$ 884,75	R\$ 884,75	R\$ 1.068,09
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM											
PAVIMENTAÇÃO DA RUA											
3											
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	49.542,68	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,36	R\$ 3.624.294,03	R\$ 3.624.294,03	R\$ 4.375.487,40
3.2	4915598	Reconformação da plataforma	SICRO NOVO	m²	49.542,68	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,12	R\$ 14.862,80	R\$ 14.862,80	R\$ 17.835,37
3.3	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 08/2020	SINAPI	M2	43.867,17	R\$ 81,86	R\$ 81,86	R\$ 98,83	R\$ 4.954,27	R\$ 4.954,27	R\$ 5.945,13
3.4	106558	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF. 09/2024	SINAPI	M3	981,44	R\$ 14,60	R\$ 14,60	R\$ 17,63	R\$ 3.590.147,94	R\$ 3.590.147,94	R\$ 4.334.404,11
DRENAGEM											
4											
4.1	94237	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 01/2024	SINAPI	M	15.190,64	R\$ 33,70	R\$ 33,70	R\$ 40,69	R\$ 1.097.620,47	R\$ 1.097.620,47	R\$ 1.325.048,56
4.2	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	SINAPI	M	15.190,64	R\$ 36,05	R\$ 36,05	R\$ 43,52	R\$ 510.913,57	R\$ 510.913,57	R\$ 616.896,44
4.3	0804183	Corpo de BOTO D = 0,80 m PAQ - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	9,05	R\$ 1.356,24	R\$ 1.356,24	R\$ 1.637,39	R\$ 546.541,07	R\$ 546.541,07	R\$ 659.791,05
4.4	0804213	Boca de BOTO D = 0,80 m - esquadro 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 1.628,63	R\$ 1.628,63	R\$ 1.966,24	R\$ 12.273,97	R\$ 12.273,97	R\$ 14.816,38
4.5	2003104	Entrada para descida d'água - EDA Ø1 A - areia extraída e brita produzida	SICRO NOVO	un	60,00	R\$ 185,89	R\$ 185,89	R\$ 224,42	R\$ 3.257,26	R\$ 3.257,26	R\$ 3.932,48
4.6	2003388	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia extraída e brita produzida	SICRO NOVO	m	80,00	R\$ 223,02	R\$ 223,02	R\$ 269,25	R\$ 11.153,40	R\$ 11.153,40	R\$ 13.485,20
SINALIZAÇÃO VIÁRIA											
5											
5.1	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	40,00	R\$ 274,19	R\$ 274,19	R\$ 331,03	R\$ 10.967,60	R\$ 10.967,60	R\$ 13.241,20
5.2	5213571	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	m²	5,00	R\$ 517,91	R\$ 517,91	R\$ 625,27	R\$ 2.589,55	R\$ 2.589,55	R\$ 3.126,36
5.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF. 06/2021	SINAPI	M	15.160,64	R\$ 1,72	R\$ 1,72	R\$ 2,08	R\$ 26.076,30	R\$ 26.076,30	R\$ 31.534,13
SERVIÇOS FINAIS											
6											
6.1	C3417	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	49.542,68	R\$ 1,52	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 75.304,87	R\$ 75.304,87	R\$ 91.158,53
										VALOR BDI TOTAL	R\$ 1.046.404,06
										VALOR ORÇAMENTO	R\$ 5.046.887,37
										VALOR TOTAL	R\$ 6.093.291,43

Assinado digitalmente por KATYANNE

KATYANNE MARQUES MARQUES

KATYANNE MARQUES MARQUES
MENDONÇA:05293123
360
Assinado digitalmente por KATYANNE
Data: 2025.09.22
15:22:30
-03'00"



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
OBRA:		DATA : 14/03/2025											
DESCRIÇÃO:		PONTA: 028 SEM DESONERACAO											
LOCAL:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											
CLIENTE:		MÊS: 71,31%											

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO GLOBAL DA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539

LOCAL: DIVERSAS ZONAS NA ZONA RURAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

DATA: 14/03/2025
FONTE: SEINFRA
VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO
2025/01
2025-01 SEM DESONERAÇÃO
PROPRIA
BDI: 20,73%
HORA: 154,11%
71,35%
115,10%
71,84%
6,09%
0,86%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÉDITO %	CL
101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	43.857,17	R\$ 98,83	R\$ 4.334.404,11	71,13	71,13	B
94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	15.160,64	R\$ 43,52	R\$ 659.791,05	10,83	81,96	C
94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	15.160,64	R\$ 40,89	R\$ 616.866,44	10,12	92,09	C
COM-33957636	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PROPRIA	Serviço	%	100,00	R\$ 2.351,36	R\$ 235.136,00	3,88	95,95	C
C3447	LIQUEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	49.542,68	R\$ 1,84	R\$ 91.158,53	1,50	97,44	C
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	15.160,64	R\$ 2,08	R\$ 31.534,13	0,52	97,96	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	49.542,68	R\$ 0,36	R\$ 17.835,36	0,29	98,25	C
105558	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO, AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	981,44	R\$ 17,63	R\$ 17.302,79	0,28	98,54	C
2003388	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia extraída e brita produzida	SICRO NOVO	Serviço	m	60,00	R\$ 269,25	R\$ 16.155,00	0,27	98,80	C
0804183	Corpo de BDTC D = 0,30 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	Serviço	m	9,05	R\$ 1.637,39	R\$ 14.818,38	0,24	99,04	C
2003104	Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia extraída e brita produzida	SICRO NOVO	Serviço	un	60,00	R\$ 224,42	R\$ 13.465,20	0,22	99,26	C
5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	Serviço	un	40,00	R\$ 331,03	R\$ 13.241,20	0,22	99,48	C
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	Serviço	M3	27,04	R\$ 360,14	R\$ 9.738,19	0,16	99,64	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	12,00	R\$ 563,43	R\$ 6.761,16	0,11	99,75	C
4915598	Reconformação da plataforma	SICRO NOVO	Serviço	m²	49.542,68	R\$ 0,12	R\$ 5.945,13	0,10	99,85	C
0804213	Boca de BDTC D = 0,80 m - esconduzida 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	Serviço	un	2,00	R\$ 1.968,24	R\$ 3.932,48	0,06	99,91	C
5213571	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	Serviço	m²	5,00	R\$ 625,27	R\$ 3.126,35	0,05	99,97	C
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	Serviço	M3	27,04	R\$ 30,50	R\$ 1.068,08	0,02	99,98	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	27,04	R\$ 36,68	R\$ 991,83	0,02	100,00	C

Subtotal até 100,00%
Valor total do Orçamento:

R\$ 6.093.291,43
R\$ 6.093.291,4

KATYANNE MARQUES Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONÇA:05293123
360
Data: 2025.10.23 16:46:09-03'00"



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539	DATA : 14/03/2025		BDI : 20
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL DA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	DIVERSAS ZONAS NA ZONA RURAL	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	SICRO NOVO	2025/01	-
		SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	115,10% 71,84%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



COM-33957636 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,71000000	R\$ 22.853,38	R\$ 16.225,90
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,12000000	R\$ 7.249,47	R\$ 8.119,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24.345,31
TOTAL PARA 8 MESES:						R\$ 194.762,48
FRAÇÃO DE 100%:						R\$ 1.947,62
VALOR:						R\$ 1.947,62

KATYANNE
MARQUES
MENDONCA:0529
3123360

Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Data: 2025.04.28
22:06:32
-03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539	DATA: 14/03/2025	BDI: 20														
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL DA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,10% 71,84%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00% 0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	SICRO NOVO	2025/01		SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	115,10% 71,84%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA															
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%															
SICRO NOVO	2025/01																
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	115,10% 71,84%															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%															
LOCAL:	DIVERSAS ZONAS NA ZONA RURAL																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS																

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 26,39	R\$ 0,29
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 14,14	R\$ 0,18
00004509	SARRAFO *2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,61	R\$ 17,99
TOTAL Material:						R\$ 418,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 28,79	R\$ 10,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 23,37	R\$ 26,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 36,87

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 22,73	R\$ 11,36
TOTAL Serviço:						R\$ 11,36
VALOR:						R\$ 466,69

2.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 81,5126	R\$ 0,0815
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,1752	R\$ 0,0024
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 2,3202	R\$ 0,0046
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0885

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0844
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 29,6400	R\$ 0,0593
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 35,6000	R\$ 0,0712
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,2149
VALOR:						R\$ 0,36

2.2. 4915598 Reconformação da plataforma (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 292,9027	R\$ 128,5395	R\$ 292,9027
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 292,9027

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	22,3399	22,3399
TOTAL MÃO DE OBRA:					22,3399

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539	DATA:	14/03/2025 BDI: 20
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL DA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS ZONAS NA ZONA RURAL	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO 114,15%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



Custo Horário da Execução:	R\$ 315,2426
Produção da Equipe:	3.053,93000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,1032
Custo do FIC (0,0136):	R\$ 0,0014
Custo Direto Total:	R\$ 0,1046
VALOR:	R\$ 0,10

2.3. 101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 18,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,10770000	R\$ 75,58	R\$ 8,13
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 179,18	R\$ 0,55
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,68

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 136,76
00013186	PEDRA GRANÍTICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALÇAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,11900000	R\$ 120,40
TOTAL Material:					R\$ 29,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33250000	R\$ 29,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33250000	R\$ 23,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,41

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04400000	R\$ 587,81
TOTAL Serviço:					R\$ 25,86
VALOR:					R\$ 81,86

3.1. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00990000	R\$ 135,00
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 475,00
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 3,87
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08330000	R\$ 18,33
TOTAL Material:					R\$ 21,48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539	DATA : 14/03/2025		BDI : 20	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL DA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539	FONTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL:	DIVERSAS ZONAS NA ZONA RURAL	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	SICRO NOVO	2025/01		
		SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23260000	R\$ 29,21	R\$ 6,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23260000	R\$ 23,37	R\$ 5,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,22
VALOR:						R\$ 33,70

3.2. 94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 135,00	R\$ 0,89
00041681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,25630000	R\$ 18,91	R\$ 23,75
TOTAL Material:						R\$ 24,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20270000	R\$ 29,21	R\$ 5,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20270000	R\$ 23,37	R\$ 4,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,65

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00110000	R\$ 692,46	R\$ 0,76
TOTAL Serviço:						R\$ 0,76
VALOR:						R\$ 36,05

4.1. 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	R\$ 155,3801	R\$ 65,1232	R\$ 92,2032
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 92,2032

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9830	Montador	h	1,00000000	32,0638	32,0638
P9824	Servente	h	2,00000000	22,3399	44,6798
TOTAL MÃO DE OBRA:					76,7436

Custo Horário da Execução:	R\$ 168,9468
Produção da Equipe:	3,00000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 56,3156

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	m²	0,35994000	R\$ 605,3200	R\$ 217,8789
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 217,8789
Custo Direto Total:					R\$ 274,1945
VALOR:					R\$ 274,19

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539	DATA: 14/03/2025		BDI: 20	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL DA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539	FONTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL:	DIVERSAS ZONAS NA ZONA RURAL	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	SICRO NOVO	2025/01		
		SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



4.2. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	R\$ 1,99	R\$ 0,21
TOTAL Material:					R\$ 0,21

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	R\$ 30,89	R\$ 1,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	R\$ 23,37	R\$ 0,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,51
VALOR:					R\$ 1,72

5.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 20,2600	R\$ 1,5195
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,5195
VALOR:					R\$ 1,52

6.1. COM-33957636 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,71000000	R\$ 22.853,38	R\$ 16.225,90
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,12000000	R\$ 7.249,47	R\$ 8.119,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 24.345,31
TOTAL PARA 8 MESES:					R\$ 194.762,48
FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 1.947,62
VALOR:					R\$ 1.947,62



OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE. PT-108327-11. CONV. 347530

DATA: 14/03/2023

BDI: 20,73%

VERSÃO

HORA

MES

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO GLOBAL PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE. PT-108327-11. CONV. 347530

202301 SEM DESONERAÇÃO

115,10%

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL

28 SEM DESONERAÇÃO

71,31%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ

202301 SEM DESONERAÇÃO

71,31%

14/03/2023

MEMORIAL DE CÁLCULO											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QUANTIDADE (UN)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	COEFICIENTES	VALOR DE IMPLANTACAO	TOTAL

2		SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AS_03/2022_PS	SINAPI	M2							12,00
		Placa de Orla Pedão Caixa		M2	4,00		3,00				12,00
2.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3							27,04
		IPEACONHA - DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO		M3	419,87		0,15	0,30			12,59
		RAMAL DE FLORES - DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO		M3	166,71		0,15	0,30			7,50
		RAMAL DE FLORES - DEMOLIÇÃO DE PISO CALÇADA		M3		8,08		0,08			0,65
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3							27,04
		IPEACONHA - DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO		M3	419,87		0,15	0,30			12,59
		RAMAL DE FLORES - DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO		M3	166,71		0,15	0,30			7,50
		RAMAL DE FLORES - DEMOLIÇÃO DE PISO CALÇADA		M3		8,08		0,08			0,65
2.4	C2213	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3							27,04
		IPEACONHA - DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO		M3	419,87		0,15	0,30			12,59
		RAMAL DE FLORES - DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO		M3	166,71		0,15	0,30			7,50
		RAMAL DE FLORES - DEMOLIÇÃO DE PISO CALÇADA		M3		8,08		0,08			0,65
3		PAVIMENTAÇÃO DA RUA									
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2							49,542,89
		SITIO BOM SUCESSO		M2	1.920,00		7,00				13.440,00
		IPEACONHA TRECHO 01		M2	500,00		6,00				3.000,00
		IPEACONHA TRECHO 02		M2	216,00		5,00				1.080,00
		IPEACONHA EXTENSÃO TAPPER VARIÁVEL, FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO		M2		849,97					849,97
		SITIO INGA TRECHO 01		M2	1.740,00		7,50				13.050,00
		SITIO INGA TRECHO 02		M2	150,00		6,50				975,00
		SITIO INGA TRECHO 03		M2	1.093,00		6,90				6.023,00
		SITIO INGA TRECHO 04		M2	106,05		6,50				692,83
		RAMAL DE FLORES SDO 01		M2	172,48		6,00				1.034,08
		RAMAL DE FLORES SDO 02		M2	99,37		7,00				695,58
		RAMAL DE FLORES SDO 03		M2	191,41		6,00				1.088,46
		RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 01		M2	620,00		7,00				4.340,00
		RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 02		M2	230,00		6,50				1.495,00



OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE - PT-1093387-11 CONV. 947539
DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO GLOBAL PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE - PT-1093387-11 CONV. 947539
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ

DATA: 14/03/2025		BDI: 20,71%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SIAPRI	202501 SEM DESONERAÇÃO	116,10%	71,34%
SEINFRA	23 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SICRO NOVO	202501 SEM DESONERAÇÃO		

0363

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE (UN)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESEMPENHOS	TAXAS DE APLICAÇÃO	TOTAL
3.2	4915088	Reconformação da plataforma	SICRO NOVO	M2	112,00	6,00					672,00
		SÍTIO BOM SUCESSO		M2					768,95		768,95
		IPEPACONHA TRECHO 01		M2	1.920,00	7,00					49.542,88
		IPEPACONHA TRECHO 02		M2	560,00	6,00					13.440,00
		IPEPACONHA EXTENSÃO TAPPER VARIÁVEL FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO		M2	218,00	5,00					3.380,00
		SÍTIO INGA TRECHO 01		M2		849,37					1.090,00
		SÍTIO INGA TRECHO 02		M2	1.740,00	7,50					849,97
		SÍTIO INGA TRECHO 03		M2	160,00	6,50					13.050,00
		SÍTIO INGA TRECHO 04		M2	1.000,00	6,00					975,00
		RAMAL DE FLORES SDO 01		M2	105,05	6,50					6.005,00
		RAMAL DE FLORES SDO 02		M2	172,48	6,00					952,33
		RAMAL DE FLORES SDO 03		M2	99,37	7,00					1.034,08
		RAMAL DE FLORES SDO 04		M2	181,41	6,00					695,59
		RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 01		M2	620,00	7,00					1.008,46
		RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 02		M2	230,00	6,50					4.340,00
		RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 03		M2	112,00	6,00					1.495,00
		RAMAL DE FLORES - EXTENSÃO TAPPER VARIÁVEL FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO		M2					768,95		672,00
				M2							768,95
3.3	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	SIAPRI	M2							43.857,17
		SÍTIO BOM SUCESSO		M2	1.020,00	6,24					11.990,80
		IPEPACONHA TRECHO 01		M2	560,00	5,24					2.934,40
		IPEPACONHA TRECHO 02		M2	218,00	4,24					925,32
		IPEPACONHA EXTENSÃO TAPPER VARIÁVEL FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO		M2		725,17					725,17
		SÍTIO INGA TRECHO 01		M2	1.740,00	6,74					11.727,60
		SÍTIO INGA TRECHO 02		M2	150,00	5,74					861,00
		SÍTIO INGA TRECHO 03		M2	1.000,00	5,24					5.240,00
		SÍTIO INGA TRECHO 04		M2	105,05	5,74					602,59
		RAMAL DE FLORES SDO 01		M2	172,48	5,24					903,90
		RAMAL DE FLORES SDO 02		M2	99,37	6,24					620,07
		RAMAL DE FLORES SDO 03		M2	181,41	5,24					950,59
		RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 01		M2	620,00	6,24					3.868,80
		RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 02		M2	230,00	5,74					1.320,20
				M2							
				M2							
				M2							
				M2							

KATYANNE MARQUES Assinado digitalmente por
MENDONÇA/052931233 KATYANNE MARQUES
80 MENDONÇA/05293123360
Data: 2025.03.22 15:22:53-03007
Katyenne Marques Mendonça
Engenharia Civil
CREA-CE: 061801664-3

Prefeitura Municipal de Russas - CE
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA
engenharia.russas@hotmail.com





OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE - PT-1080307-11. CONV. 947539	DATA: 14/03/2025	VERSÃO		80% 20,73%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE - PT-1080307-11. CONV. 947539	FONTE:	SINAPI		MES
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL	202501 SEM DESONERAÇÃO	115,10%		71,84%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	114,15%		71,31%
		SIGRO NOVO	202509 SEM DESONERAÇÃO		
					jan/25

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE (m³)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	CONFIABILIDADE	TAXA DE APLICAÇÃO	TOTAL
		RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 03		M2	112,00	5,24					586,33
		EXTENSÃO TAPPER VARIÁVEL, FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO		M2							610,55

3.4 105558 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PRECIPITAMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

EXTENSÃO TAPPER VARIÁVEL, FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO
EXTENSÃO TAPPER VARIÁVEL, FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO

4 DRENAGEM

4.1 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_04/2024

SÍTIO BOM SUCESSO
IPEPACONHA TRECHO 01
IPEPACONHA TRECHO 02
IPEPACONHA EXTENSÃO TAPPER VARIÁVEL, FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO
SÍTIO INGA TRECHO 01
SÍTIO INGA TRECHO 02
SÍTIO INGA TRECHO 03
SÍTIO INGA TRECHO 04
RAMAL DE FLORES SDO 01
RAMAL DE FLORES SDO 02
RAMAL DE FLORES SDO 03
RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 01
RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 02
RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 03
RAMAL DE FLORES - EXTENSÃO TAPPER VARIÁVEL, FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO

4.2 94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X80X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

SÍTIO BOM SUCESSO
IPEPACONHA TRECHO 01
IPEPACONHA TRECHO 02
IPEPACONHA EXTENSÃO TAPPER VARIÁVEL, FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO
SÍTIO INGA TRECHO 01
SÍTIO INGA TRECHO 02


Prefeitura Municipal de Russas - CE
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA
engenharia.russas@hotmail.com

KATYANNE MARQUES Assinado digitalmente por
MENDONÇA.052931233 KATYANNE MARQUES
Data: 2025.03.22 15:22:53-03'00'
Engenharia Civil
CREA-CE: 061801664-3





OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE. PT-1086987-11, CONV. 14/7539
DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO GLOBAL PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE. PT-1086987-11, CONV. 14/7539
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ



MEMORIAL DE CÁLCULO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE (UN)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	COEFICIENTES	TAXAS DE DESPESAS

5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	RAMAL DE FLORES - SDO 03	UN	4,00					4,00
---	--------------------	--------------------------	----	------	--	--	--	--	------

5.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 01	UN	12,00					12,00
		RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 02	UN	4,00					4,00
		RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 03	UN	2,00					2,00
		RAMAL DE FLORES - EXTENSÃO TÁPER VARIAVEL FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO	UN	8,00					8,00

5.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	2,00					2,00
		SITIO BOM SUCESSO PLACA REGULAMENTAÇÃO 40X60H - 00 UNIDADES X 11 X 0,30M ² - DIÂMETRO (Ø): 60CM	UN	2,00					2,00
		SITIO BOM SUCESSO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA VIA - NOME DA RUA, BAIRRO, CEP E LOGOMARCA DO MUNICÍPIO	UN	2,00					2,00
		PEPAÇONHA PLACA REGULAMENTAÇÃO: PARE - 00 UNIDADES X 11 X 0,30M ² - DIÂMETRO (Ø): 60CM	UN	2,00					2,00
		PEPAÇONHA PLACA REGULAMENTAÇÃO: PARE - 00 UNIDADES X 11 X 0,30M ² - DIÂMETRO (Ø): 60CM	UN	2,00					2,00
		PEPAÇONHA PLACA REGULAMENTAÇÃO: 40X60H - 00 UNIDADES X 11 X 0,30M ² - DIÂMETRO (Ø): 60CM	UN	2,00					2,00
		PEPAÇONHA PLACA ADVERTÊNCIA: VIRE À DIREITA - 00 UNIDADES X 11 X 0,30M ² - DIÂMETRO (Ø): 60CM	UN	2,00					2,00
		PEPAÇONHA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA VIA - NOME DA RUA, BAIRRO, CEP E LOGOMARCA DO MUNICÍPIO	UN	2,00					2,00
		PEPAÇONHA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA VIA - NOME DA RUA, BAIRRO, CEP E LOGOMARCA DO MUNICÍPIO	UN	2,00					2,00
		SITIO INGA PLACA REGULAMENTAÇÃO: PARE - 00 UNIDADES X 11 X 0,30M ² - DIÂMETRO (Ø): 60CM	UN	3,00					3,00
		SITIO INGA PLACA REGULAMENTAÇÃO: 40X60H - 00 UNIDADES X 11 X 0,30M ² - DIÂMETRO (Ø): 60CM	UN	3,00					3,00
		SITIO INGA PLACA ADVERTÊNCIA: SIGAVIRE À ESQUERDA/ CURVA - 00 UNIDADES X 11 X 0,30M ² - DIÂMETRO (Ø): 60CM	UN	4,00					4,00
		SITIO INGA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA VIA - NOME DA RUA, BAIRRO, CEP E LOGOMARCA DO MUNICÍPIO	UN	2,00					2,00
		RAMAL DE FLORES PLACA REGULAMENTAÇÃO: PARE - 00 UNIDADES X 11 X 0,30M ² - DIÂMETRO (Ø): 60CM	UN	5,00					5,00
		RAMAL DE FLORES PLACA REGULAMENTAÇÃO: 40X60H - 00 UNIDADES X 11 X 0,30M ² - DIÂMETRO (Ø): 60CM	UN	4,00					4,00
		RAMAL DE FLORES PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA VIA - NOME DA RUA, BAIRRO, CEP E LOGOMARCA DO MUNICÍPIO	UN	2,00					2,00
		RAMAL DE FLORES PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA VIA - NOME DA RUA, BAIRRO, CEP E LOGOMARCA DO MUNICÍPIO	UN	2,00					2,00

5.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Placa em aço - película I + II - fornecimento e implantação	M2		2,50	1,00			5,00
		PEPAÇONHA - PLACA DE AGUARDE NO ACOSTAMENTO	M2		2,50	1,00			2,50
		RAMAL DE FLORES - PLACA DE AGUARDE NO ACOSTAMENTO	M2		2,50	1,00			2,50

5.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO), AF_08/2021	M						15.160,64
		SITIO BOM SUCESSO	M	2,00	1.320,00				3.940,00
		PEPAÇONHA TRECHO 01	M	2,00	560,00				1.120,00
		PEPAÇONHA TRECHO 02	M	2,00	216,00				436,00
		PEPAÇONHA EXTENSÃO TÁPER VARIAVEL FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO	M		416,02				416,02
		SITIO INGA TRECHO 01	M	2,00	1.740,00				3.480,00

KATYANNE MARQUES Assinado digitalmente por
MENDONÇA.0529312333 KATYANNE MARQUES
Data: 2025.03.22 15:22:53-03'00"
Engenharia Civil
CREA-CE: 061801664-3

Prefeitura Municipal de Russas - CE
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA
engenharia.russas@hotmail.com





OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE
DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO GLOBAL PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ

FONTE		DATA: 14/03/2023		VERSÃO		BOM 20,73%	
						HORA	
SEINFRA		202501 SEM DESONERAÇÃO		202501 SEM DESONERAÇÃO		115,10%	
SEINFRA		202501 SEM DESONERAÇÃO		202501 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	
SEINFRA		202501 SEM DESONERAÇÃO		202501 SEM DESONERAÇÃO		71,31%	

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE (UN)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	CÓEFICIENTES	VALOR DE APLICAÇÃO	TOTAL
6	C3447	SITIO INGA TRECHO 02	M	2,00	150,00						300,00
		SITIO INGA TRECHO 03	M	2,00	1.000,00						2.000,00
		SITIO INGA TRECHO 04	M	2,00	105,05						210,10
		RAMAL DE FLORES SDO 01	M	2,00	172,48						344,96
		RAMAL DE FLORES SDO 02	M	2,00	98,37						196,74
		RAMAL DE FLORES SDO 03	M	2,00	181,41						362,82
		RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 01	M	2,00	620,00						1.240,00
		RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 02	M	2,00	210,00						420,00
		RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 03	M	2,00	112,00						224,00
		RAMAL DE FLORES - EXTENSÃO TAPPER VARIÁVEL FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO	M	2,00	525,00						1.050,00
		SEINFRA	M2								40.542,68
		SITIO BOM SUCESSO	M2								13.440,00
		IPERACONHA TRECHO 01	M2								3.360,00
		IPERACONHA TRECHO 02	M2								1.090,00
6.1	C3447	EXTENSÃO TAPPER VARIÁVEL FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO	M2		849,97						849,97
		SITIO INGA TRECHO 01	M2		1.740,00						13.095,00
		SITIO INGA TRECHO 02	M2		150,00						975,00
		SITIO INGA TRECHO 03	M2		1.090,00						6.000,00
		SITIO INGA TRECHO 04	M2		105,05						682,33
		RAMAL DE FLORES SDO 01	M2		172,48						1.004,88
		RAMAL DE FLORES SDO 02	M2		98,37						686,59
		RAMAL DE FLORES SDO 03	M2		181,41						1.092,46
		RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 01	M2		620,00						4.340,00
		RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 02	M2		210,00						1.495,00
		RAMAL DE FLORES - TRAV. FRANCISCO ANTONIO - TRECHO 03	M2		112,00						672,00
		EXTENSÃO TAPPER VARIÁVEL FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO	M2		768,95						768,95

KATYANNE MARQUES Assinado digitalmente por
MENDONÇA.052931233 KATYANNE MARQUES
MENDONÇA.052931233
Data: 2023.03.22 15:22:53-03'00'
Katyane Marques Mendonça
Engenharia Civil
CREA-CE: 061801664-3

Prefeitura Municipal de Russas - CE
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA
engenhar@russas@hotmail.com



25/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - PT 1089387-11 (947539/2023)

PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.

ESCOLHA

Construção de Rodovias e Ferrovias

1 Declarações de responsabilidade do ORÇAMENTISTA

1.1 Fórmula de cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{1 - I} - 1$$

A fórmula do BDI e os valores de referência de suas parcelas constam no Acórdão 2.622/2013 – Plenário.

BDI SEM DESONERAÇÃO	20,73%
Percentual está na faixa de Referência do BDI.	

- 1º Quartil: 19,60%

- 3º Quartil: 24,23%

O Orçamento é Desonerado?	NÃO
O BDI ADOTADO é:	20,73%

PARCELAS DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	Administração central	3,80%
S + G	Seguro e garantia	0,32%
R	Risco	0,50%
DF	Despesas financeiras	1,02%
L	Lucro	6,64%
I	Impostos	6,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%

Há BDI diferenciado?	NÃO
----------------------	-----

Calcular Despesa Financeira com base na Taxa SELIC e no Lucro?

NÃO

Taxa SELIC

10,50%

Despesa Financeira (IN 62/DNIT SEDE, 17/09/21)

0,78%

1.2 Declaração referente ao SINAPI que possuem a legenda "AS":

Os valores dos serviços com itens que possuem a legenda AS (ou seja, que possuem custos referentes a São Paulo) são adequados ao empreendimento em questão?

SIM

1.3 Os serviços orçados são suficientes para a execução do objeto.

	Orçado?	Justificativa para os itens (AL, MD, CO) não orçados:
AL Administração Local?	SIM	
MD Mobilização / Desmobilização?	NÃO	MD: A obra é de pequeno porte, com a maioria dos serviços significativos executados de forma manual ou utilizando apenas equipamentos de pequeno porte, que não necessitam mobilização específica.
CO Canteiro de Obras?	NÃO	CO: O curto prazo de execução dispensa e a baixa complexidade da obra dispensa a implantação de canteiro.

1.4 Referencias de Custos e Data Base

SICRO	SINAPI
jan/25	jan/25
SEINFRA	SMOP-EDIF
28	
Data-base	jan/25

Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Data: 2025.04.28 12:23:21-03'00'

Responsável Técnico pelo Orçamento

Engenheira: Katyanne Marques Mendonça

RNP: 061801664-3 ART: CE20251605920

2 Declarações de responsabilidade do TOMADOR

2.1 Declaração informativa referente ao ISS

- A alíquota de ISS prevista no Código Tributário Municipal, para o tipo de intervenção em tela é de:
- A base de cálculo sobre a qual incide a referida alíquota equivale ao seguinte percentual do valor da obra, em virtude da exclusão dos valores referentes aos materiais
- A alíquota efetiva de ISS a ser utilizada no BDI é:

5,00%
60,00%
3,00%

2.2 Declaração referente ao Tipo de Orçamento

O Orçamento NÃO Desonerado é mais adequado para a Administração Pública que o Desonerado.

2.3 Declaração referente ao Regime de Execução

- O regime de execução da obra em tela será:

EPU - Empreitada por Preço Unitário

2.4 A Data-base do Orçamento está informada no TransfereGov.br.

2.5 Ratificamos o BDI adotado: 20,73%. Percentual está na faixa de Referência do BDI.

2.6 O empreendimento atende ao objetivos do Programa e possuirá funcionalidade imediata.

2.7 Planejamento das Licitações:

Usará Pregão?

O orçamento terá caráter sigiloso?

NÃO
NÃO

SAVIO GURGEL
NOGUEIRA:4556015320
3320

Prefeito: Sávio Gurgel Nogueira
Prefeitura Municipal de Russas - CE

Assinado digitalmente por SAVIO GURGEL
NOGUEIRA:4556015320
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presidência, OU=52916705009149, OU=AC-SympandMúltiplo, CN=SAVIO GURGEL NOGUEIRA:4556015320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.28 14:57:01-03'00'
Versão PDF Reader: Versão: 2024.4.0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539	DATA : 14/03/2025	BDI : 20														
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL DA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,10% 71,84%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00% 0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	SICRO NOVO	2025/01		SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	115,10% 71,84%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA															
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%															
SICRO NOVO	2025/01																
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	115,10% 71,84%															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%															
LOCAL:	DIVERSAS ZONAS NA ZONA RURAL																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS																

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriadoss	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
TOTAL		49,06%	19,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,05%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,05%	7,16%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
TOTAL		18,54%	7,53%

A + B + C + D = 115,10% 71,84%

Assinado digitalmente por KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123
360
Data: 2025.04.28 22:08:52 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539	DATA : 14/03/2025		BDI : 20	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL DA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11. CONV. 947539	FONTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL:	DIVERSAS ZONAS NA ZONA RURAL	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	SICRO NOVO	2025/01		
		SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123
360

Assinado digitalmente por KATYANNE
MARQUES
MENDONCA:05293123360
Data: 2025.04.28
22:08:52
-03'00"



Prefeitura de
Russas

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA



LICENÇA AMBIENTAL Nº 011/2025

Validade até 14/03/2028

REGULARIZAÇÃO

A Secretaria de Meio Ambiente de Russas - SEMA, no uso de suas atribuições, expede a presente Licença, que autoriza a:

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

CPF / CNPJ: 07.535.446/0001-60

Endereço: AVENIDA DOM LINO, Nº 831, CENTRO

Município: RUSSAS

Protocolo de Processo SEMA: 014/2025/NLA

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO PARA REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPÍPEDO/PEDRA TOSCA, NAS VIAS DAS SEGUINTE COMUNIDADES: SÍTIO BOM SUCESSO, TRECHO 01 COM EXTENSÃO DE 1.270,00M; SÍTIO IPEPACONHA, TRECHO 1 COM EXTENSÃO DE 560,00M, TRECHO 2 COM EXTENSÃO DE 218,00M; SÍTIO INGÁ, TRECHO 1 COM EXTENSÃO DE 1.740,00M, TRECHO 2 COM EXTENSÃO DE 150,00M, TRECHO 3 COM EXTENSÃO DE 1.000,00M, TRECHO 4 COM EXTENSÃO DE 105,05M; SÍTIO BUIA, TRECHO 1 COM EXTENSÃO DE 1.037,62M, TRECHO 2 COM EXTENSÃO DE 21,93M, TRECHO 3 COM EXTENSÃO DE 42,22M; RAMAL DE FLORES, SDO 01 COM EXTENSÃO DE 172,48M, SDO 02 COM EXTENSÃO DE 99,37M, SDO 03 COM EXTENSÃO DE 181,41M, TRECHO 01 COM EXTENSÃO DE 620,00M, TRECHO 02 COM EXTENSÃO DE 230,00M, TRECHO 03 COM EXTENSÃO DE 112,00M, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS, ESTADO DO CEARÁ.

CONDICIONANTES

1. Submeter à prévia análise da Secretaria de Meio Ambiente de Russas qualquer alteração que se faça no empreendimento;
2. A Secretaria de Meio Ambiente de Russas, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença caso ocorra:
 - a) Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 - b) Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiariam a expedição da anuência;
 - c) Superveniência de riscos ambientais e de saúde.
3. Afixar, no local do empreendimento, placa indicativa do licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução COEMA Nº 01, de 28 de fevereiro de 2000;
4. Classificar, Armazenar e promover a destinação final dos resíduos sólidos produzidos na empresa seguindo criteriosamente a NBR 10.004/04, a Lei Nº 12.305 de 02/08/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei 1.808/2019, que institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos;
5. No caso de encerramento, desistência ou suspensão das atividades a empresa deverá obrigatoriamente comunicar a Secretaria de Meio Ambiente de Russas;
6. Para verificar o cumprimento das normas relativas à preservação do meio ambiente, o município, a qualquer tempo, poderá inspecionar o estabelecimento ou equipamento, determinando as modificações que forem julgadas necessárias estabelecendo instruções para o seu funcionamento;

CONDICIONANTES COM PRAZO

1. Publicar o recebimento desta Licença no prazo de 30 (trinta) dias corridos subsequentes a data da sua concessão, em cumprimento ao Decreto Federal Nº 99.274 de 06 de junho de 1990 e a Resolução CONAMA Nº 006, de 24 de janeiro de 1986, complementada pela Resolução CONAMA Nº 281 de 12 de julho de 2001;
2. A renovação desta licença poderá ser protocolada em até 120 (cento e vinte) dias de antecedência da expiração do seu prazo de validade, conforme Resolução COEMA 02/2019, o que lhe conferirá a prorrogação automática de seu prazo de validade até a manifestação definitiva da SEMA. Caso o interessado protocole a solicitação de renovação antes do vencimento da licença, porém após o mencionado prazo, não terá direito a prorrogação automática da validade da Licença;

Elton de Oliveira Gonçalves

Secretário de Meio Ambiente

Portaria Nº 013/2025

ELTON DE
OLIVEIRA
GONCALVES
:03574112343

Assinado eletronicamente por ELTON DE OLIVEIRA GONCALVES em 14/03/2025 às 10:21:05. Certificado Digital nº 03574112343. Assinatura: ELTON DE OLIVEIRA GONCALVES em 14/03/2025 às 10:21:05. Assinatura: ELTON DE OLIVEIRA GONCALVES em 14/03/2025 às 10:21:05.

Russas, 14 de março de 2025

Rua Padre Raul Vieira, 50, Centro - Russas - Ceará - CEP: 62.900-015

(88) 3411-2646 CNPJ: 07.535.446/0001-60



russas.ce.gov.br



sema@russas.ce.gov.br



Prefeitura de
Russas

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA



PROGRAMA PR
AMIGO DA CRI



DECLARAÇÃO

A Secretaria de Meio Ambiente de Russas, DECLARA para fins de Licenciamento Ambiental, que está apta a realizar processo de licenciamento ambiental desde a data de 13 de novembro de 2023, conforme divulgado no site da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), podendo ser verificado através do link: <https://www.semace.ce.gov.br/licenciamento-ambiental/municipios-com-orgao-licenciador/>.

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), visando dar maior transparência ao licenciamento ambiental realizado no Estado do Ceará, informa a lista dos municípios que apresentaram comunicação oficial sobre o desempenho da competência para realizar o licenciamento ambiental em âmbito local, em obediência ao § 2º do art. 7º, da Resolução COEMA nº 07, de 25 de setembro de 2019.

Ademais, esta secretaria segue as legislações ambientais vigentes nas esferas federal e estadual, bem como instituiu leis e decretos municipais que tratam do assunto, conforme citado a seguir:

- Lei nº 1.809/2019_Política Municipal de Meio Ambiente
- Lei nº 1.691/2017_Taxa para licenciamento ambiental
- Lei nº 1.927/2021_Isenção de taxa de anuência e de licenciamento
- Lei nº 1.930/2021_Competência para licenciamento ambiental para impacto local
- Decreto nº 78/2023_Procedimentos licenciamento de atividades de impacto local

Dessa forma, este órgão ambiental municipal declara para os devidos fins a legitimidade de suas ações como preconiza a Lei Complementar nº 140/2011, em seu Art. 9º.

Russas, 21 de fevereiro de 2025.


Elton de Oliveira Gonçalves

Secretário de Meio Ambiente

Portaria Nº 013/2025



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SER
Nº CE20251605



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

KATYANNE MARQUES MENDONÇA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 0618016643

Registro: 338252CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE RUSSAS**

AVENIDA Dom Lino

Complemento:

Cidade: **RUSSAS**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-60

Nº: 831

CEP: 62900000

ART Vinculada: CE20251573233

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS

Complemento:

Cidade: **RUSSAS**

Data de Início: **14/03/2025**

Previsão de término: **14/03/2026**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE RUSSAS**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **CE**

Nº: **SN**

CEP: **62900000**

Coordenadas Geográficas: **-4.938432, -37.974294**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-60

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.5 - POLIÉDRICA	1,00	un
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	1,00	un
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA	1,00	un
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	1,00	un
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE ACESSIBILIDADE > #4.2.4.2 - EM VIAS URBANAS	1,00	un
80 - Projeto > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.2 - RURAL	1,00	un
80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.5 - POLIÉDRICA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE ACESSIBILIDADE > #4.2.4.2 - EM VIAS URBANAS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.2 - RURAL	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	1,00	un

18 - Fiscalização

Quantidade

Unidade

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B3562
Impresso em: 14/03/2025 às 11:41:21 por: , ip: 187.19.149.175

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SER
Nº CE20251605



INICIAL

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.5 - POLIÉDRICA	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE ACESSIBILIDADE > #4.2.4.2 - EM VIAS URBANAS	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.2 - RURAL	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE RUSSAS CE. PT ? 1089387-11. CONV. 947539

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
KATYANNE MARQUES MENDONÇA
RNP: 0618016643
Data: 14/03/2025 11:41:21

KATYANNE MARQUES MENDONÇA - CPF: 052.931.233-60
NATHAN DE MATOS - Assinado digitalmente por NATHAN
DE MATOS REBOUCAS:05767829390
REBOUCAS:05767829390 Data: 2025.03.14 11:44:25-03'00"

MUNICÍPIO DE RUSSAS - CNPJ: 07.535.446/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 103,03 Registrada em: 14/03/2025 Valor pago: R\$ 103,03 Nosso Número: 8217792715

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.silec.com.br/publico/>, com a chave: B3562
Impresso em: 14/03/2025 às 11:41:21 por: ip: 187.19.149.175

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





27.477-0006					
P.L.E. - Planilha de Levantamento de Eventos					
Nº OPERAÇÃO 1089387-11	Nº SICONV 947539	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA OPERACOES DIVERSAS	ACAO / MODALIDADE
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS			MUNICÍPIO / UF RUSSAS/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ 10.932.123/0001-14	OBJETO DO CTEF	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT: 1089387-11.
					DATA ASSINATURA 30/10/2023
					INÍCIO DA OBRA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:	
Elaboração do documento KATYANNE MARQUES MENDONÇA	CREA/CAU 0618016843
Fiscalização KATYANNE MARQUES MENDONÇA	CREA/CAU 0618016843
	ART/RTT CE20251605920

EVENTOS	
Núm do Evento	Título do Evento
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	PAVIMENTAÇÃO DA RUA
4	DRENAGEM
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
6	SERVIÇOS FINAIS

KATYANNE MARQUES MENDONÇA:05293123360
Assinado digitalmente por KATYANNE MARQUES MENDONÇA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:57:17 -03'00'

Nº OPERAÇÃO 109387-11	Nº SICONV 847638	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA OPERAÇÕES DIVERSAS	AÇÃO / MODALIDADE	Grav da Sigla #PÚBLICO
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS			MUNICÍPIO / UF RUSSAS/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-109387.	DATA ASSINATURA 30/10/2023
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ 10.932.123/0001-14	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA		

Valor Total do Orçamento: R\$ 8.093.291,43


Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Fronteiras de Obra:					
Nível 1	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	2.351,36	235.136,00	1	2	3	4	5	6
Nível 2	2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	12,00	563,43	6.761,16	26,84	11,50	40,73	21,33		
Serviço	2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	12,00	563,43	6.761,16	12,00					
Serviço	2.2	SEMILOCAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	27,04	360,14	9.728,19	18,89	18,89		6,15		
Serviço	2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	27,04	35,68	963,13	18,89	18,89		6,15		
Serviço	2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	27,04	35,50	960,08	18,89	18,89		6,15		
Nível 3	3.1	PAVIMENTAÇÃO DA RUA	M2	49.542,66	0,36	17.835,37	13.440,00	5.299,97	20.707,83	10.084,88		
Serviço	3.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	49.542,66	0,36	17.835,37	13.440,00	5.299,97	20.707,83	10.084,88		
Serviço	3.2	Execução de pavimentação em pedras polidéricas.	M2	49.542,66	0,12	5.945,13	13.440,00	5.299,97	20.707,83	10.084,88		
Serviço	3.3	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	43.867,17	98,83	4.334.004,11	11.980,80	4.593,89	18.431,59	8.660,89		
Serviço	3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 06/2024	M3	981,44	17,63	17.302,79		212,48		788,95		
Nível 4	4.1	DRENAGEM	M	15.160,64	40,69	616.066,44	3.840,00	1.872,02	5.990,10	3.358,52		
Serviço	4.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	M	15.160,64	40,69	616.066,44	3.840,00	1.872,02	5.990,10	3.358,52		
Serviço	4.2	CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8/25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	15.160,64	43,52	659.791,05	3.840,00	1.872,02	5.990,10	3.358,52		
Serviço	4.3	Corpo de BOTO D = 0,80 m PAZ - areia, brita e pedras de mão comercial	M	9,05	1.637,39	14.818,38				9,05		
Serviço	4.4	Boca de BOTO D = 0,80 m - secundária 0° - areia e brita comercial - alças retas	UN	2,00	1.566,24	3.132,48				2,00		
Serviço	4.5	Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia extraída e brita produzida	UN	60,00	224,42	13.465,20		24,00		36,00		
Serviço	4.6	Descida d'água de alvenaria tipo sapão - DAR 40-20 - areia extraída e brita produzida	M	60,00	266,25	15.975,00		24,00		36,00		
Nível 5	5.1	SINALIZAÇÃO VARIA	UN	40,00	331,03	13.241,20	4,00	10,00	12,00	14,00		
Serviço	5.1	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + S1 - com acabamento e implantação.	UN	40,00	331,03	13.241,20	4,00	10,00	12,00	14,00		
Serviço	5.2	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	M2	5,00	825,27	3.126,36		2,50		2,50		
Serviço	5.3	PINTURA DE MIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAVACÃO). AF 05/2021	M	15.160,64	2,08	31.534,13	3.940,00	1.972,02	5.990,10	3.358,52		
Nível 6	6.1	SERVIÇOS FINAIS	M3	49.542,68	1,94	97.115,53	13.440,00	5.299,97	20.707,83	10.084,88		
Serviço	6.1	LIQUEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M3	49.542,68	1,94	97.115,53	13.440,00	5.299,97	20.707,83	10.084,88		



Fronteiras de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 6.083.251,43

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
-------	------	-----------	-------	------	-------------------	-------------------	----------------------



KATYANNE MARQUES
MENDONÇA:05293123360
Assinado digitalmente por KATYANNE MARQUES MENDONÇA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:57:54-03'00'
Responsável Técnico: KATYANNE MARQUES MENDONÇA
CREA / CAU: 0618018643

RUSSAS/CE, 23 de setembro de 2025
Local e Data

Nº OPERAÇÃO 1089387-11	Nº SICONV 947539	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA OPERACOES DIVERSAS	ACÃO / MODALIDADE	Grav de S #PUBLIC	DATA ASSINATURA 30/10/2023
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS				LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-		
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ 10.932.123/0001-14	OBJETO DO CTEF				INÍCIO DA OBRA

Serviços:


Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 6.093.291,43

Evento	Item Op	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid	Total por Frente (R\$)
				Qtde
1	Evento	Administração Local	R\$	235.136,00
1	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	18.559,26
2	2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00
2	2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	27,04
2	2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	27,04
2	2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	27,04
3	Evento	PAVIMENTAÇÃO DA RUA	R\$	4.375.487,40
3	3.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	49.542,68
3	3.2	Reconformação da plataforma	M2	49.542,68
3	3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	43.857,17
3	3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_06/2024	M3	951,44
4	Evento	DRENAGEM	R\$	1.325.048,55
4	4.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	15.160,64
4	4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	15.160,64
4	4.3	Corpo de BDT/D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	9,05

62.640,23	26.570,37	95.770,89	50.154,51	-	-	-
26,54	11,30	40,73	21,33	-	-	-
6.761,16	8.242,09	-	3.556,01	-	-	-
12,00	-	-	-	-	-	-
-	18,89	-	8,15	-	-	-
-	18,89	-	8,15	-	-	-
-	18,89	-	8,15	-	-	-
1.190.513,67	459.316,03	1.631.533,80	894.123,89	-	-	-
13.440,00	5.299,97	20.707,83	10.094,88	-	-	-
13.440,00	5.299,97	20.707,83	10.094,88	-	-	-
11.980,80	4.593,89	18.431,59	8.950,89	-	-	-
323.366,40	212,49	-	758,95	-	-	-
-	177.911,88	504.426,32	319.343,95	-	-	-
3.840,00	1.972,02	5.990,10	3.358,52	-	-	-
3.840,00	1.972,02	5.990,10	3.358,52	-	-	-
-	-	-	9,05	-	-	-

Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONCA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:58:29-03'00"



Serviços:

Todos

Modo de Exibição:

Eventos

Frete de Obra:

Valor do Investimento: R\$ 6.093.291,43

Evento	Item	Qtd	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frete (R\$)
					Qtd

4	4.4		Boca de BDTIC D = 0,60 m - esquadria 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	2,00
4	4.5		Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia extraída e brita produzida	UN	60,00
4	4.6		Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia extraída e brita produzida	M	60,00
5	Evento		SINALIZAÇÃO VIARIA	R\$	47.901,69
5	5.1		Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	40,00
5	5.2		Placa em aço - película I + II - fornecimento e implantação	M2	5,00
5	5.3		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF_05/2021	M	15.160,64
6	Evento		SERVIÇOS FINAIS	R\$	91.158,53
6	6.1		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M3	49.542,68

RUSSAS/CE, 23 de setembro de 2025

Local e Data

Responsável Técnico: KATYANNE MARQUES MENDONÇA
CREA / CAU: 0618016543

KATYANNE MARQUES MENDONÇA
Assinado digitalmente por KATYANNE MARQUES MENDONÇA:05293123360
Data: 2025.10.23 16:58:45 -03'00'

SITIO BOM SUCESSO	DEPAQUINHIA	SITIO INCA	RAVAL DE FLORES	5	6
1.817.325,38	880.767,60	2.486.265,19	1.298.338,26		
-	-	-	2,00	-	-
-	24,00	-	36,00	-	-
-	24,00	-	36,00	-	-
9.311,32	8.975,28	16.431,77	13.183,32	-	-
4,00	10,00	12,00	14,00	-	-
-	2,50	-	2,50	-	-
3.840,00	1.972,02	5.990,10	3.358,52	-	-
24.729,60	9.751,94	38.102,41	18.574,58	-	-
13.440,00	5.299,97	20.707,83	10.094,88	-	-

Nº OPERAÇÃO 1089387-11	Nº SICONV 947539	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA OPERACOES DIVERSAS	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 30/10/2023
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS			MUNICÍPIO / UF RUSSAS/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ 10.932.123/0001-14	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA	

1	SITIO BOM SUCESSO	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	REFACTORIA	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	SITIO INGA	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	PARQUE DE FLORES	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.


1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Cronograma	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
Parcela	% 25,96%	0,72%	10,88%	0,32%	40,16%	0,65%	15,32%	5,99%
Acumulado	R\$ 1.581.677,08	43.980,17	682.805,12	13.478,90	2.446.812,74	39.631,77	933.711,19	365.194,46
	% 25,96%	26,68%	37,56%	37,88%	78,03%	78,68%	94,01%	100,00%
	R\$ 1.581.677,08	1.625.657,25	2.268.462,37	2.307.941,27	4.754.754,02	4.794.385,79	5.728.096,97	6.093.291,43

RUSSAS/CE 23 de setembro de 2025
Local e Data

KATYANNE MARQUES
MENDONCA.05293123360
Data: 2025.10.23 16:59:02-03'00"

Responsável Técnico: KATYANNE MARQUES
CREA / CAU: 0618016843



CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO 108202-11	Nº SICONV 047583	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA OPERAÇÕES DIVERSAS	AÇÃO / MODALIDADE	Grav de Sigilo #PUBLICO
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	MUNICÍPIO / UF RUSSAS/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE - PT-00000007	DATA ASSINATURA 30/10/2023		
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ 10.833.172/0001-14	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA		

		% Realizado Acum.: 100,00%		Período:		DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO		Medição:		08	

41211-1008

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Matos do Excel deve ser habilitada.

2.1 Na versão final 2003, o documento de segurança do Excel deve ser habilitada.

2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas -> Macro -> Soma

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior selecionar o seguinte caminho:

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo -> Opções ->

[illegible]

Confiabilidade -> Configurações do Macro -> Habilitar todas as Macros -> Clique em OK

Il Cardinale de Quercy a été nommé

4.1. Espaço de Onda

4.1.1. Primeiramente, preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

4.1.2. Digite abaixo os valores mínimos de Contrapartida exigidos pelo Programa.

VALOR ABSOLUTO (RS)	
%MÍNIMO	0.21%

4.1.3. Clique no botão "Preencher QCF abaixo".

4.1.4. Preencha os Campos das Melas na Aba QCI - Quadro de Composição de Investimento.

4.1.5. Preencha os Campos das Parcelas de Desembolso na Aba Crono - CFF-CT - Cronograma Físico-Financeiro do Contrato.

4.2. Fase de Licitação

4.2.1. Atualize os Dados do QCE e Cronograma Físico-Financeiro.

4.2.2. Insira no Quadro abaixo os dados dos CTEFs.

[illegible]

1.3. Fases de Solicitação de Recursos

4.3.1. Preencha os Dados da Medição na Aba RRE - Relatório Resumo do Empreendimento

4.3.2. Preenche os Campos na Aba Ofício, para o Ofício de Solicitação de Recursos e Relação de Fornecedoras.

41.211 v009 m10a

Assinado digitalmente por SAVIO GURGEL
 COCER-0435560153320
 A1 CUPB, 04-CF-Grati, 04-CE-Certificado Digital PF
 01 CUPB, 04-CF-Grati, 04-CE-Certificado Digital PF
 SINGUEIRA:455 NOGUEIRA:45560153320
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizado:
 Data: 2025.05.22 15:01:40-03'00'
 Fout PDF Reader Versão: 2025.1.0

**KATYANNE
MARQUES**
Assinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES
MENDONCA:0529312336
MENDONCA:0520

Data: 2025.09.22
10:49:43-03'00'



CAIXA

CAIXA Nº OPERAÇÃO 1009387-11 Nº SICOMV 947539 GESTOR CAIXA
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
OBJETO PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE
PROGRAMA OPERAÇÕES DIVERSAS AÇÃO / MODALIDADE OPERAÇÕES DIVERSAS
MUNICÍPIO / UF RUSSAS/CE LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL
APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIEDRICA NA ZONA RURAL
RECURSO OGU PAC
VALORES CONTRATADOS (R\$)
REPASSO 5.743.773,00 CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 349.518,43
6.093.291,43

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Início Previsto
jan-26

Etapa	Método / Sub-Método	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)	Parcela 1 fev-26	Parcela 2 mar-26	Parcela 3 abr-26	Parcela 4 mai-26	Parcela 5 jun-26	Parcela 6 jul-26	Parcela 7 ago-26	Parcela 8 set-26
				392.140,83 23.862,43 0,00 416.003,26	533.927,10 32.490,38 0,00 566.417,48	768.216,96 46.747,44 0,00 814.964,40	1.131.517,23 68.854,76 0,00 1.200.371,99	821.168,89 49.969,53 0,00 871.138,42	760.430,07 47.490,51 0,00 807.920,58	841.136,86 51.184,63 0,00 892.321,50	475.233,16 28.918,75 0,00 504.151,91
				6,83% 0,00% 0,00% 6,83%	9,29% 5,25% 0,00% 9,29%	12,99% 10,29% 0,00% 12,99%	15,76% 14,29% 0,00% 15,76%	18,53% 16,29% 0,00% 18,53%	21,30% 18,79% 0,00% 21,30%	24,07% 21,29% 0,00% 24,07%	26,84% 23,81% 0,00% 26,84%
				392.140,83 23.862,43 0,00 416.003,26	926.067,73 56.352,81 0,00 982.420,54	1.694.236,69 103.100,25 0,00 1.797.336,94	2.825.803,92 171.955,01 0,00 2.997.758,93	3.646.972,81 221.924,54 0,00 3.868.897,35	4.427.402,88 269.415,05 0,00 4.696.817,93	5.268.539,84 320.599,68 0,00 5.589.139,53	6.093.291,43 349.518,43 0,00 6.442.809,86
1	Meta	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIEDRICA NA ZONA RURAL	6.093.291,43	416.003,26	982.420,54	1.797.336,94	2.997.758,93	3.868.897,35	4.696.817,93	5.589.139,53	6.442.809,86

SAVIO GURGEL NOGUEIRA:455 60153320
Local: RUSSAS/CE
Data: 22 de setembro de 2025

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: SAVIO GURGEL NOGUEIRA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

KATYANNE MARQUES MENDONÇA:0520 93123360
Assinado digitalmente por KATYANNE MARQUES MENDONÇA:0529312336
Data: 2025.09.22 10:49:43-03'00'



Grau de Sigilo
#PUBLICO

NATHAN DE
SANTANA
REBOUÇAS NET
07820200

PROFESSOR MATEMATICA 01 BPT

PROFESSOR MATEMATICA 01 BPT

PROFESSOR MATEMATICA 01 BPT

PROFESSOR MATEMATICA 01 BPT

PROFESSOR MATEMATICA 01 BPT

PROFESSOR MATEMATICA 01 BPT


PROFESSOR MATEMATICA 01 BPT

TRAVESSA FRANCISCO CARNEIRO

TRAVESSA FRANCISCO CARNEIRO

TRAVESSA FRANCISCO CARNEIRO

TRAVESSA FRANCISCO CARNEIRO



COORDENADA DE LOCALIZAÇÃO UTM-SIGLAS 2000
E-0 6054427m
E-0 94560076m

PLANTA LOCALIZAÇÃO (E-30 A E-65)

PLANTA LOCALIZAÇÃO (E-0 A E-30)


[Handwritten signature]

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁFICO E TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ZOOQUILA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PAZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁFICO E TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ZOOQUILA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PAZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁFICO E TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ZOOQUILA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PAZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁFICO E TRANSPORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ZOOQUILA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PAZ	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
--	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------------	--	--	-----------------------------------	--	--




QUILÔMETRO DE LOCALIZAÇÃO DA RUA 2000
E-65
LUAZIL DO SUL
RS 91.600-000

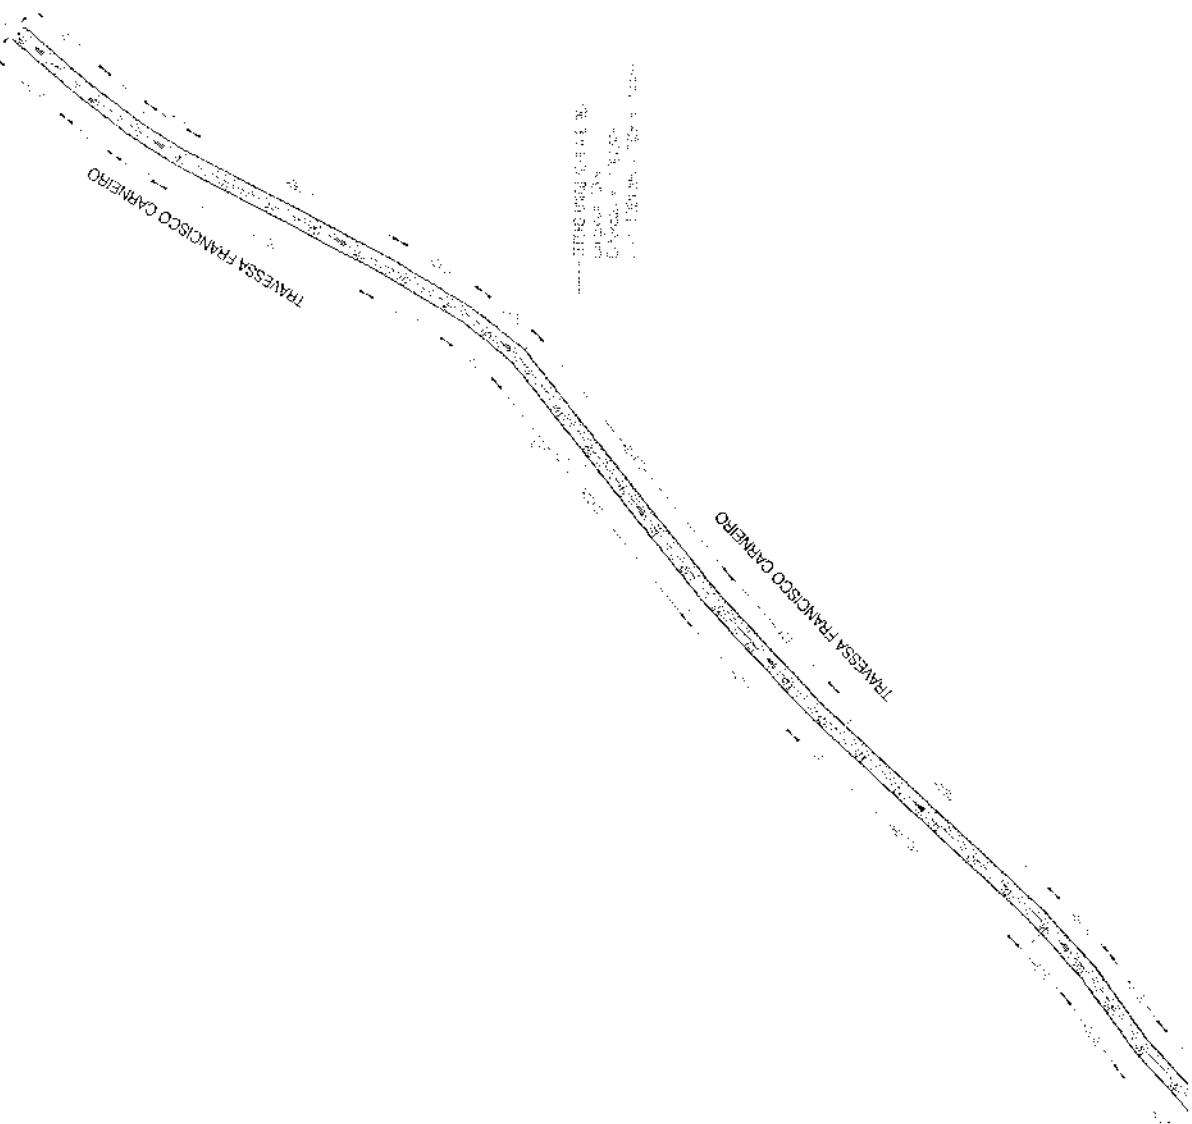

PLANTA LOCALIZAÇÃO IE-65 A E-96
1:1000

TRAVESSA FRANCISCO CARNEIRO

1:1000




PERFIL LONGITUDINAL (E-0 A E-50)
ESQ: 1:1000

TRAVESSA FRANCISCO CARNEIRO



Perfil Longitudinal - E-0

1:1000

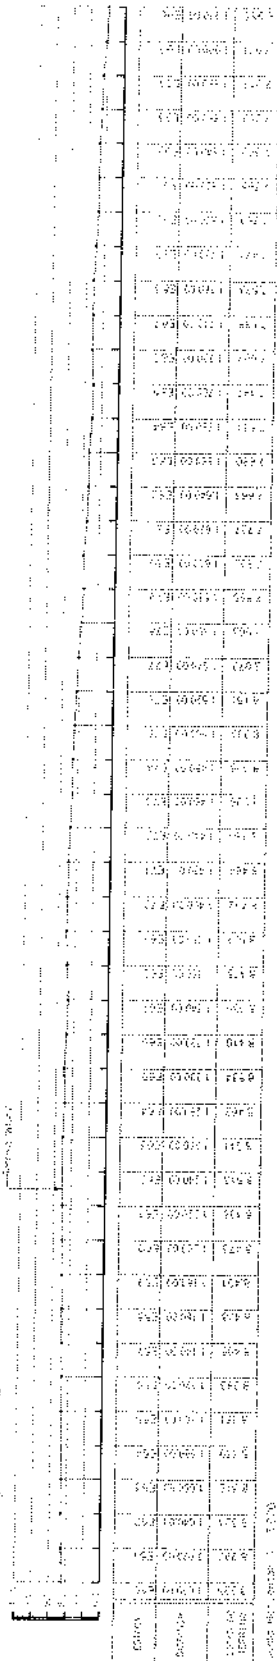

PERFIL LONGITUDINAL (E-50 A E-96)
ESQ: 1:1000

TRECHO ÚNICO MÉTODO CONSTRUTIVO PERFIL TRANSVERSAL NÍVEL DO CALÇAMENTO COLCHÃO DE AREIA E PEDRA - 0,15m





Execução de arçabata de concreto armado, moldado in loco, 30 cm base x 10 cm altura

PERFIL TRANSVERSAL
ESQ: 5/1

NATHAN DE
MAYES
PREFEITO MUNICIPAL DE RIB
67203709

APROVADO
NATHAN DE
MAYES
PREFEITO MUNICIPAL DE RIB
67203709





40
40
40
40
40

PLANTA SINALIZAÇÃO (E-30 A E-65)
E-30 A E-65



DETERMINA DE LOCALIZAÇÃO DE RUA - RUA 2000
E-30
E-30 50,56127m
NTH 9,456076m

PLANTA SINALIZAÇÃO (E-0 A E-30)
E-0 A E-30

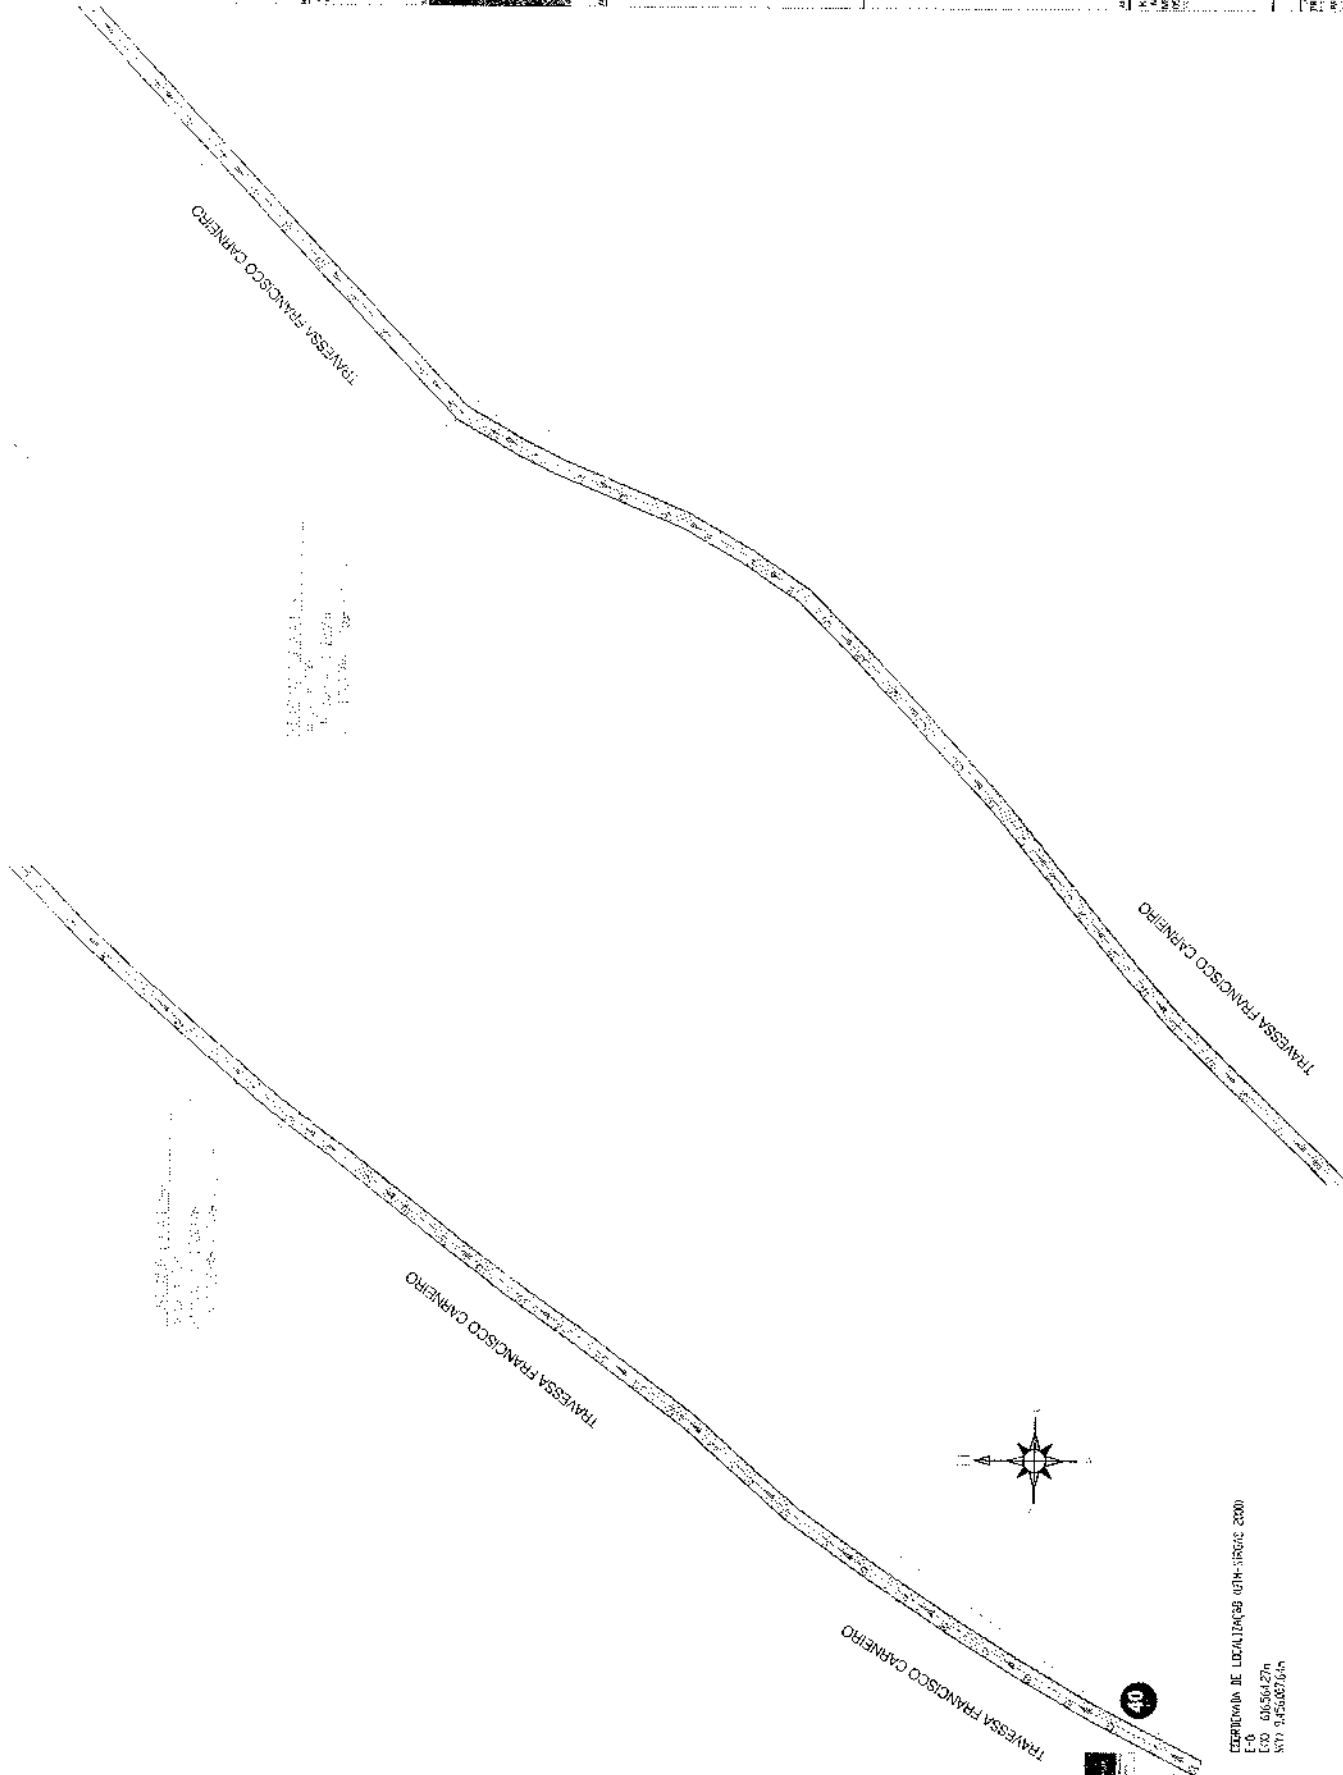

NATHAN DE
MARTINS
RESOLUÇÃO Nº 174/2017
DE 07/03/2017

NATHAN DE
MARTINS
RESOLUÇÃO Nº 174/2017
DE 07/03/2017



PLANO DE
TRABALHO

PLANO DE
TRABALHO

PLANO DE
TRABALHO

PLANO DE
TRABALHO

PLANO DE
TRABALHO

CONCEPCION D. DA SILVA
FONE: 02736-044
RTE: 0457-035-54



40

TRAVESSA FRANCISCO CARNEIRO

TRAVESSA FRANCISCO CARNEIRO

PLANTA LOCAÇÃO (E-65 A E-96)
0391 1 - 000



LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO (E-30 A E-65)

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO (K-O A E-36)

0393

ASSINADO
ELETTRONICAMENTE

MATTHEW DE
 MATOS
 REQUICAS-057
 67123190

ANALYST: FILE #
KATYARINTE
MARQUES
MENDOZA
05203123M9

[illegible][illegible]

CREDIT CARD NO. 1601176587 6011 7765 8765
 EXP. DATE 01/2025
 MCC 9457 5562

TRAVESSA FRANCISCO CARRNEIRO

TRANSISA FTA-10000 CARNEIRO

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO (E-65 A E-96)
Escala: 1"=100'

0001-1100

PLANTA GERAL LOCAÇÃO

COORDENADAS EM UTM		
VERT.	ESTE	NORTE
V1	616300,25	9454074,24
V2	616307,16	9454074,76
V3	617317,85	9455532,58
V4	617321,06	9455530,74

COORDENADAS EM UTM		
VÉRTICE	ESTE	NORTE
V1	616900,25	9454974,24
V2	616907,16	9454974,76
V3	617317,85	9455592,58
V4	617321,96	9455589,74



PLANTA SITUACIÓN - RODOVIA CE-356

PLANTA SITUACÃO - RODOVIA CE-356 - DEMOLIÇÃO


[illegible]

0396


ASSINADO
ELECTRONICAMENTE

**NATHAN DE
MATOS
REBOUCAS** 05767829390
Assessor digital marketing
por NATAN DE
MATOS
REBOUCAS 05767829390
Data: 2023-01-22
05767829390

KATHARINE MARQUES
MARQUES
TAE NIDONCA
6.5293 x 10⁸

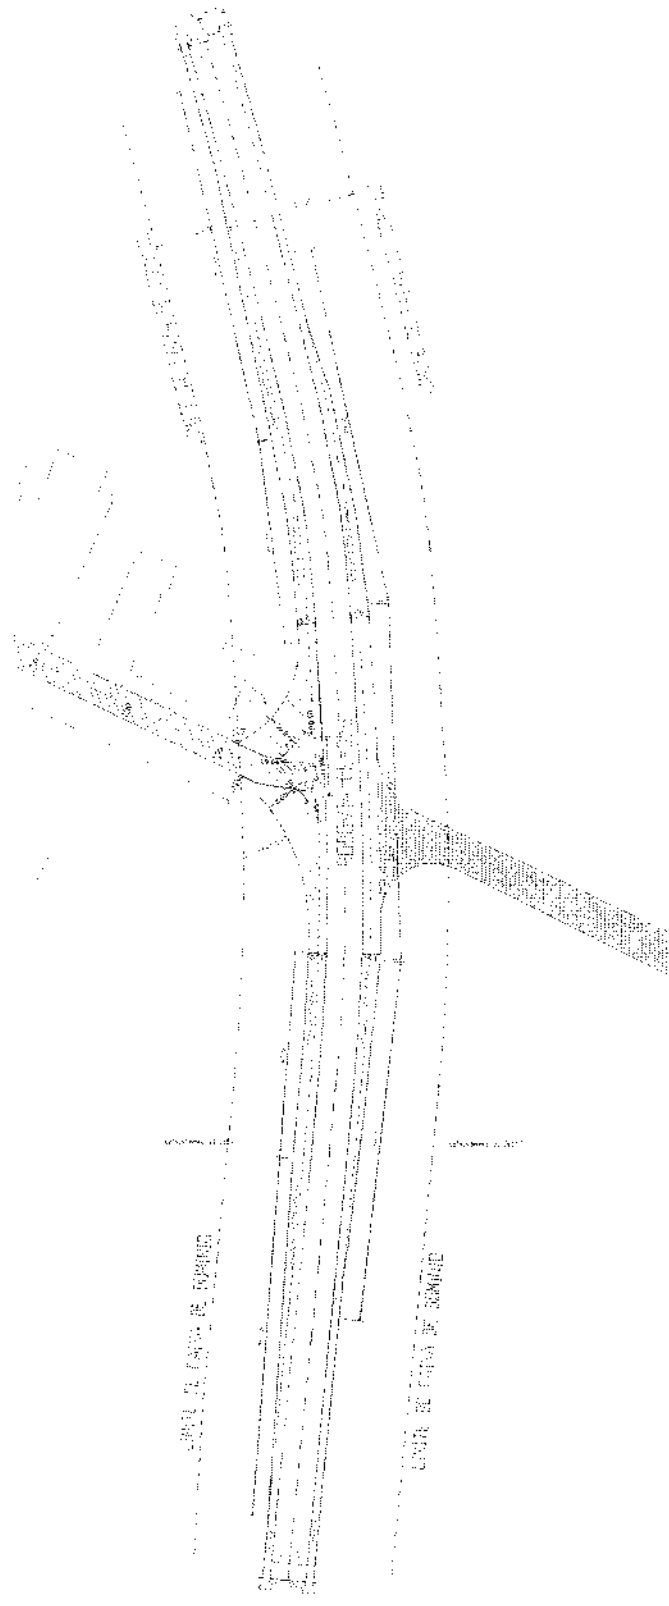[illegible]

PROJETO GEOMÉTRICO - RODOVIA CE-356

[illegible]

COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO:

MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
DIMENSÃO = 80x8x25 cm





BASE
ESPESSURA = 25 cm



PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉTRICA
ESPESSURA = 5 cm



COLCHÃO DE AREIA E PEDRA
ESPESSURA = 20 cm

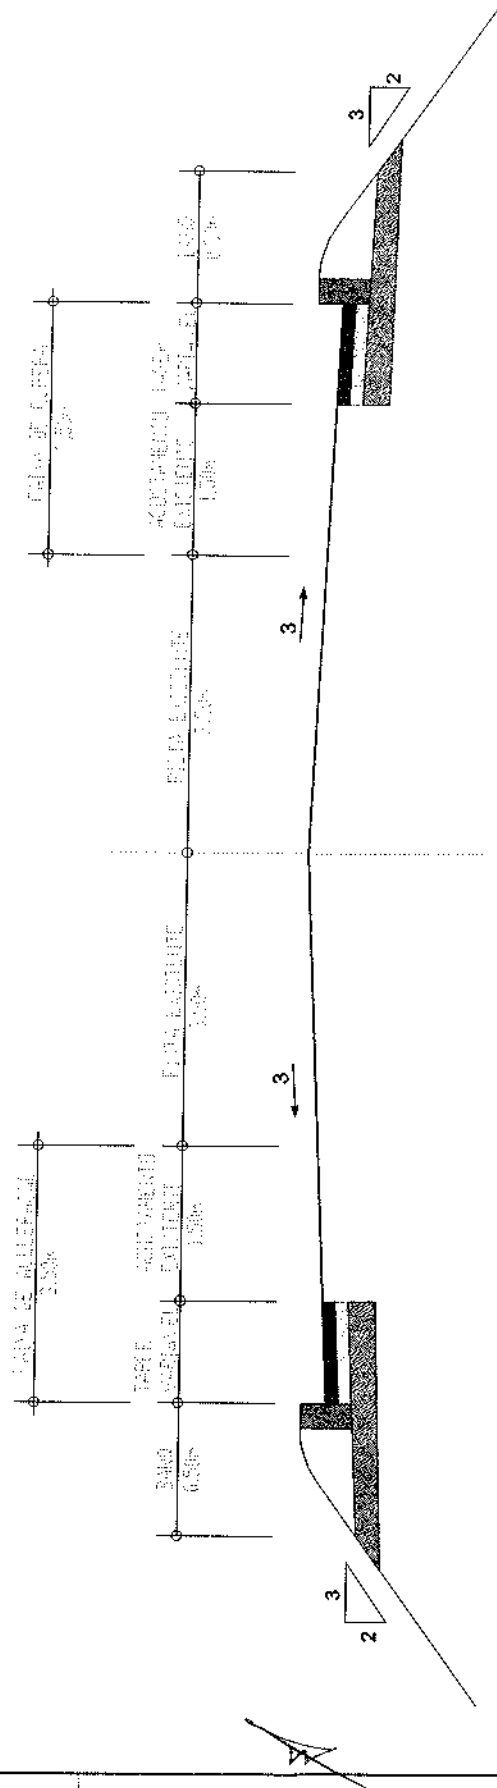

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO - RODOVIA CE-356

MAIORES ANÁLISES
NATHAN DE MATOS
MATEUS
MATEUS
MATEUS

NATHAN DE MATOS
MATOS
REBOUCAS
057678390

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO







ET-00 OU CONFORME PLANTA DE ORENHAÇÃO



DETALHE 3: MEIO-FIO E SARJETA




0400


ASSINADO
E TRONICAMENTE

**NATHAN DE
MATOS
REBOUCAS**
05767829390

	TYAINE	PROFESSOR	-
	ARQUES	10-46478	-
	INDONICA	10-46479	-
	BUTYRAC	10-46480	-

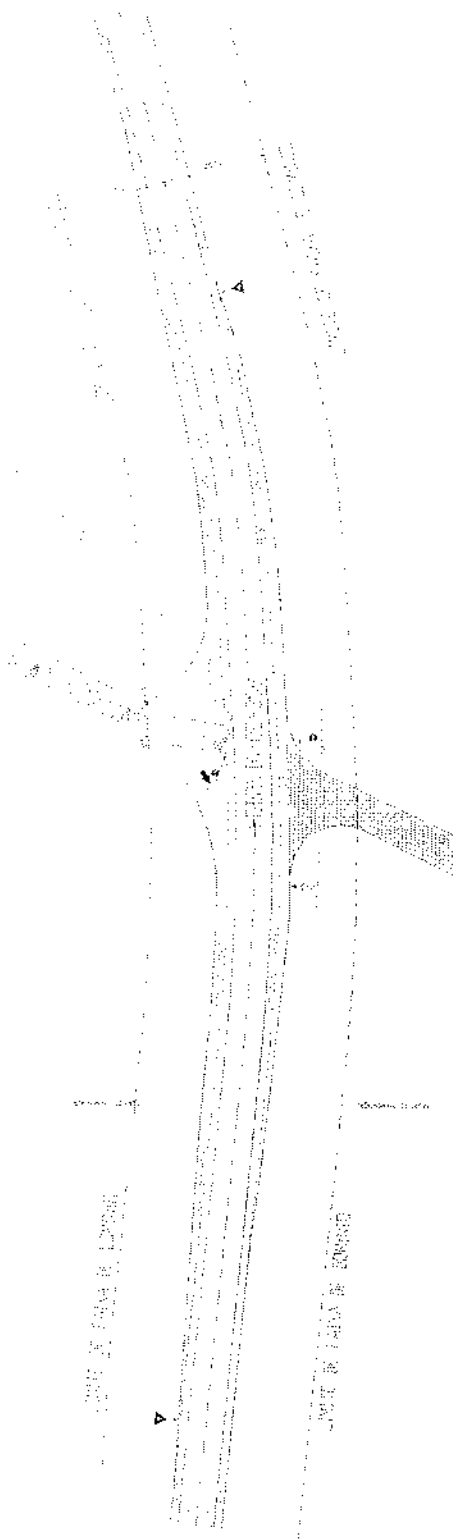[illegible]

PLANTA SINALIZAÇÃO - RODOVIA CE-356

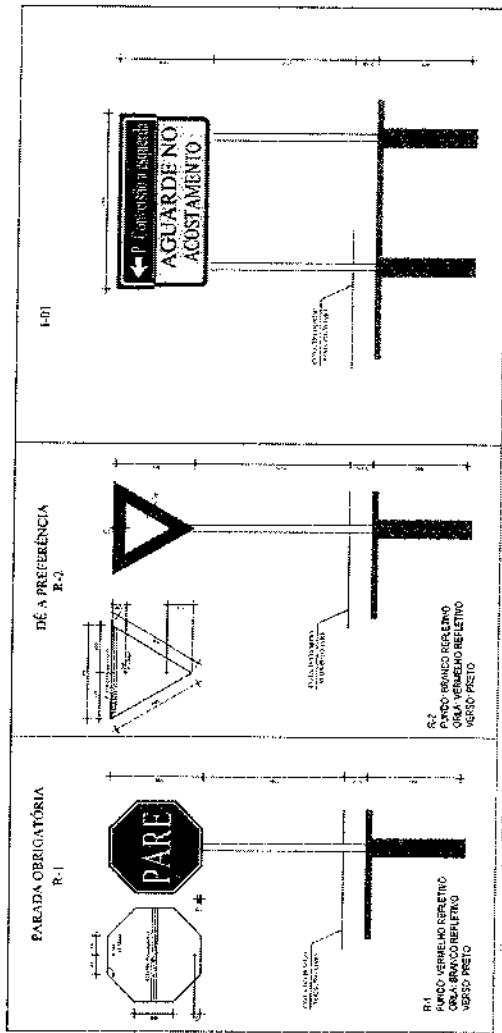

PLACAS REGULAMENTARES

DETALHE DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

0.10' BORDA DA PISTA
PAYA BRANCA INTERVALAS NO BORDO (4.00x4.00) ESP.12cm
LINHA SIMPLES TRACELADA BRANCA (4.00x4.00) NO EIXO ESP.12cm
EIXO DA PISTA
PAYA BRANCA CONTINUA NO BORDO ESP.12cm
 0.10'

0401

ASSINADO
ELETTRONICAMENTE

NATHAN DE
MATOS
REBOUCAS: 0390
05767829390
Assinada digitalmente por NATHAN DE MATOS
Data: 2025.09.24
Hora: 11:40:03AM

KATHYANNE 602.950.2000
MARQUES 602.950.2000
MENDONCA 602.950.2000
65290.1234567890


[illegible]

PLANTA LOCAÇÃO (R\$ 19 A E38+18.00)

PLANTA LOCAÇÃO (E-O A E-19)

Abstract

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



333 SARJEIA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO,
COM DIMENSÃO 30 cm BASE X 10 cm ALTURA

Assistentente de sala (muito-bom)
em trabalho pré-fabricado,
construção (100x100x250cm, para

PLANTA SINALIZAÇÃO (E29 A E38+18,00)

PLANTA SINALIZAÇÃO (E0 A E19)

40



2000

PARÉ

100%

Received 29 July 2009; accepted 12 August 2009; first published online 10 September 2009

through

●

2002

CLUMP

454

2.1

3.00

KATYARINE

MARQUES
 MENDONÇA, W.
 5520312-1986

NATHAN

INFLUENCE OF MATERNAL REPRODUCTION

0576782
REBUO[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE

THE

...and the ...

$$\begin{array}{ccccccc} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Assinado eletronicamente
por NATHAN DE
MATOS REBOUCAS
CPF: 05767833900
Data: 2023.03.12
Hora: 10:18:34 (GMT-03:00)

PREFETURA MUNICIPAL DE BR
PANEQUEIRA - GOIÁS
PREFEITO: NATHAN DE
MATOS REBOUCAS
Vice-Prefeito: NATHAN DE
MATOS REBOUCAS
Secretaria de Planejamento
e Desenvolvimento Urbano
Nathan de Matos Reboucas
CPF: 05767833900




LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO (E-19 A E-38+18,00)

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO (E-0 A E-19)

LEGENDA



- 1. BORDO DA VIA
- 2. BORDO DA VIA
- 3. BORDO DA VIA
- 4. BORDO DA VIA
- 5. BORDO DA VIA
- 6. BORDO DA VIA
- 7. BORDO DA VIA
- 8. BORDO DA VIA
- 9. BORDO DA VIA
- 10. BORDO DA VIA
- 11. BORDO DA VIA
- 12. BORDO DA VIA
- 13. BORDO DA VIA
- 14. BORDO DA VIA
- 15. BORDO DA VIA
- 16. BORDO DA VIA
- 17. BORDO DA VIA
- 18. BORDO DA VIA
- 19. BORDO DA VIA
- 20. BORDO DA VIA
- 21. BORDO DA VIA
- 22. BORDO DA VIA
- 23. BORDO DA VIA
- 24. BORDO DA VIA
- 25. BORDO DA VIA
- 26. BORDO DA VIA
- 27. BORDO DA VIA
- 28. BORDO DA VIA
- 29. BORDO DA VIA
- 30. BORDO DA VIA
- 31. BORDO DA VIA
- 32. BORDO DA VIA
- 33. BORDO DA VIA
- 34. BORDO DA VIA
- 35. BORDO DA VIA
- 36. BORDO DA VIA
- 37. BORDO DA VIA
- 38. BORDO DA VIA
- 39. BORDO DA VIA
- 40. BORDO DA VIA
- 41. BORDO DA VIA
- 42. BORDO DA VIA
- 43. BORDO DA VIA
- 44. BORDO DA VIA
- 45. BORDO DA VIA
- 46. BORDO DA VIA
- 47. BORDO DA VIA
- 48. BORDO DA VIA
- 49. BORDO DA VIA
- 50. BORDO DA VIA
- 51. BORDO DA VIA
- 52. BORDO DA VIA
- 53. BORDO DA VIA
- 54. BORDO DA VIA
- 55. BORDO DA VIA
- 56. BORDO DA VIA
- 57. BORDO DA VIA
- 58. BORDO DA VIA
- 59. BORDO DA VIA
- 60. BORDO DA VIA
- 61. BORDO DA VIA
- 62. BORDO DA VIA
- 63. BORDO DA VIA
- 64. BORDO DA VIA
- 65. BORDO DA VIA
- 66. BORDO DA VIA
- 67. BORDO DA VIA
- 68. BORDO DA VIA
- 69. BORDO DA VIA
- 70. BORDO DA VIA
- 71. BORDO DA VIA
- 72. BORDO DA VIA
- 73. BORDO DA VIA
- 74. BORDO DA VIA
- 75. BORDO DA VIA
- 76. BORDO DA VIA
- 77. BORDO DA VIA
- 78. BORDO DA VIA
- 79. BORDO DA VIA
- 80. BORDO DA VIA
- 81. BORDO DA VIA
- 82. BORDO DA VIA
- 83. BORDO DA VIA
- 84. BORDO DA VIA
- 85. BORDO DA VIA
- 86. BORDO DA VIA
- 87. BORDO DA VIA
- 88. BORDO DA VIA
- 89. BORDO DA VIA
- 90. BORDO DA VIA
- 91. BORDO DA VIA
- 92. BORDO DA VIA
- 93. BORDO DA VIA
- 94. BORDO DA VIA
- 95. BORDO DA VIA
- 96. BORDO DA VIA
- 97. BORDO DA VIA
- 98. BORDO DA VIA
- 99. BORDO DA VIA
- 100. BORDO DA VIA

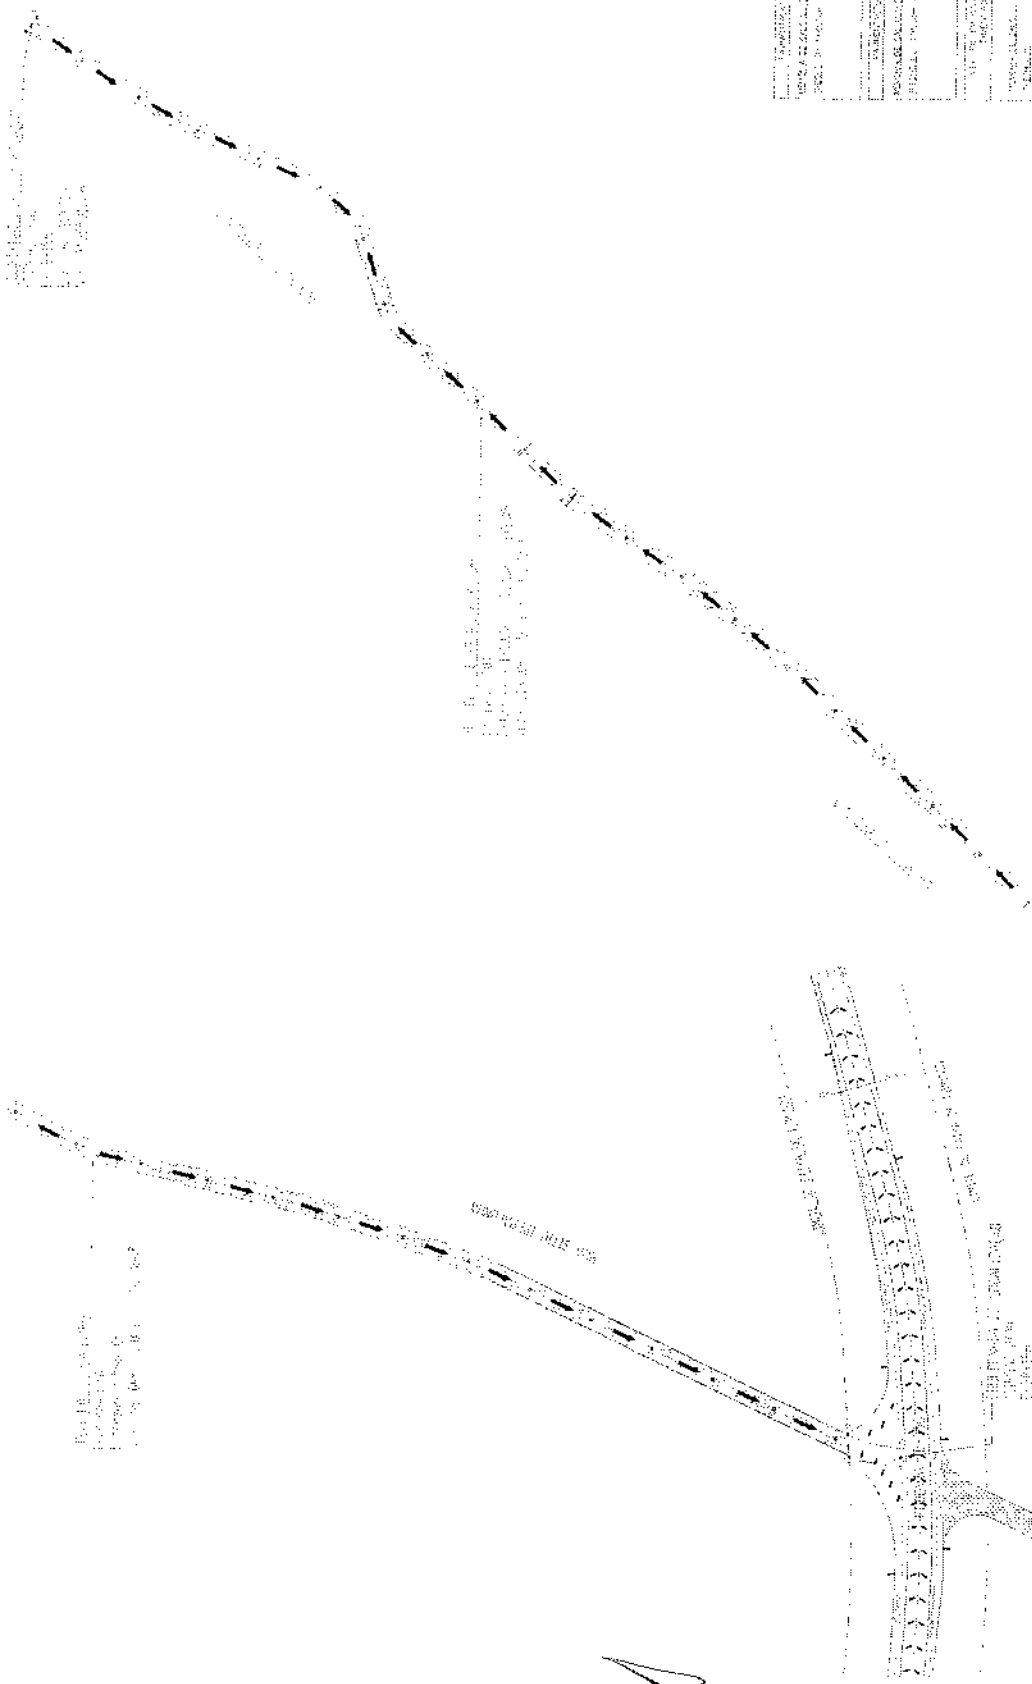

PLANTA DRENAGEM (€19 A €38+18,00)

PLANTA DRENAGEM (E-O & E-12)

NATHAN DE
MATOS
REBOUCAS
057878293906
06/06/1903

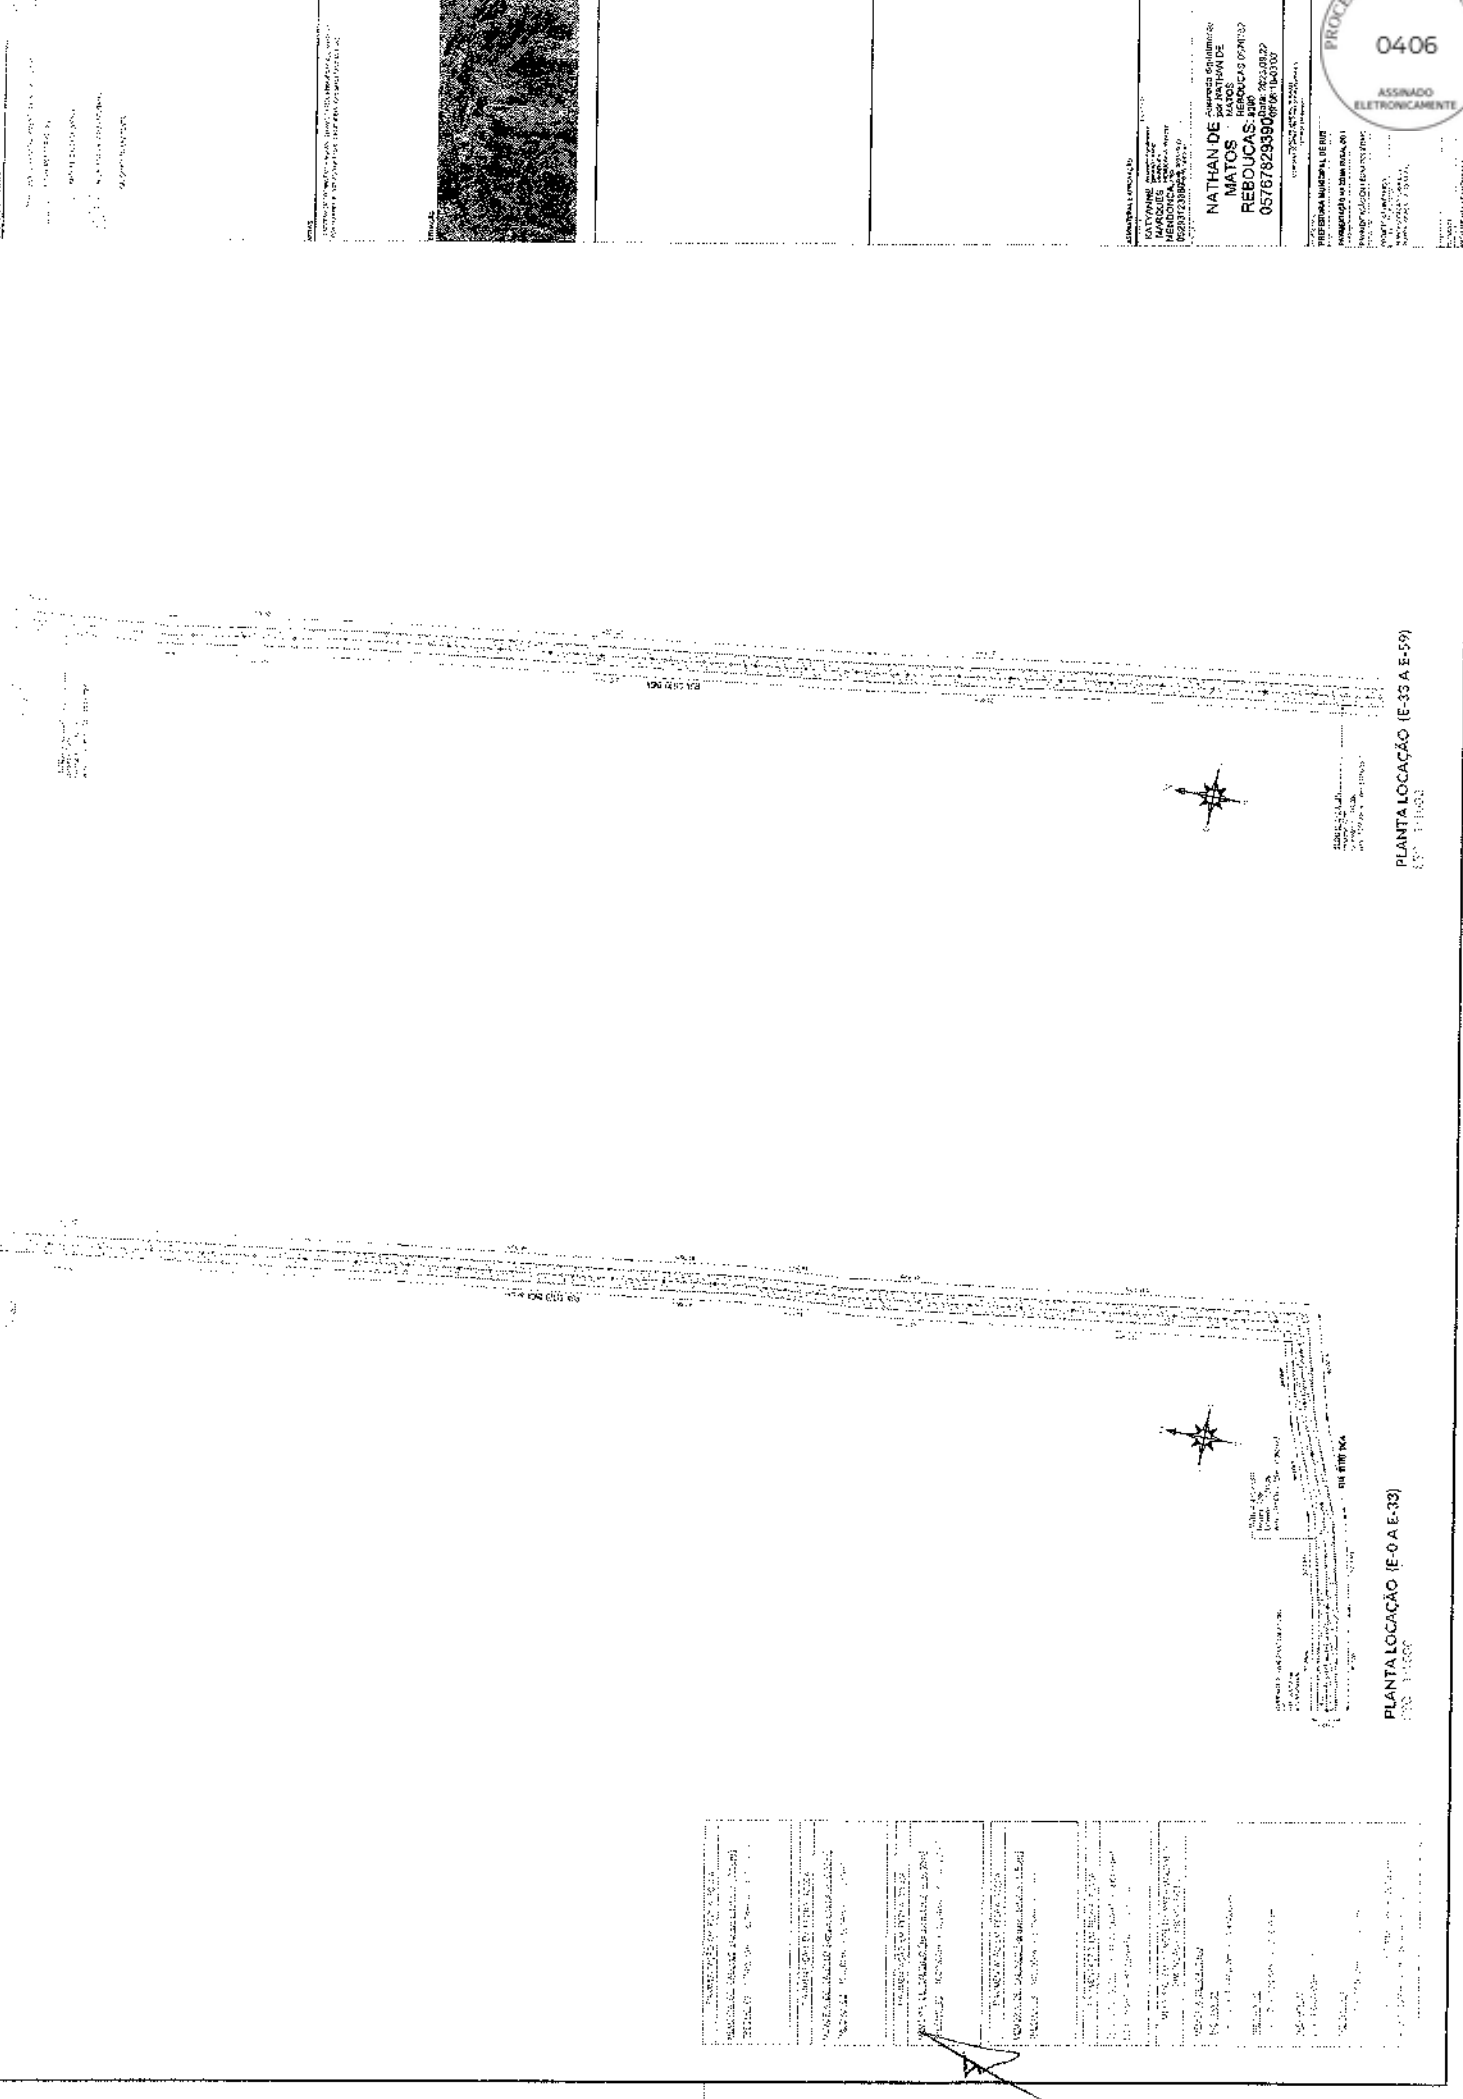

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO	2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO	3. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO	4. IDENTIFICAÇÃO DO CENSO	5. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO	6. IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO	7. IDENTIFICAÇÃO DO PAÍS	8. IDENTIFICAÇÃO DO CONTATO	9. IDENTIFICAÇÃO DO ENDEREÇO	10. IDENTIFICAÇÃO DO CEP	11. IDENTIFICAÇÃO DO UF	12. IDENTIFICAÇÃO DO CID	13. IDENTIFICAÇÃO DO BA	14. IDENTIFICAÇÃO DO LOTE	15. IDENTIFICAÇÃO DO QUADRA	16. IDENTIFICAÇÃO DO ZONEAMENTO	17. IDENTIFICAÇÃO DO VALOR	18. IDENTIFICAÇÃO DO DATA	19. IDENTIFICAÇÃO DO ASSINADO	20. IDENTIFICAÇÃO DO CANCELADO
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

0407

ASSINADO
ELETRONICAMENTE

**NATHAN DE
MATOS**
REBOUCAS: 8190
05767829390
Data: 2025.01.27
06:06 12-0703

FILED MUNICIPAL DE AVE

.....

[illegible]
$$\sum_{i=1}^n \log \frac{p_i}{q_i} = \log \frac{p_1 p_2 \cdots p_n}{q_1 q_2 \cdots q_n} = \log \frac{p}{q} = \log \frac{1}{q/p} = -\log \frac{q}{p}.$$

Run	Time (min)	Temp (°C)	Pressure (mm Hg)	Flow Rate (ml/min)	Detector Response
1	10.0	100	1.0	0.5	0.00
2	20.0	100	1.0	0.5	0.00
3	30.0	100	1.0	0.5	0.00
4	40.0	100	1.0	0.5	0.00
5	50.0	100	1.0	0.5	0.00
6	60.0	100	1.0	0.5	0.00
7	70.0	100	1.0	0.5	0.00
8	80.0	100	1.0	0.5	0.00
9	90.0	100	1.0	0.5	0.00
10	100.0	100	1.0	0.5	0.00
11	110.0	100	1.0	0.5	0.00
12	120.0	100	1.0	0.5	0.00
13	130.0	100	1.0	0.5	0.00
14	140.0	100	1.0	0.5	0.00
15	150.0	100	1.0	0.5	0.00
16	160.0	100	1.0	0.5	0.00
17	170.0	100	1.0	0.5	0.00
18	180.0	100	1.0	0.5	0.00
19	190.0	100	1.0	0.5	0.00
20	200.0	100	1.0	0.5	0.00
21	210.0	100	1.0	0.5	0.00
22	220.0	100	1.0	0.5	0.00
23	230.0	100	1.0	0.5	0.00
24	240.0	100	1.0	0.5	0.00
25	250.0	100	1.0	0.5	0.00
26	260.0	100	1.0	0.5	0.00
27	270.0	100	1.0	0.5	0.00
28	280.0	100	1.0	0.5	0.00
29	290.0	100	1.0	0.5	0.00
30	300.0	100	1.0	0.5	0.00
31	310.0	100	1.0	0.5	0.00
32	320.0	100	1.0	0.5	0.00
33	330.0	100	1.0	0.5	0.00
34	340.0	100	1.0	0.5	0.00
35	350.0	100	1.0	0.5	0.00
36	360.0	100	1.0	0.5	0.00
37	370.0	100	1.0	0.5	0.00
38	380.0	100	1.0	0.5	0.00
39	390.0	100	1.0	0.5	0.00
40	400.0	100	1.0	0.5	0.00
41	410.0	100	1.0	0.5	0.00
42	420.0	100	1.0	0.5	0.00
43	430.0	100	1.0	0.5	0.00
44	440.0	100	1.0	0.5	0.00
45	450.0	100	1.0	0.5	0.00
46	460.0	100	1.0	0.5	0.00
47	470.0	100	1.0	0.5	0.00
48	480.0	100	1.0	0.5	0.00
49	490.0	100	1.0	0.5	0.00
50	500.0	100	1.0	0.5	0.00
51	510.0	100	1.0	0.5	0.00
52	520.0	100	1.0	0.5	0.00
53	530.0	100	1.0	0.5	0.00
54	540.0	100	1.0	0.5	0.00
55	550.0	100	1.0	0.5	0.00
56	560.0	100	1.0	0.5	0.00
57	570.0	100	1.0	0.5	0.00
58	580.0	100	1.0	0.5	0.00
59	590.0	100	1.0	0.5	0.00
60	600.0	100	1.0	0.5	0.00
61	610.0	100	1.0	0.5	0.00
62	620.0	100	1.0	0.5	0.00
63	630.0	100	1.0	0.5	0.00
64	640.0	100	1.0	0.5	0.00


2000

PLANTA LOCAÇÃO (E-85 A E-111)
 0000 1000PLANTA LOCAÇÃO (E-59 A E-85)
(1960-1970)


22

1. *Introduction*


PLANTA LONGITUDINAL (E-0 A E-76)

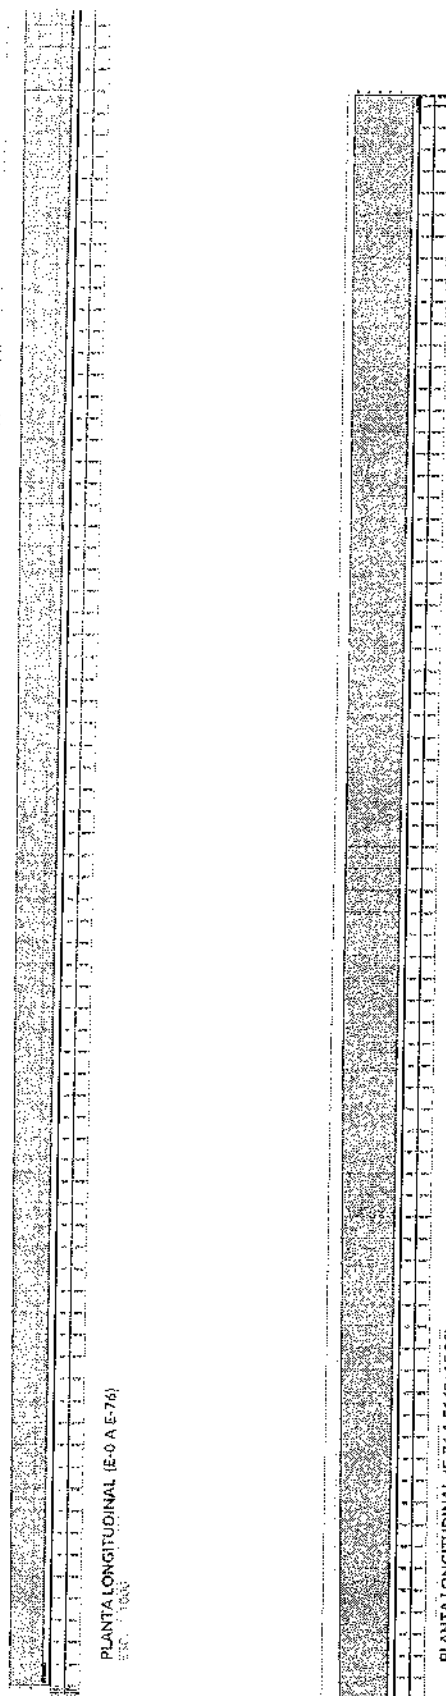


PLANTA LONGITUDINAL (E-76 A E149+15.05)




TRECHO 01
MÉTODO CONSTRUTIVO
PERFIL TRANSVERSAL
NÍVEL DO CALÇAMENTO
COLCHÃO DE AREIA E PEDRA - 0,20m




TRECHO 02
MÉTODO CONSTRUTIVO
PERFIL TRANSVERSAL
NÍVEL DO CALÇAMENTO
COLCHÃO DE AREIA E PEDRA - 0,20m





TRECHO 03
MÉTODO CONSTRUTIVO
PERFIL TRANSVERSAL
NÍVEL DO CALÇAMENTO
COLCHÃO DE AREIA E PEDRA - 0,20m



TRECHO 04
MÉTODO CONSTRUTIVO
PERFIL TRANSVERSAL
NÍVEL DO CALÇAMENTO
COLCHÃO DE AREIA E PEDRA - 0,20m



PERFIL TRANSVERSAL

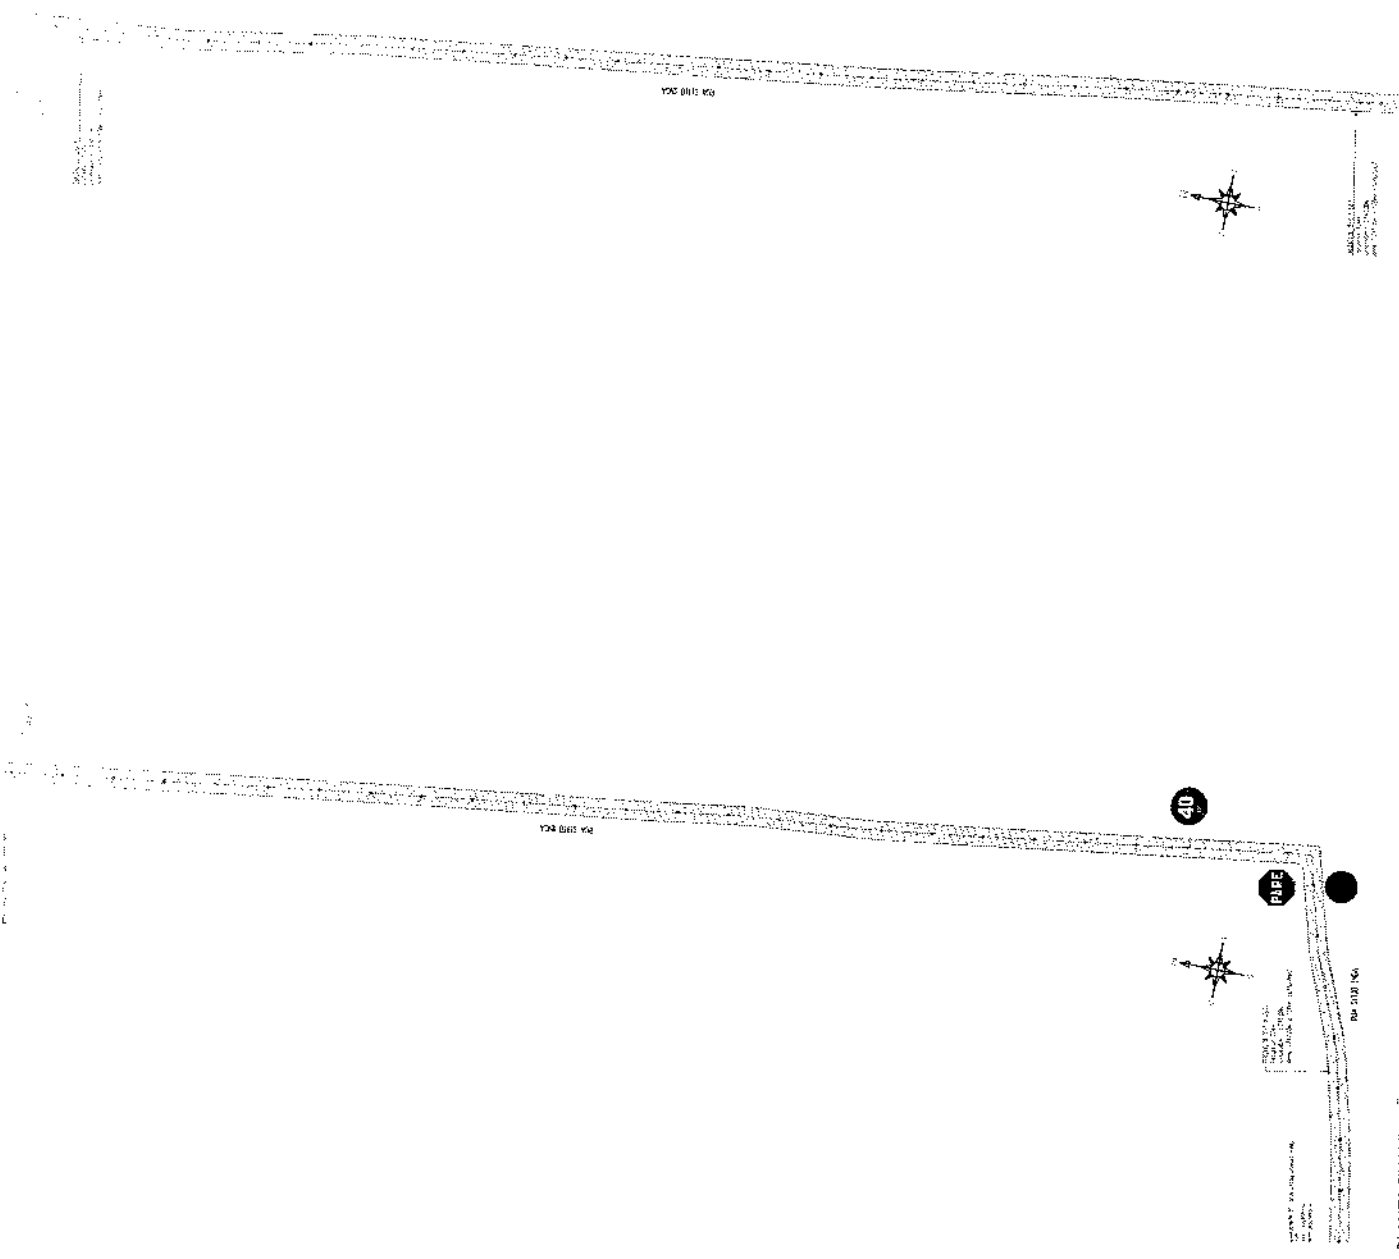PLANTA SINALIZAÇÃO (E-33 A E-59)
ENC. 1/1987PLANTA SINALIZAÇÃO (E-D A E-33)
ENC. 1.000

NATHAN DE
 MATOS
 REBOUCAS
 05767823380
 16/04/2015 10:00:00


PRESIDENT MUNICIPAL DE MONTREAL
 PATRICK AGAG
 1000
 1000

[illegible][illegible]

9724

6. $\frac{1}{2} \log 5$

PLANTA SINALIZAÇÃO (E-85 A E-111)

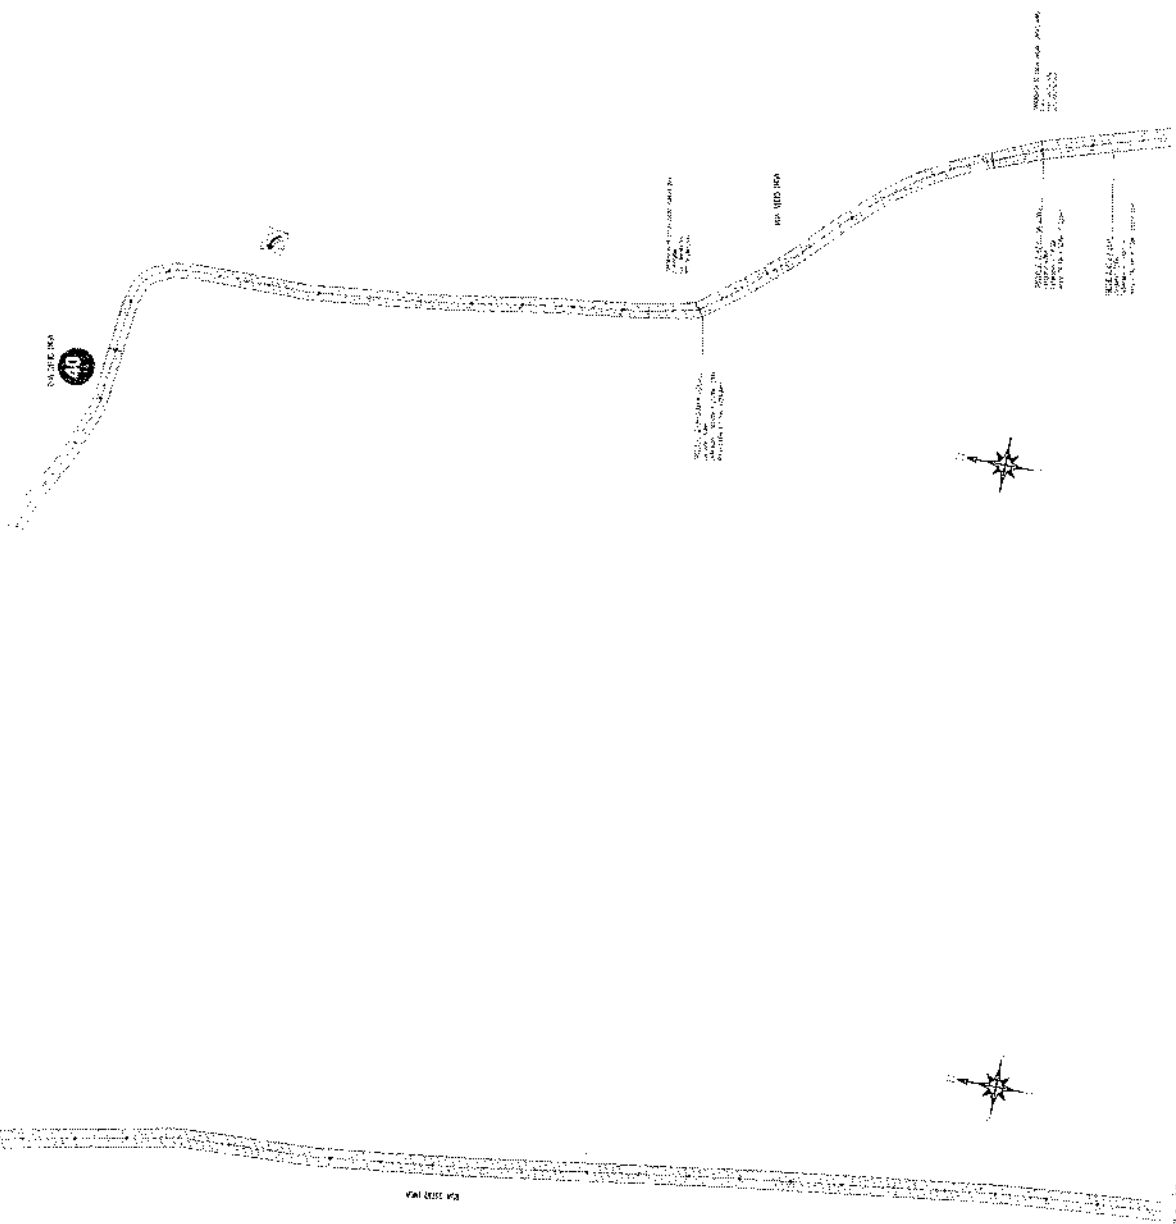PLANTA SINALIZAÇÃO (E-59 A E-85)
200. 11000

Assessorias digitais - 46
por NATHAN DE
MATOS
REBOUCAS: 3300
05767823900
09/05/2015 09:22
09/05/2015 10:43:00

[illegible]

0413


ASSINADO
ELETTRONICAMENTE

**NATHAN DE
MATOS**
REBOUCAS: 8390
05767829390


KATYANNE ANDREWS - 604-879-1111
MARQUES LAMONTAGNE - 604-879-1111
MELODIE LAMONTAGNE - 604-879-1111

PROSEKUPA MUNICIPAL DE RUC
INSTRUMENTO DE TRANSFERENCIA
INSTRUMENTO DE TRANSFERENCIA
INSTRUMENTO DE TRANSFERENCIA

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO (E-33 A E-59)

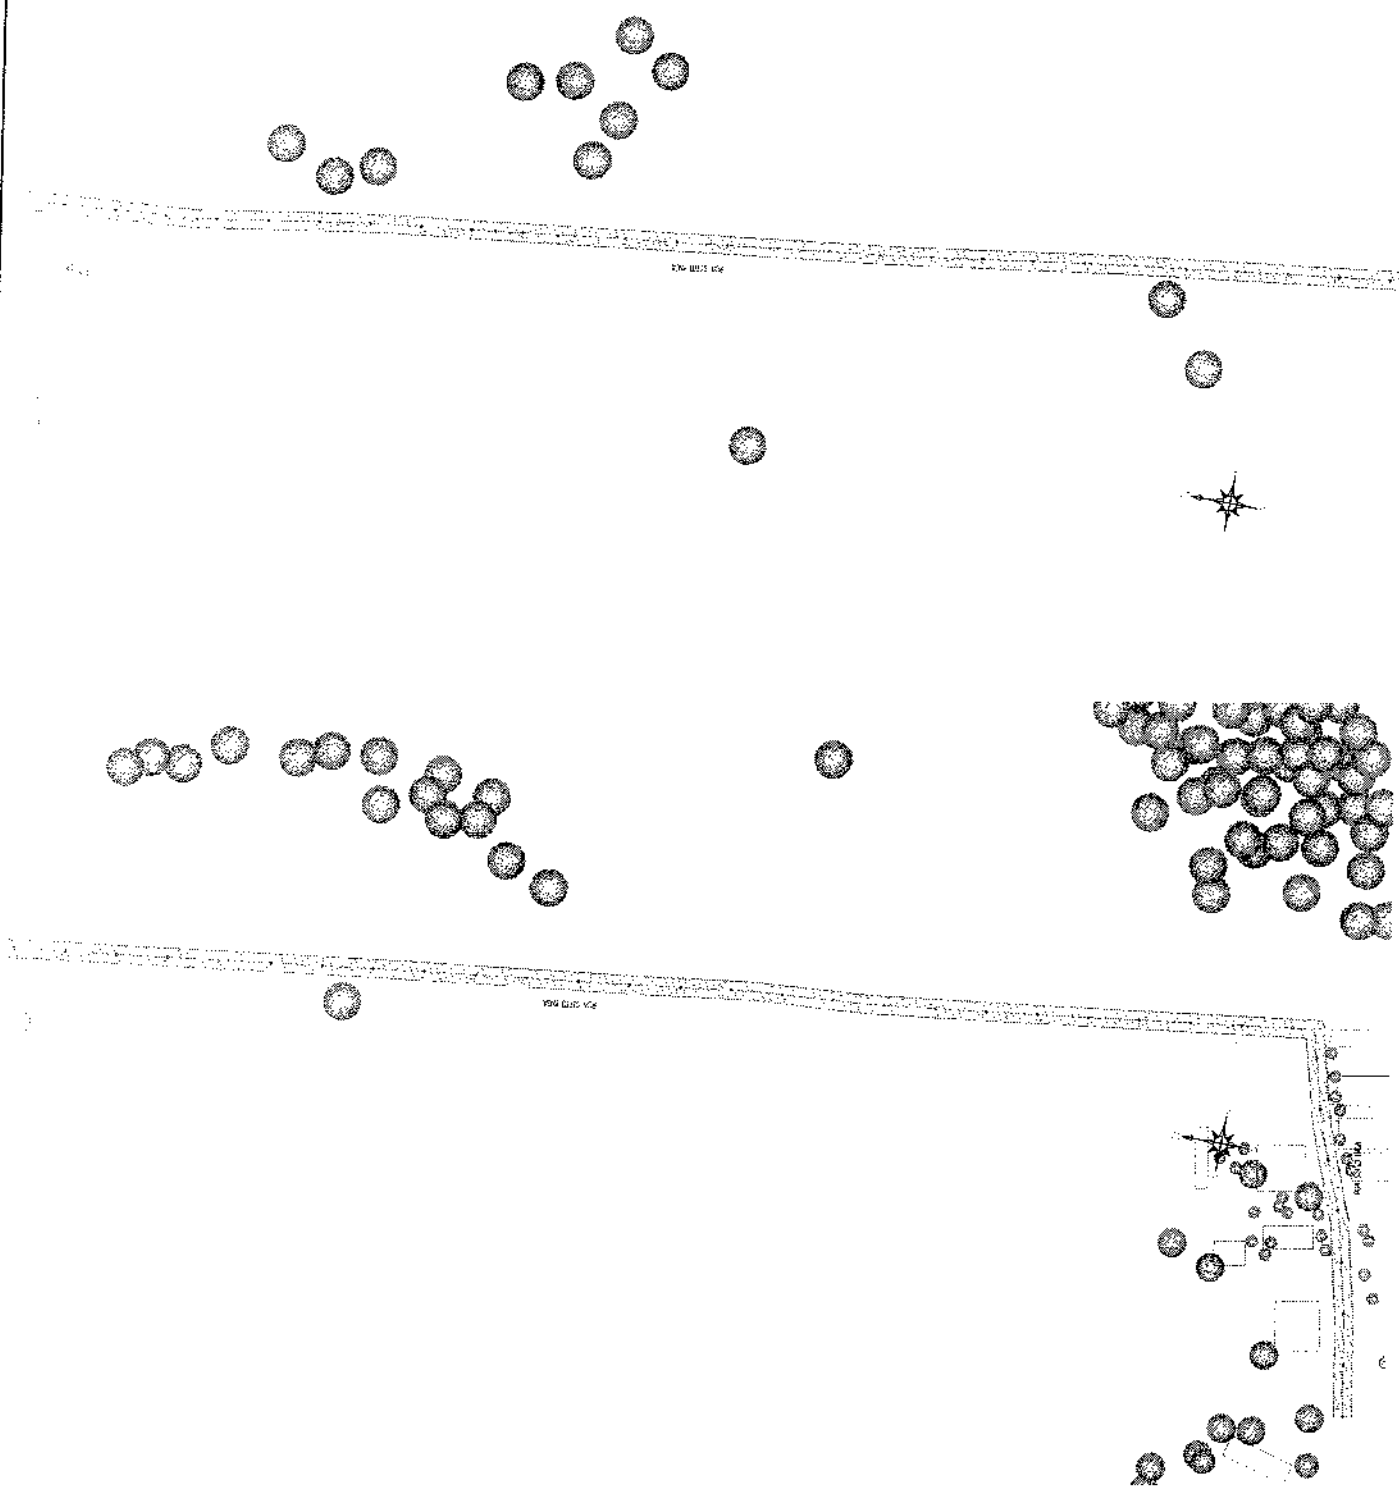LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO (E-O A E-33)
E-30. 1:1000


1. NAME _____
 2. ADDRESS _____
 3. CITY _____
 4. STATE _____
 5. ZIP _____
 6. PHONE _____
 7. DATE _____
 8. SIGNATURE _____
 9. PRINT NAME _____
 10. PRINT ADDRESS _____
 11. PRINT CITY _____
 12. PRINT STATE _____
 13. PRINT ZIP _____
 14. PRINT PHONE _____
 15. PRINT DATE _____
 16. PRINT SIGNATURE _____
 17. PRINT NAME _____
 18. PRINT ADDRESS _____
 19. PRINT CITY _____
 20. PRINT STATE _____
 21. PRINT ZIP _____
 22. PRINT PHONE _____
 23. PRINT DATE _____
 24. PRINT SIGNATURE _____
 25. PRINT NAME _____
 26. PRINT ADDRESS _____
 27. PRINT CITY _____
 28. PRINT STATE _____
 29. PRINT ZIP _____
 30. PRINT PHONE _____
 31. PRINT DATE _____
 32. PRINT SIGNATURE _____
 33. PRINT NAME _____
 34. PRINT ADDRESS _____
 35. PRINT CITY _____
 36. PRINT STATE _____
 37. PRINT ZIP _____
 38. PRINT PHONE _____
 39. PRINT DATE _____
 40. PRINT SIGNATURE _____
 41. PRINT NAME _____
 42. PRINT ADDRESS _____
 43. PRINT CITY _____
 44. PRINT STATE _____
 45. PRINT ZIP _____
 46. PRINT PHONE _____
 47. PRINT DATE _____
 48. PRINT SIGNATURE _____
 49. PRINT NAME _____
 50. PRINT ADDRESS _____
 51. PRINT CITY _____
 52. PRINT STATE _____
 53. PRINT ZIP _____
 54. PRINT PHONE _____
 55. PRINT DATE _____
 56. PRINT SIGNATURE _____
 57. PRINT NAME _____
 58. PRINT ADDRESS _____
 59. PRINT CITY _____
 60. PRINT STATE _____
 61. PRINT ZIP _____
 62. PRINT PHONE _____
 63. PRINT DATE _____
 64. PRINT SIGNATURE _____
 65. PRINT NAME _____
 66. PRINT ADDRESS _____
 67. PRINT CITY _____
 68. PRINT STATE _____
 69. PRINT ZIP _____
 70. PRINT PHONE _____
 71. PRINT DATE _____
 72. PRINT SIGNATURE _____
 73. PRINT NAME _____
 74. PRINT ADDRESS _____
 75. PRINT CITY _____
 76. PRINT STATE _____
 77. PRINT ZIP _____
 78. PRINT PHONE _____
 79. PRINT DATE _____
 80. PRINT SIGNATURE _____
 81. PRINT NAME _____
 82. PRINT ADDRESS _____
 83. PRINT CITY _____
 84. PRINT STATE _____
 85. PRINT ZIP _____
 86. PRINT PHONE _____
 87. PRINT DATE _____
 88. PRINT SIGNATURE _____
 89. PRINT NAME _____
 90. PRINT ADDRESS _____
 91. PRINT CITY _____
 92. PRINT STATE _____
 93. PRINT ZIP _____
 94. PRINT PHONE _____
 95. PRINT DATE _____
 96. PRINT SIGNATURE _____
 97. PRINT NAME _____
 98. PRINT ADDRESS _____
 99. PRINT CITY _____
 100. PRINT STATE _____
 101. PRINT ZIP _____
 102. PRINT PHONE _____
 103. PRINT DATE _____
 104. PRINT SIGNATURE _____
 105. PRINT NAME _____
 106. PRINT ADDRESS _____
 107. PRINT CITY _____
 108. PRINT STATE _____
 109. PRINT ZIP _____
 110. PRINT PHONE _____
 111. PRINT DATE _____
 112. PRINT SIGNATURE _____
 113. PRINT NAME _____
 114. PRINT ADDRESS _____
 115. PRINT CITY _____
 116. PRINT STATE _____
 117. PRINT ZIP _____
 118. PRINT PHONE _____
 119. PRINT DATE _____
 120. PRINT SIGNATURE _____
 121. PRINT NAME _____
 122. PRINT ADDRESS _____
 123. PRINT CITY _____
 124. PRINT STATE _____
 125. PRINT ZIP _____
 126. PRINT PHONE _____
 127. PRINT DATE _____
 128. PRINT SIGNATURE _____
 129. PRINT NAME _____
 130. PRINT ADDRESS _____
 131. PRINT CITY _____
 132. PRINT STATE _____
 133. PRINT ZIP _____
 134. PRINT PHONE _____
 135. PRINT DATE _____
 136. PRINT SIGNATURE _____
 137. PRINT NAME _____
 138. PRINT ADDRESS _____
 139. PRINT CITY _____
 140. PRINT STATE _____
 141. PRINT ZIP _____
 142. PRINT PHONE _____
 143. PRINT DATE _____
 144. PRINT SIGNATURE _____
 145. PRINT NAME _____
 146. PRINT ADDRESS _____
 147. PRINT CITY _____
 148. PRINT STATE _____
 149. PRINT ZIP _____
 150. PRINT PHONE _____
 151. PRINT DATE _____
 152. PRINT SIGNATURE _____
 153. PRINT NAME _____
 154. PRINT ADDRESS _____
 155. PRINT CITY _____
 156. PRINT STATE _____
 157. PRINT ZIP _____
 158. PRINT PHONE _____
 159. PRINT DATE _____
 160. PRINT SIGNATURE _____
 161. PRINT NAME _____
 162. PRINT ADDRESS _____
 163. PRINT CITY _____
 164. PRINT STATE _____
 165. PRINT ZIP _____
 166. PRINT PHONE _____
 167. PRINT DATE _____
 168. PRINT SIGNATURE _____
 169. PRINT NAME _____
 170. PRINT ADDRESS _____
 171. PRINT CITY _____
 172. PRINT STATE _____
 173. PRINT ZIP _____
 174. PRINT PHONE _____
 175. PRINT DATE _____
 176. PRINT SIGNATURE _____
 177. PRINT NAME _____
 178. PRINT ADDRESS _____
 179. PRINT CITY _____
 180. PRINT STATE _____
 181. PRINT ZIP _____
 182. PRINT PHONE _____
 183. PRINT DATE _____
 184. PRINT SIGNATURE _____
 185. PRINT NAME _____
 186. PRINT ADDRESS _____
 187. PRINT CITY _____
 188. PRINT STATE _____
 189. PRINT ZIP _____
 190. PRINT PHONE _____
 191. PRINT DATE _____
 192. PRINT SIGNATURE _____
 193. PRINT NAME _____
 194. PRINT ADDRESS _____
 195. PRINT CITY _____
 196. PRINT STATE _____
 197. PRINT ZIP _____
 198. PRINT PHONE _____
 199. PRINT DATE _____
 200. PRINT SIGNATURE _____
 201. PRINT NAME _____
 202. PRINT ADDRESS _____
 203. PRINT CITY _____
 204. PRINT STATE _____
 205. PRINT ZIP _____
 206. PRINT PHONE _____
 207. PRINT DATE _____
 208. PRINT SIGNATURE _____
 209. PRINT NAME _____
 210. PRINT ADDRESS _____
 211. PRINT CITY _____
 212. PRINT STATE _____
 213. PRINT ZIP _____
 214. PRINT PHONE _____
 215. PRINT DATE _____
 216. PRINT SIGNATURE _____
 217. PRINT NAME _____
 218. PRINT ADDRESS _____
 219. PRINT CITY _____
 220. PRINT STATE _____

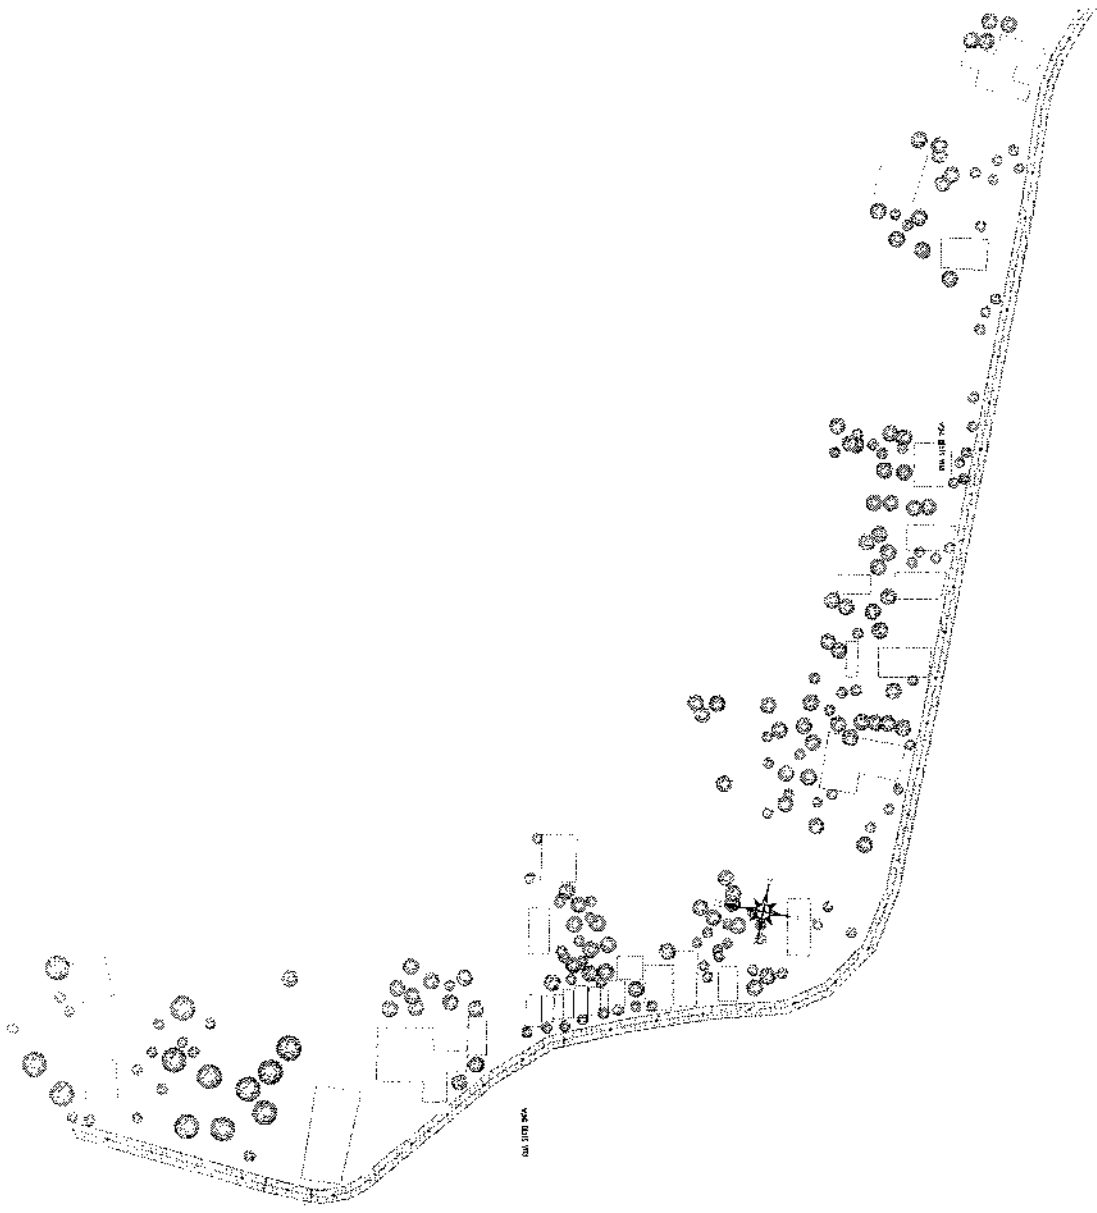

PLANING PLASMA



PROJETO GEOMÉTRICO GERAL - RAMAL DE FLORES

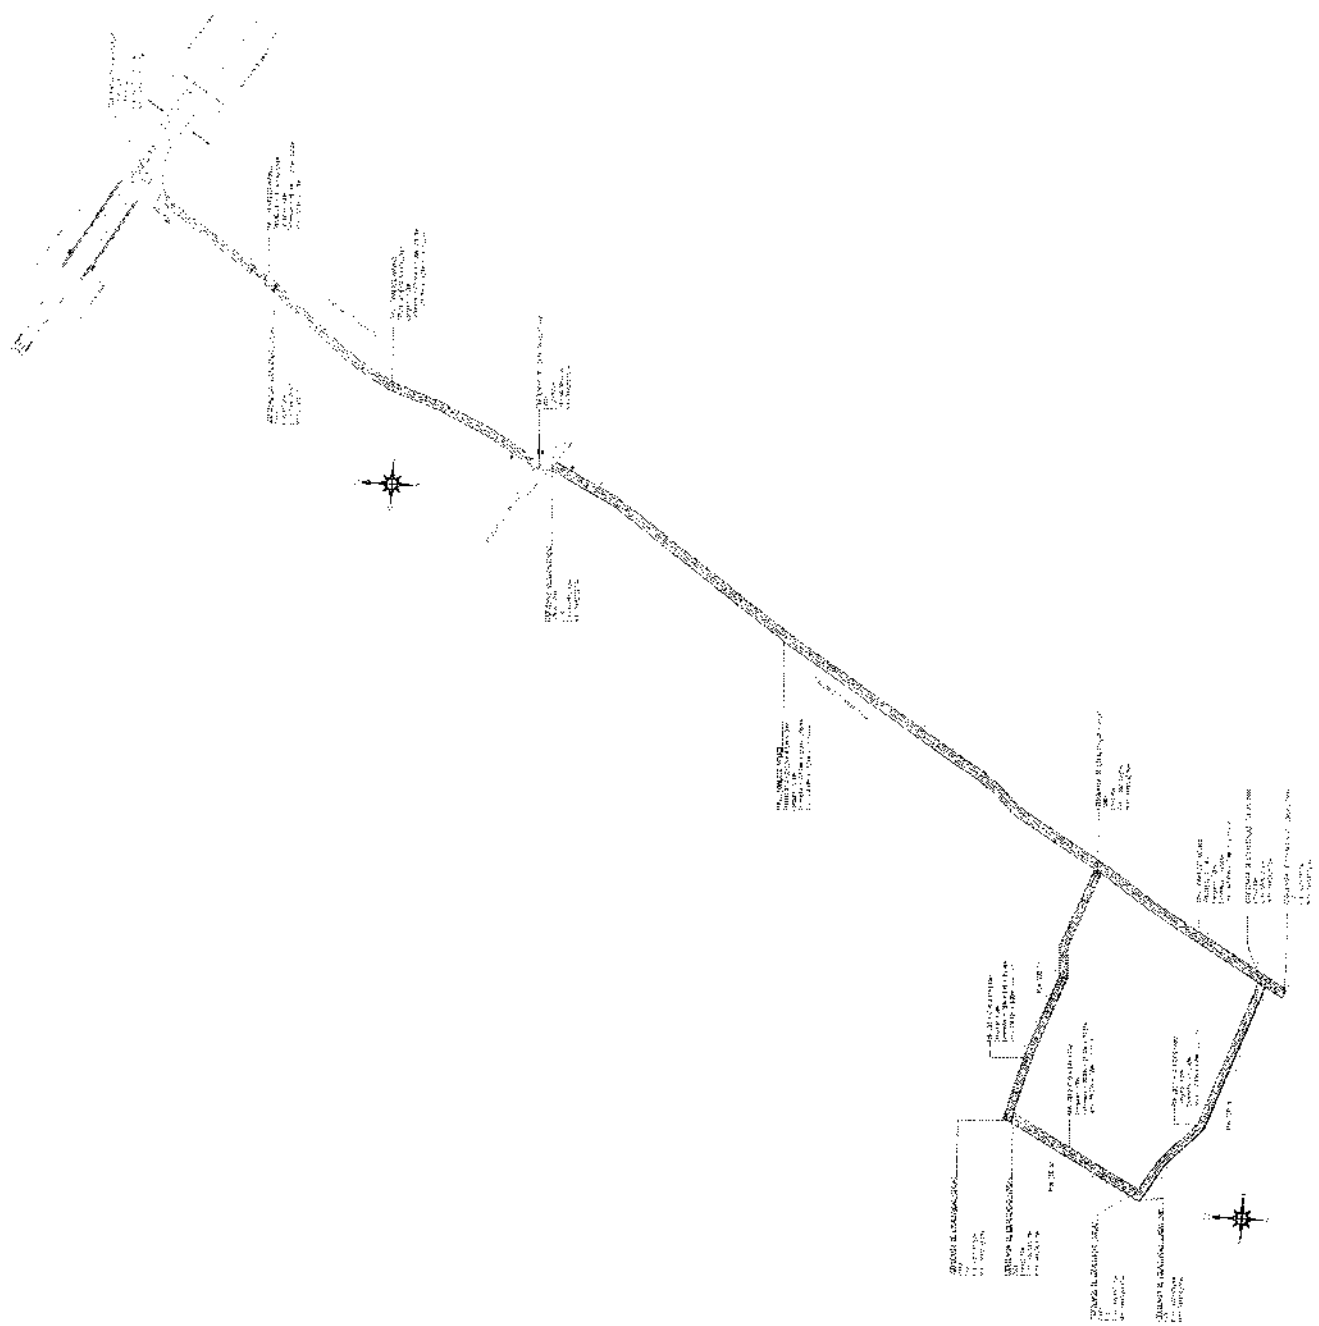[illegible]

INTERMEDIÁRIOS

NATHAN DE MATOS REBOUCAS

Assessoria & Planejamento
por NATHAN DE MATOS
REBOUCAS-027676713

MATOS

REBOUCAS,0030

5767629390

Dom: 2025, 10:00
18:06:03:00

PREFECTURA MUNICIPAL DE HUAYABAMA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

Colegio "Nuestra Señora de la Asunción"

HUAYABAMA - PUNO

Año 2016

PRIMER SEMESTRE

GRADO PRIMARIO

ÁREA DE MATEMÁTICA

UNIDAD DIDÁCTICA N° 1

TÍTULO: El mundo de los números naturales

OBJETIVO GENERAL:

El estudiante comprenderá el mundo de los números naturales y su aplicación en la vida cotidiana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Reconocer los números naturales en situaciones concretas.

- Comprender el uso de los números naturales en la vida cotidiana.

- Aplicar los números naturales en situaciones concretas.

- Resolver problemas que involucren los números naturales.

- Comunicarse matemáticamente.

- Argumentar matemáticamente.

- Reflexionar sobre el aprendizaje.

- Trabajar en equipo.

- Respetar las normas de convivencia.

- Valorar el patrimonio cultural.

- Promover la sostenibilidad.

- Fomentar la ciudadanía activa.

- Desarrollar habilidades socioemocionales.

- Promover la equidad.

- Fomentar la inclusión.

- Valorar la diversidad.

- Promover la paz.

- Fomentar la responsabilidad.

- Desarrollar el pensamiento crítico.

- Promover la creatividad.

- Fomentar la curiosidad.

- Desarrollar la capacidad de resolución de problemas.

- Promover la perseverancia.

- Fomentar la autoestima.

- Desarrollar la confianza.

- Promover la empatía.

- Fomentar la tolerancia.

- Desarrollar la habilidad de escucha activa.

- Promover la comunicación efectiva.

- Fomentar la colaboración.

- Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo.

- Promover la responsabilidad social.

- Fomentar la conciencia ambiental.

- Desarrollar la capacidad de liderazgo.

- Promover la participación ciudadana.

- Fomentar la cultura de paz.

- Desarrollar la capacidad de toma de decisiones.

- Promover la autonomía.

- Fomentar la iniciativa propia.

- Desarrollar la capacidad de organización.

- Promover la gestión del tiempo.

- Fomentar la disciplina.

- Desarrollar la capacidad de concentración.

- Promover la memoria.

- Fomentar la atención.

- Desarrollar la capacidad de observación.

- Promover la imaginación.

- Fomentar la creatividad.

- Desarrollar la capacidad de expresión oral.

- Promover la escritura creativa.

- Fomentar la lectura comprensiva.

- Desarrollar la capacidad de análisis.

- Promover la síntesis.

- Fomentar la comparación.

- Desarrollar la capacidad de clasificación.

- Promover la ordenación.

- Fomentar la secuenciación.

- Desarrollar la capacidad de planificación.

- Promover la ejecución.

- Fomentar la evaluación.

- Desarrollar la capacidad de reflexión.

- Promover la autoevaluación.

- Fomentar la coevaluación.

- Desarrollar la capacidad de heteroevaluación.

- Promover la retroalimentación.

- Fomentar la mejora continua.

- Desarrollar la capacidad de adaptación.

- Promover la flexibilidad.

- Fomentar la resiliencia.

- Desarrollar la capacidad de superación.

- Promover la motivación.

- Fomentar la satisfacción.

- Desarrollar la capacidad de disfrute.

- Promover la calidad de vida.

- Fomentar la felicidad.

- Desarrollar la capacidad de bienestar.

- Promover la salud.

- Fomentar la higiene.

- Desarrollar la capacidad de autocuidado.

- Promover la prevención.

- Fomentar la promoción.

- Desarrollar la capacidad de recuperación.

- Promover la rehabilitación.

- Fomentar la reinserción.

- Desarrollar la capacidad de integración.

- Promover la participación.

- Fomentar la colaboración.

- Desarrollar la capacidad de solidaridad.

- Promover la ayuda mutua.

- Fomentar la fraternidad.

- Desarrollar la capacidad de amor.

- Promover la fe.

- Fomentar la esperanza.

- Desarrollar la capacidad de caridad.

- Promover la justicia.

- Fomentar la paz.

- Desarrollar la capacidad de diálogo.

- Promover la negociación.

- Fomentar la resolución de conflictos.

- Desarrollar la capacidad de mediación.

- Promover la transformación.

- Fomentar la innovación.

- Desarrollar la capacidad de emprendimiento.

- Promover la creación de valor.

- Fomentar la generación de empleo.

- Desarrollar la capacidad de desarrollo sostenible.

- Promover la erradicación de la pobreza.

- Fomentar la reducción de las desigualdades.

- Desarrollar la capacidad de construcción de una sociedad más justa.

- Promover la realización personal.

- Fomentar la plenitud.

- Desarrollar la capacidad de trascendencia.

- Promover la santidad.

- Fomentar la beatitud.

- Desarrollar la capacidad de comunión.

- Promover la unidad.

- Fomentar la fraternidad universal.

- Desarrollar la capacidad de amor al prójimo.

- Promover la paz interior.

- Fomentar la armonía.

- Desarrollar la capacidad de equilibrio.

- Promover la salud mental.

- Fomentar la estabilidad emocional.

- Desarrollar la capacidad de control de impulsos.

- Promover la autodisciplina.

- Fomentar la perseverancia.

- Desarrollar la capacidad de constancia.

- Promover la dedicación.

- Fomentar la seriedad.

- Desarrollar la capacidad de puntualidad.

- Promover la eficiencia.

- Fomentar la productividad.

- Desarrollar la capacidad de organización.

- Promover la gestión del tiempo.

- Fomentar la disciplina.

- Desarrollar la capacidad de concentración.

- Promover la memoria.

- Fomentar la atención.

- Desarrollar la capacidad de observación.

- Promover la imaginación.

- Fomentar la creatividad.

- Desarrollar la capacidad de expresión oral.

- Promover la escritura creativa.

- Fomentar la lectura comprensiva.

- Desarrollar la capacidad de análisis.

- Promover la síntesis.

- Fomentar la comparación.

- Desarrollar la capacidad de clasificación.

- Promover la ordenación.

- Fomentar la secuenciación.

- Desarrollar la capacidad de planificación.

- Promover la ejecución.

- Fomentar la evaluación.

- Desarrollar la capacidad de reflexión.

- Promover la autoevaluación.

- Fomentar la coevaluación.

- Desarrollar la capacidad de heteroevaluación.

- Promover la retroalimentación.

- Fomentar la mejora continua.

- Desarrollar la capacidad de adaptación.

- Promover la flexibilidad.

- Fomentar la resiliencia.

- Desarrollar la capacidad de superación.

- Promover la motivación.

- Fomentar la satisfacción.

- Desarrollar la capacidad de disfrute.

- Promover la calidad de vida.

- Fomentar la felicidad.

- Desarrollar la capacidad de bienestar.

- Promover la salud.

- Fomentar la higiene.

- Desarrollar la capacidad de autocuidado.

- Promover la prevención.

- Fomentar la promoción.

- Desarrollar la capacidad de recuperación.

- Promover la rehabilitación.

- Fomentar la reinserción.

- Desarrollar la capacidad de integración.

- Promover la participación.

- Fomentar la colaboración.

- Desarrollar la capacidad de solidaridad.

- Promover la ayuda mutua.

- Fomentar la fraternidad.

- Desarrollar la capacidad de amor.

- Promover la fe.

- Fomentar la esperanza.

- Desarrollar la capacidad de caridad.

- Promover la justicia.

- Fomentar la paz.

- Desarrollar la capacidad de diálogo.

- Promover la negociación.

- Fomentar la resolución de conflictos.

- Desarrollar la capacidad de mediación.

- Promover la transformación.

- Fomentar la innovación.

- Desarrollar la capacidad de emprendimiento.

- Promover la creación de valor.

- Fomentar la generación de empleo.

- Desarrollar la capacidad de desarrollo sostenible.

- Promover la erradicación de la pobreza.

- Fomentar la reducción de las desigualdades.

- Desarrollar la capacidad de construcción de una sociedad más justa.

- Promover la realización personal.

- Fomentar la plenitud.

- Desarrollar la capacidad de trascendencia.

- Promover la santidad.

- Fomentar la beatitud.

- Desarrollar la capacidad de comunión.

- Promover la unidad.

- Fomentar la fraternidad universal.

- Desarrollar la capacidad de amor al prójimo.

- Promover la paz interior.

- Fomentar la armonía.

- Desarrollar la capacidad de equilibrio.

- Promover la salud mental.

- Fomentar la estabilidad emocional.

- Desarrollar la capacidad de control de impulsos.

- Promover la autodisciplina.

- Fomentar la perseverancia.

- Desarrollar la capacidad de constancia.

- Promover la dedicación.

- Fomentar la seriedad.

- Desarrollar la capacidad de puntualidad.

- Promover la eficiencia.

- Fomentar la productividad.

- Desarrollar la capacidad de organización.

- Promover la gestión del tiempo.

- Fomentar la disciplina.

- Desarrollar la capacidad de concentración.

- Promover la memoria.

- Fomentar la atención.

- Desarrollar la capacidad de observación.

- Promover la imaginación.

- Fomentar la creatividad.

- Desarrollar la capacidad de expresión oral.

- Promover la escritura creativa.

- Fomentar la lectura comprensiva.

- Desarrollar la capacidad de análisis.

- Promover la síntesis.

- Fomentar la comparación.

- Desarrollar la capacidad de clasificación.

- Promover la ordenación.

- Fomentar la secuenciación.

- Desarrollar la capacidad de planificación.

- Promover la ejecución.

- Fomentar la evaluación.

- Desarrollar la capacidad de reflexión.

- Promover la autoevaluación.

- Fomentar la coevaluación.

- Desarrollar la capacidad de heteroevaluación.

- Promover la retroalimentación.

- Fomentar la mejora continua.

- Desarrollar la capacidad de adaptación.

- Promover la flexibilidad.

- Fomentar la resiliencia.

- Desarrollar la capacidad de superación.

- Promover la motivación.

- Fomentar la satisfacción.

- Desarrollar la capacidad de disfrute.

[illegible]

NATHAN DE
MATOS
REBOUCAS
5767829390 18/06/2010



REBOUCAS

REBOUCAS

REBOUCAS

REBOUCAS


REBOUCAS

A

ASSINADO ELETRONICAMENTE
NATHAN DE MATOS
MATOS
REBOUCAS 000
5767829390 - 8460100107



DESENVOLVIDOR
NATHAN DE MATOS
MATOS
REBOUCAS 000
5767829390 - 8460100107

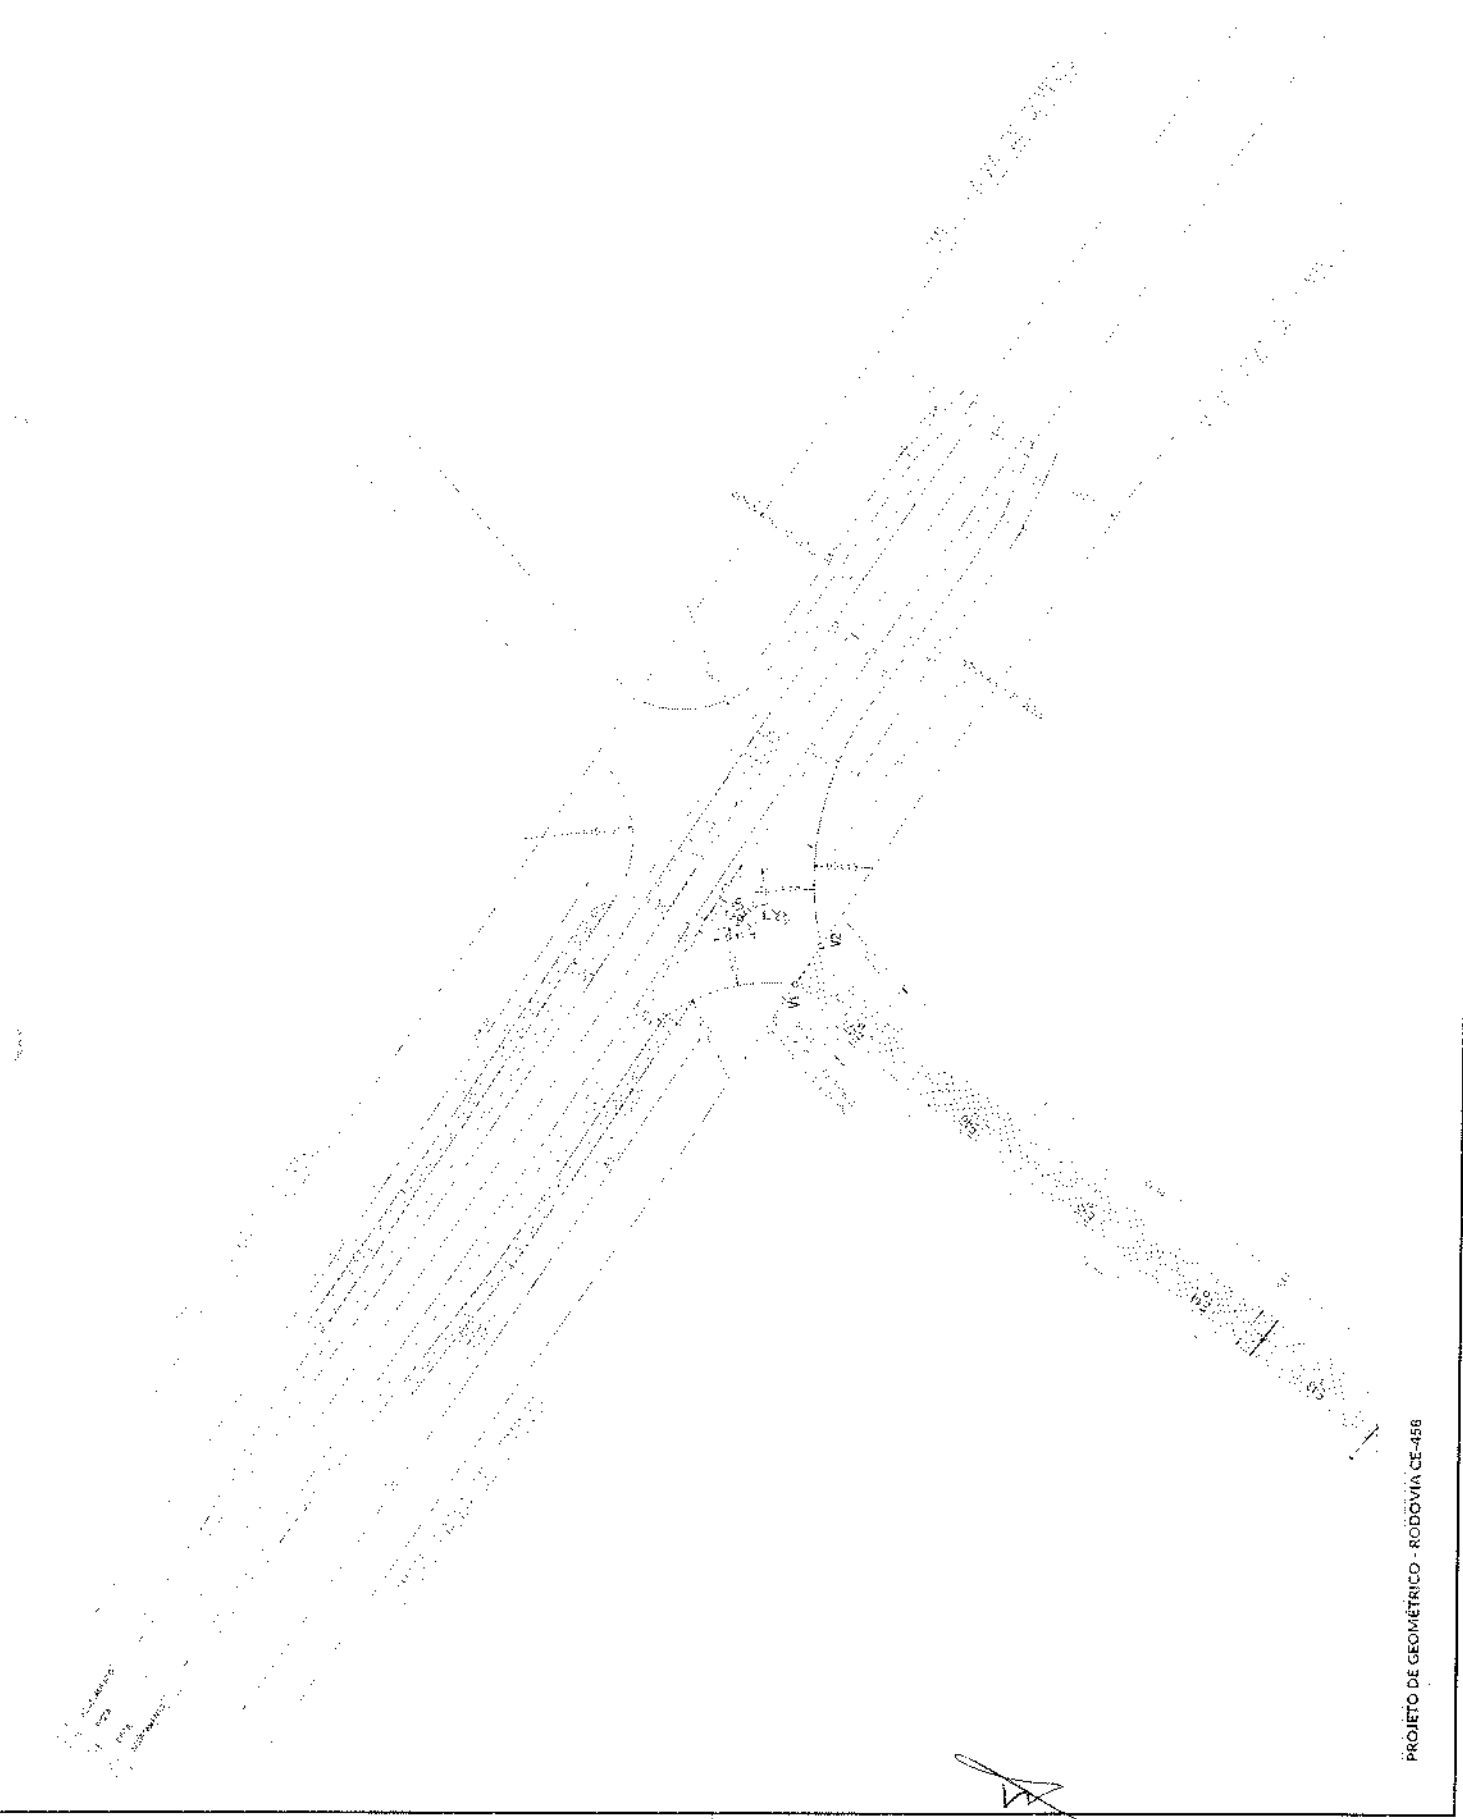

PROJETO DE GEOMETRICO - RODOVIA CE-458

COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO:

MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
DIMENSÃO = 80x80x25 cm


BASE
ESPESURA = 25 cm

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉTRICA
ESPESURA = 5 cm

COLCHÃO DE AREIA E PEDRA
ESPESURA = 20 cm



SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO - RODOVIA CE-458



USUÁRIOS E PATRONOS

NATHAN DE MATOS
MATOS
REBOUCAS
02/2013 13/06/2013

Assessor Equilíbrio
DO NATHAN DE MATOS
REBOUCAS
5767829360 18/06/2013

PROPOSTA DE PROJETO

PROPOSTA DE PROJETO

PROPOSTA DE PROJETO

PROPOSTA DE PROJETO

PROPOSTA DE PROJETO

PROPOSTA DE PROJETO

PROPOSTA DE PROJETO

0421

ASSINADO
ELETTRONICAMENTE

**NATHAN DE
MATOS
REBOUCAS:00**
5767829390

RESERVATI PAKE 8899918-43



KATYATINE-
MARQUES-
MENDONCA-
05/03/233807/05/03/05

$$\begin{aligned} & \text{a. } \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \ln 2^{-1} = -\frac{1}{2} \ln 2 \\ & \text{b. } \frac{1}{2} \ln 2 = \frac{1}{2} \ln 2^1 = \frac{1}{2} \ln 2 \\ & \text{c. } \frac{1}{2} \ln 4 = \frac{1}{2} \ln 2^2 = \ln 2 \\ & \text{d. } \frac{1}{2} \ln 8 = \frac{1}{2} \ln 2^3 = \frac{3}{2} \ln 2 \\ & \text{e. } \frac{1}{2} \ln 16 = \frac{1}{2} \ln 2^4 = 2 \ln 2 \\ & \text{f. } \frac{1}{2} \ln 32 = \frac{1}{2} \ln 2^5 = \frac{5}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

MCFLG

of milk

על פי החוק, אין זה חשוד

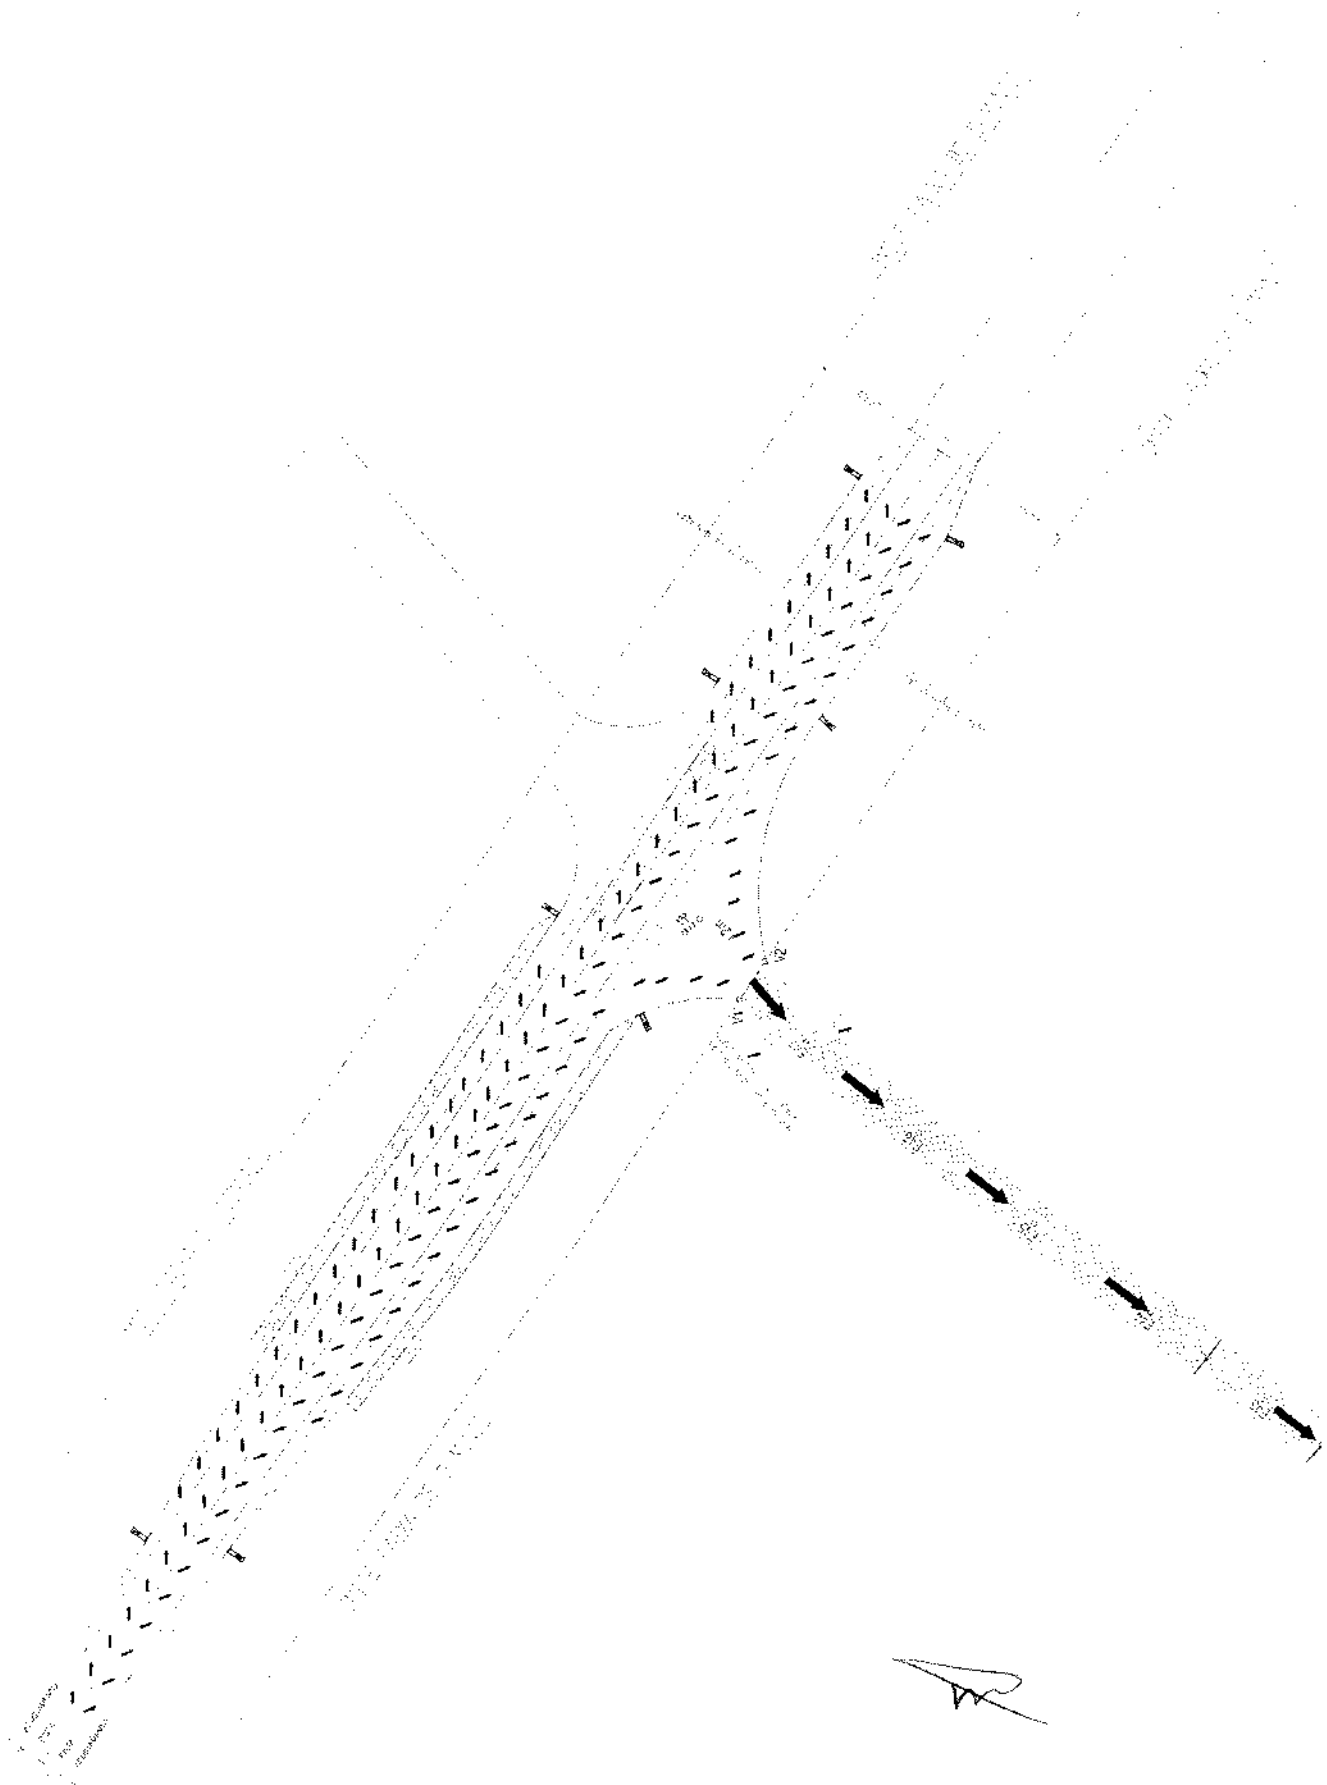[illegible]

PLANTĂ DE DRENĂGEM - RODOVIA CE-458

1999

100,00 OU CONFORME PLANTA DE DRENAGEM




DETAILS: EDA-01





DETALHE 3: MEIO-FIO E SARJETA



DETAILS

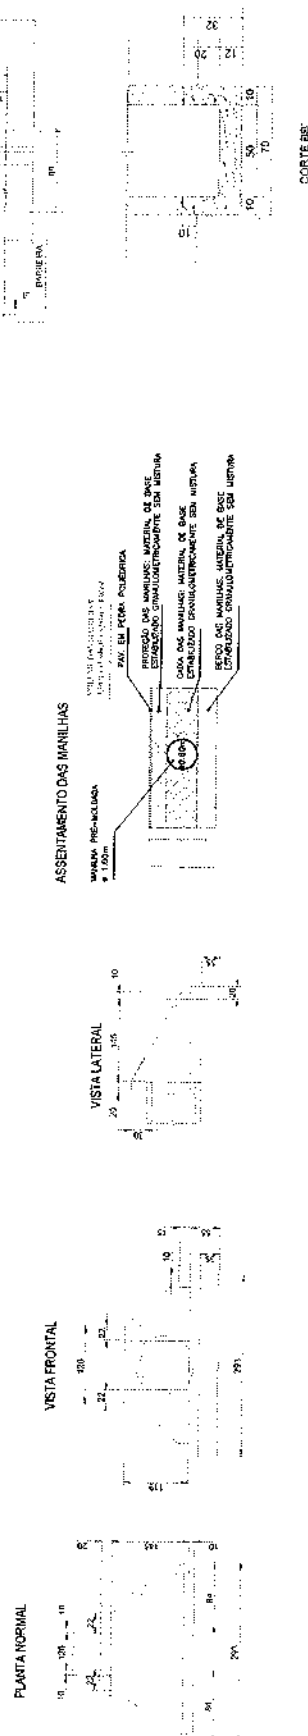

[illegible]

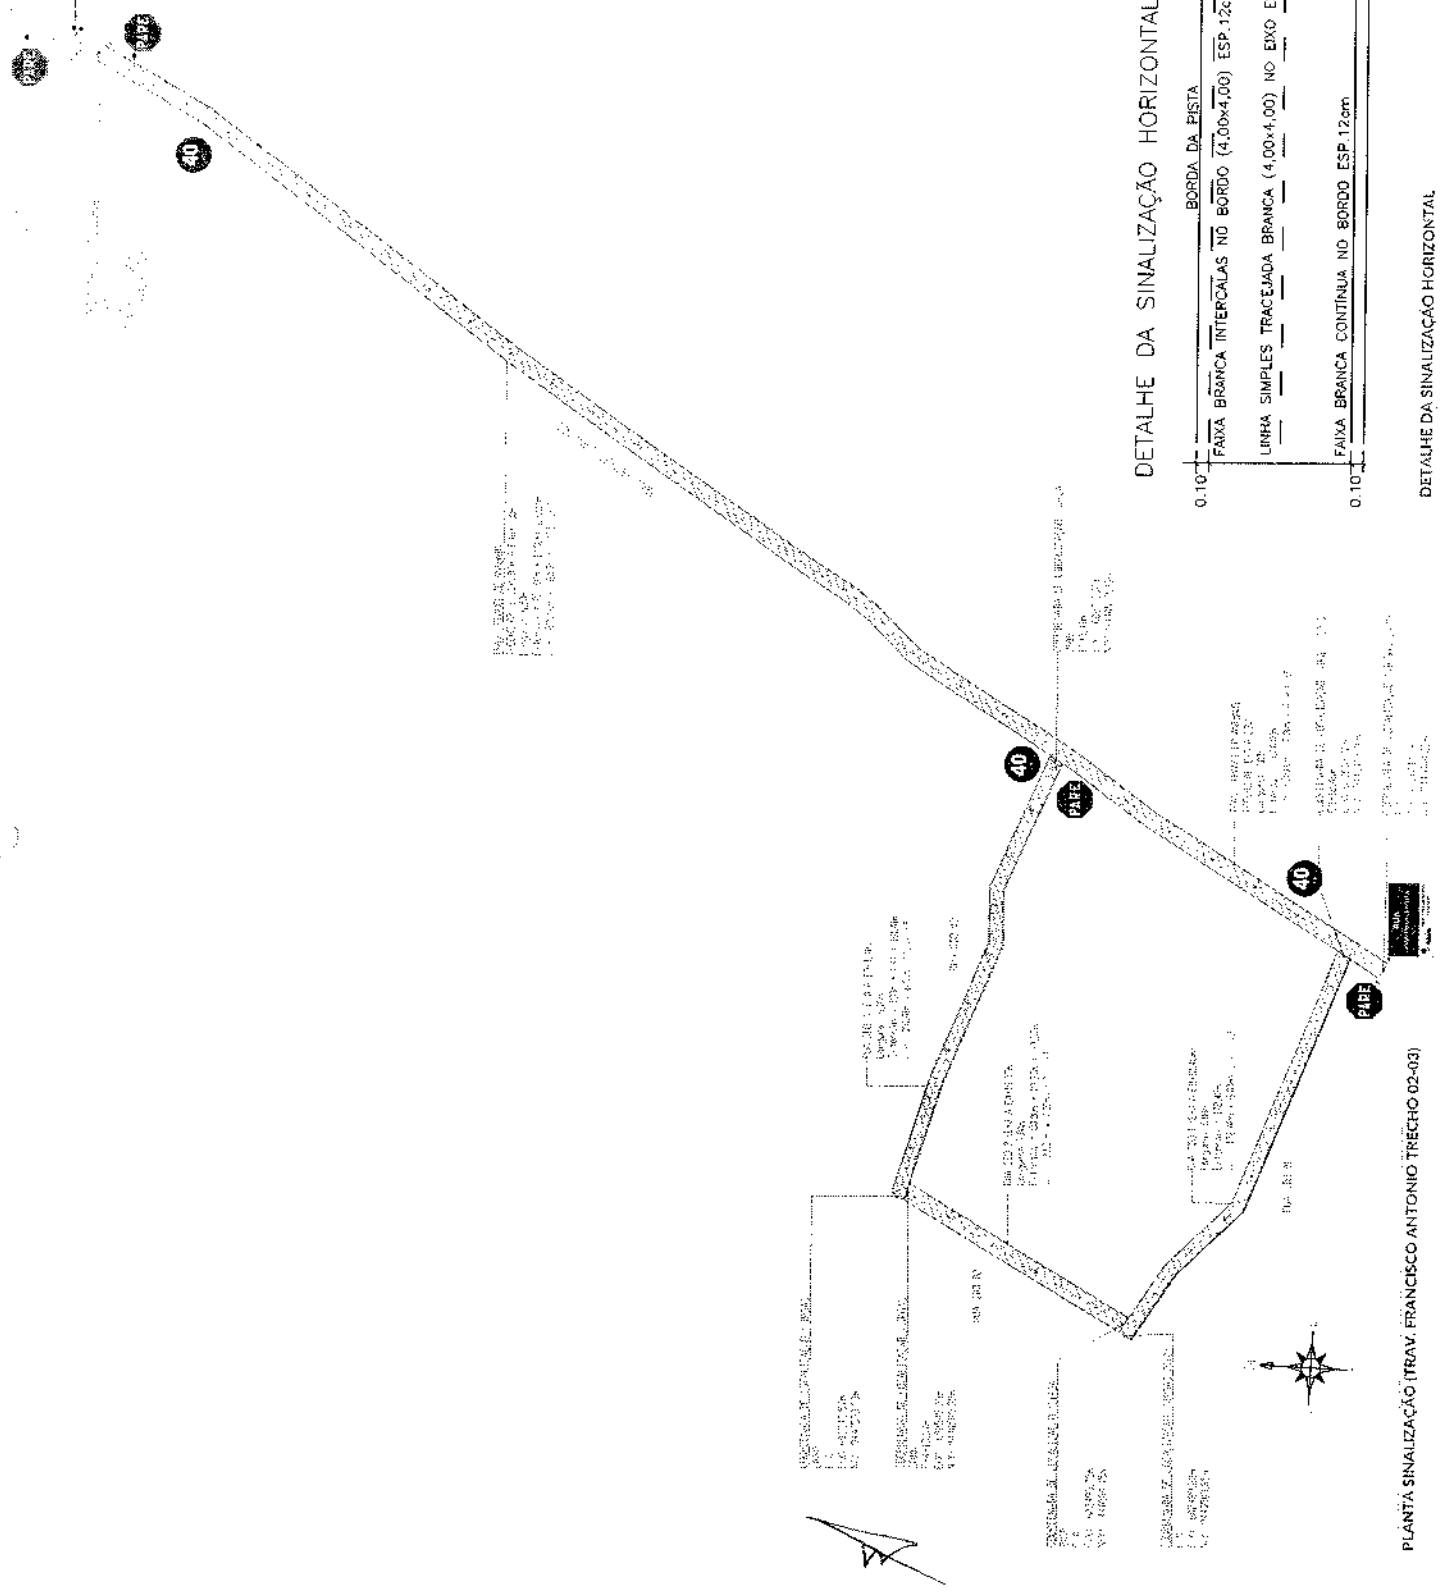

PLANTA SINALIZAÇÃO (TRAV. FRANCISCO ANTONIO TRECHO 02-03)

DETALHE DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

0.10' BORDA DA PISTA

FAIXA BRANCA INTERCALAS NO BORDO (4.00x4.00) ESP. 12cm

LINHA SIMPLES TRACEJADA BRANCA (4.00x4.00) NO EXO ESP

0.10' FAIXA BRANCA CONTINUA NO BORDO ESP 12cm

DETALHE DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

EXEMPLO DA PISTA

**NATHAN DE
MATOS
REBOUCAS: 0000**
5767829390

[illegible]

40



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Cyberbully,

Count

$$\frac{1}{100} \frac{dV}{dt} = 1.9 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$$

Figure 1. The effect of the initial concentration of the monomer on the polymerization of α -methylstyrene initiated by BuLi in THF at -78°C . The polymerization was carried out in the presence of 1.0×10^{-2} mole/l. of BuLi in THF at -78°C . The polymerization was carried out in the presence of 1.0×10^{-2} mole/l. of BuLi in THF at -78°C .

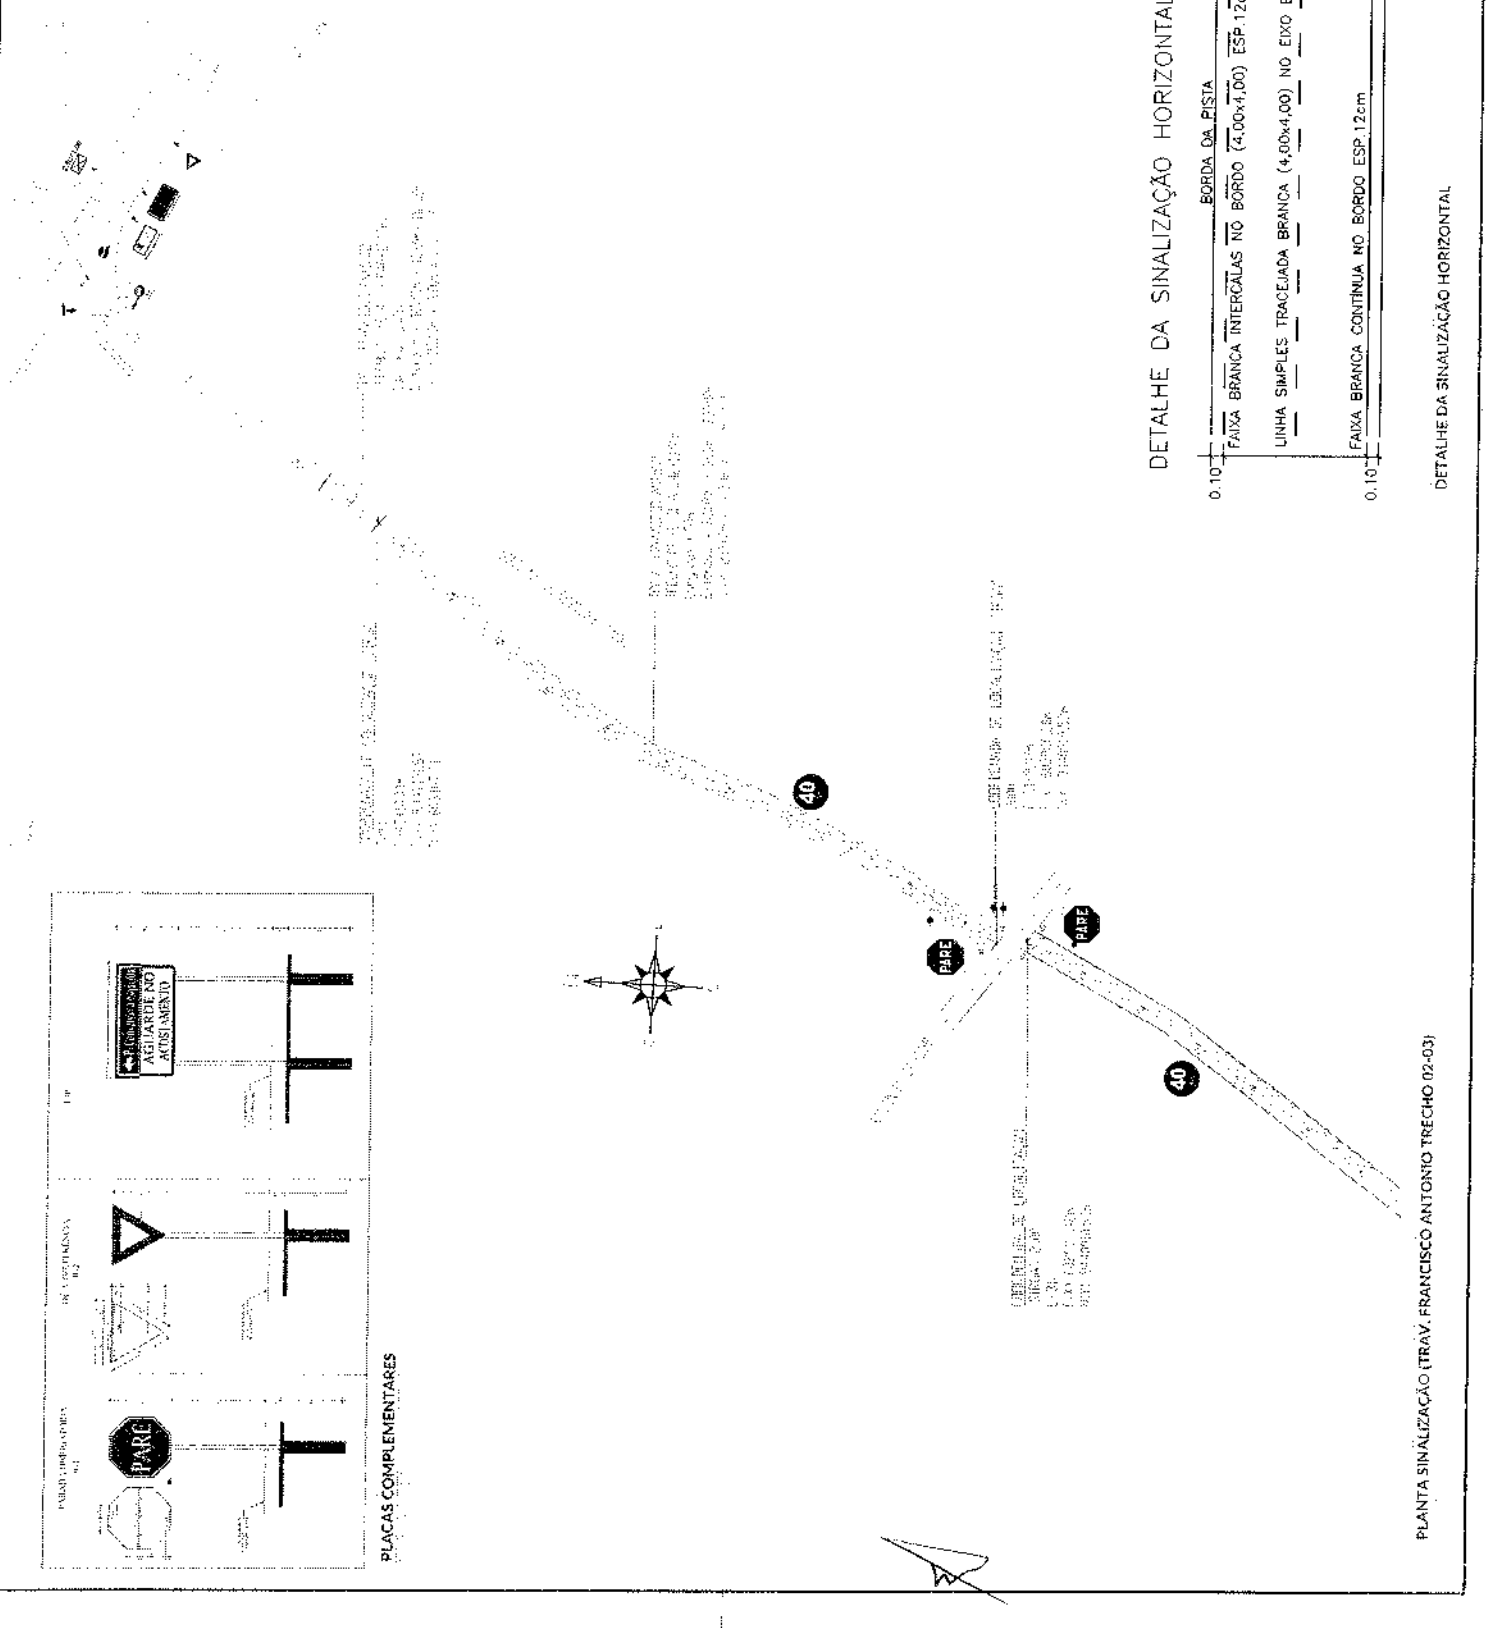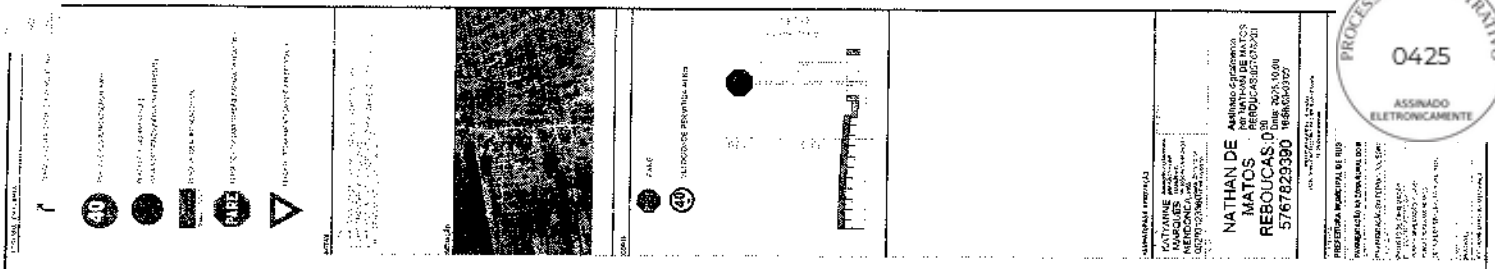

DETALHE DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

0,10" BORDA DA PISTA
FAIXA BRANCA INTERCALAS NO BORDO (4,00x4,00) ESP. 12cm
LINHA SIMPLES TRACELADA BRANCA (4,00x4,00) NO EIXO ESP.
FAIXA BRANCA CONTINUA NO BORDO ESP. 12cm
0,10"


DETALHE DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

PLANTA SINALIZAÇÃO (TRAV. FRANCISCO ANTONIO TRECHO 02-03)

Assessoria Jurídica
NATHAN DE
MATOS
REBOUCAS
5767829390 16/06/2023



Assessoria Jurídica
NATHAN DE
MATOS
REBOUCAS
5767829390 16/06/2023

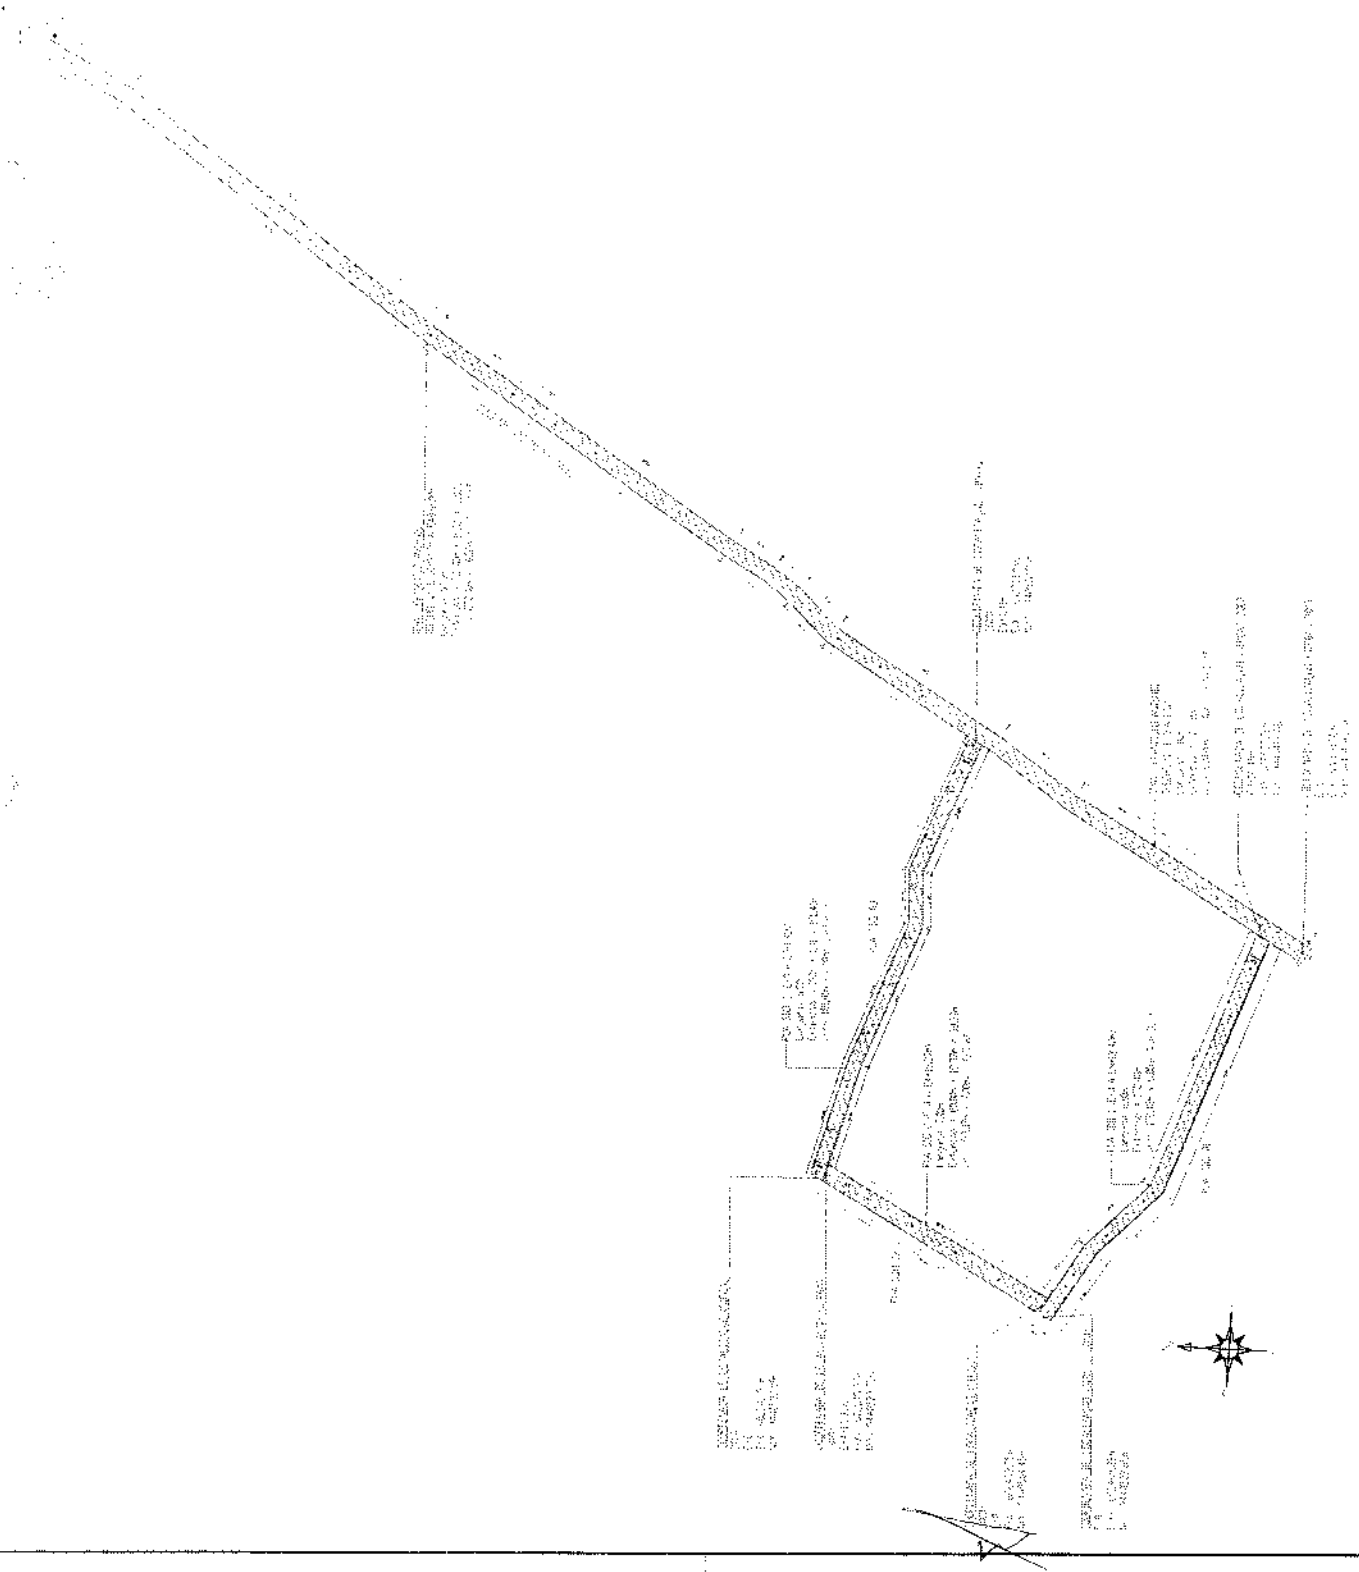


PLANTA LOCAÇÃO (RUA SDD 01-03, TRAV. FRANCISCO ANTONIO TRECHO 01)


[illegible]

NATHAN DE
MATOS
REBOUCAS
5767829390 1806 01-2017


ASSINADO ELECTRONICAMENTE
NATHAN DE MATOS REBOUCAS
CPF: 030.908.888-00
RG: 1.234.567-8
Data: 2025-10-01
Hora: 10:00




Assinamento de guias (medido) em concreto pré-fabricado, dimensões (80x15x25)cm, para uso urbano.




Assinamento de guias (medido) em concreto pré-fabricado, dimensões (80x15x25)cm, para uso urbano.




Assinamento de guias (medido) em concreto pré-fabricado, dimensões (80x15x25)cm, para uso urbano.



Assinamento de guias (medido) em concreto pré-fabricado, dimensões (80x15x25)cm, para uso urbano.



Assinamento de guias (medido) em concreto pré-fabricado, dimensões (80x15x25)cm, para uso urbano.



Assinamento de guias (medido) em concreto pré-fabricado, dimensões (80x15x25)cm, para uso urbano.



COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO:
MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
DIMENSÃO = 80x15x25 cm

SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO,
COM DIMENSÃO 30 cm BASE X 10 cm ALTURA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉTRICA
ESPESURA = 5 cm

COLCHÃO DE AREIA E PEDRA
ESPESURA = 20 cm

PERFIL TRANSVERSAL

0429

ASSINADO
ELECTRONICAMENTE

**NATHAN DE
MATOS
REBOUCAS** 030
Assessoria de Planejamento
DO NATHAN DE MATOS
REBOUCAS 03070797973
Data: 2025.10.01
5767829390 - 158603-0500

KATYARINE Apartment complex
MARQUES - houses
MENDONCA - \$600
05207133860999 Not home

INSTITUTO NACIONAL DE ASESORIA

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible][illegible]



1000

2000


1. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 2. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 3. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 4. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 5. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 6. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 7. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 8. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 9. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 10. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

100%


QUESTIONS AND ANSWERS

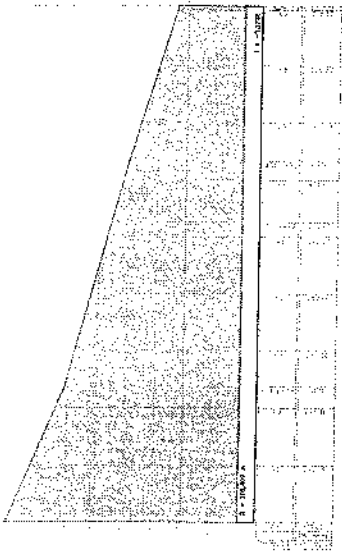


PERFIL LONGITUDINAL - RUA SDD-03

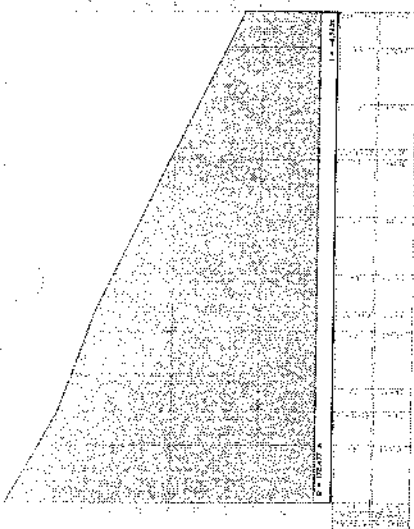


“PERFIL LONGITUDINAL” - RELACIONES

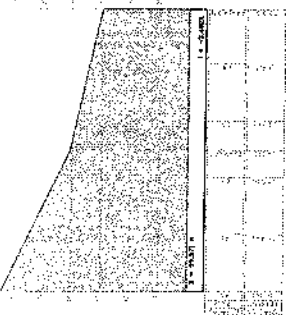

PEREIL LONGITUDINAL - P11A CDD 01

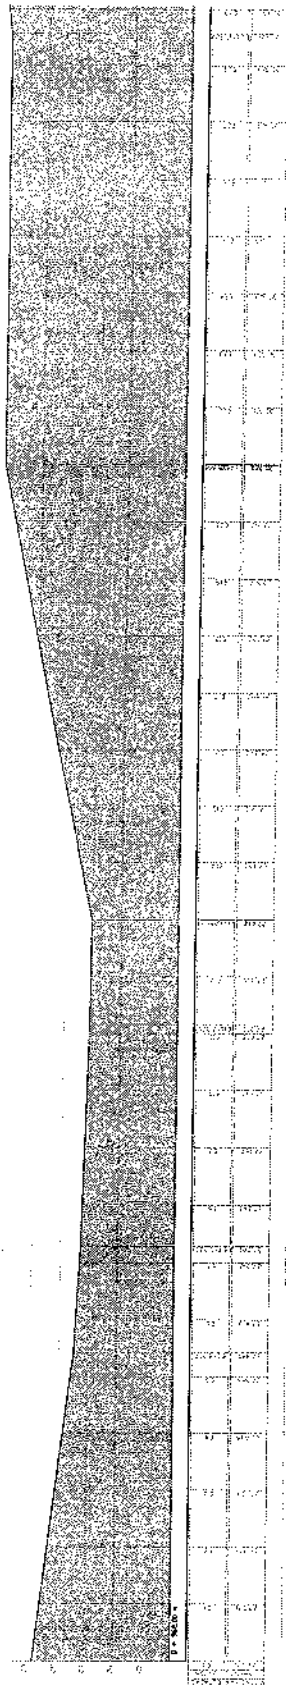


PERFIL LONGITUDINAL - TRAV, FRANCISCO ANTONIO TRECHO (E-0 A E-29)

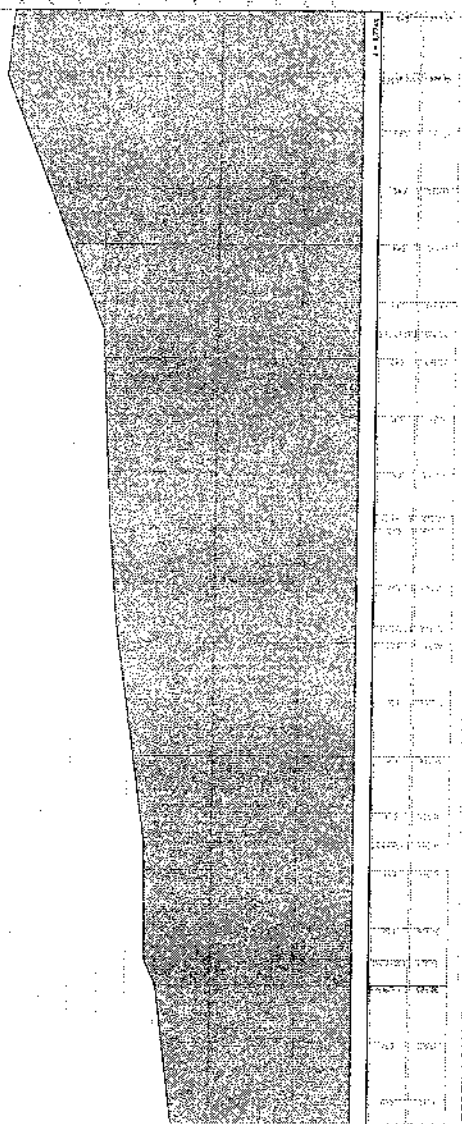

PERFIL LONGITUDINAL - TRAV. FRANCISCO ANTONIO TRECHO (E. 29 A E-48+2,00)

Atestado assinado
por NATHAN DE MATOS
REBOUCAS em 02/05/2018
5767629390 18-0603-0100

NATHAN DE
MATOS
REBOUCAS

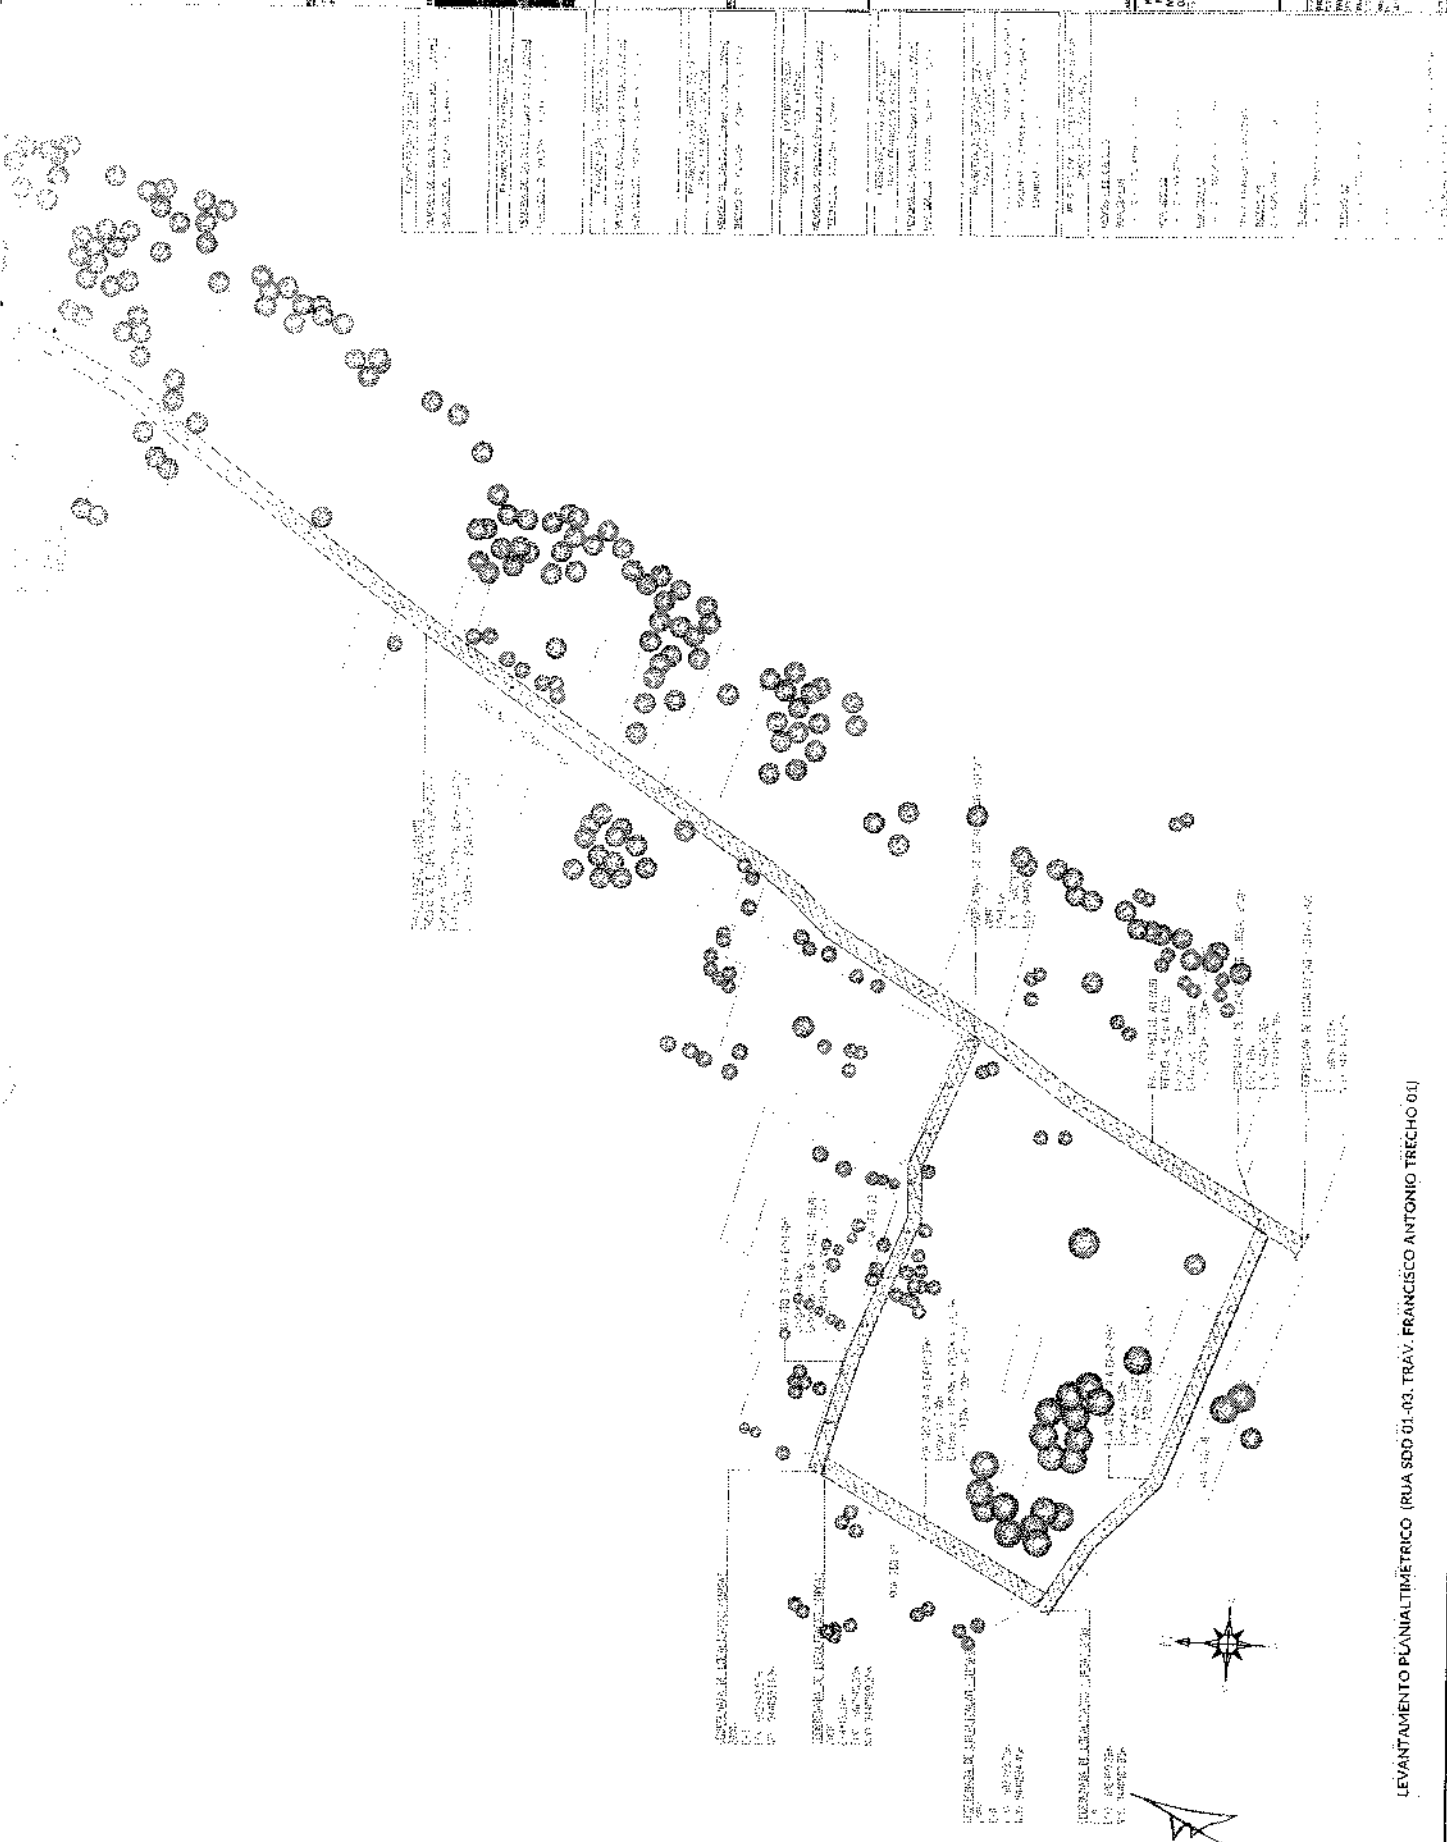

0431

ASSINADO
ELETTRONICAMENTE

NATHAN DE - Registro digitalizado
IMATOS - por NATAN DE MATOS
REBOUCAS:0000 - REBOUCAS:007672015
5767829390 - Data: 2025.10.06
- 16:58:01-03:00

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535
MAY 19 1964
MEMPHIS, TENNESSEE
TO DIRECTOR, FBI
FROM SAC, MEMPHIS (44-1987) (P)
SUBJECT: MARTIN LUTHER KING, JR.;
ALABAMA CRIMINAL JUSTICE
INVESTIGATION; CIVIL RIGHTS
MURDER OF MARTIN LUTHER KING, JR.
RE: MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU
MAY 15, 1964.

POSTAL MOUNTAIN OF RUSSIA

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO (TRAV. FRANCISCO ANTONIO TRECHO 02-03)

